

# **FONIPREL**

**FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
REGIONAL Y LOCAL**

**Secretaria Técnica**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

**AYACUCHO (Norte – Centro)  
VISITA DE CAMPO SETIEMBRE 2014**

**Lima, Octubre de 2014**

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

## FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL FONIPREL

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS– VISTAS DE CAMPO - AYACUCHO

### 1. ANTECEDENTES

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, a Setiembre de del 2014, ha realizado 09 Concursos para el Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública y Estudios de Preinversión.

En el siguiente cuadro se detalla información referida a las propuestas seleccionadas en los nueve concursos

Cuadro N° 01  
**PROPUESTAS SELECCIONADAS EN LOS CONCURSOS FONIPREL**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE TRANSFERENCIA
1ER. CONCURSO	372	376 779 924,00	375 822 955,00	D.S. N° 116-2008-EF
				D.S. N° 062-2009-EF
				D.S. N° 111-2010-EF
2DO. CONCURSO	265	294 685 998,00	293 843 755,00	D.S. N° 089-2009-EF
				D.S. N° 144-2010-EF
3ER. CONCURSO	181	268 895 903 ,00	254 390 739,00	D.S. N° 068-2010-EF
4TO. CONCURSO	206	273 106 889,00	145 304 526,00	D.S. N° 205-2010-EF
5TO. CONCURSO	266	462,049,961.96	455,018,676.00	D.S. N° 211-2011-EF
				D.S. N° 083-2012-EF
				D.S. N° 102-2013-EF
6TO. CONCURSO	96	141,568,993.96	141,522,217.00	D.S. N° 179-2012-EF
				D.S. N° 124-2013-EF
7MO. CONCURSO	161	193,688,812.67	190,980,151.00	D.S. N° 250-2013-EF
				D.S. N° 043-2014-EF
8VO. CONCURSO	386	603,793,235.16	581,537,849.00	D.S. N° 036-2014-EF
9NO. CONCURSO	454	827,064,730.54	237,690,761.00	D.S. N° 278-2014-EF
<b>TOTAL</b>	<b>2387</b>	<b>2,228,165,734.29</b>	<b>1,606,749,654.00</b>	

Las propuestas seleccionadas en el departamento de Ayacucho, en los nueve concursos, representan 409 propuestas entre proyectos y estudios; de los cuales se ha aprobado un cofinanciamiento por parte de FONIPREL S/. 581, 005,790.08 nuevos soles. Actualizado al tercer trimestre del presente, se ha realizado una transferencia de S/. 501, 647,966.91 nuevos soles, se muestra a detalle por convocatoria en el siguiente cuadro:

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
 "AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

Cuadro N° 2

**PROPUESTAS SELECCIONADAS – AYACUCHO**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)
1ER. CONCURSO	56	57,274,396.76	57,274,396.00
2DO. CONCURSO	41	39,950,272.80	39,950,287.00
3ER. CONCURSO	31	40,702,516.00	39,437,529.00
4TO. CONCURSO	37	60,904,218.00	60,904,218.00
5TO. CONCURSO	50	84,703,913.41	84,703,913.41
6TO. CONCURSO	21	28,046,626.88	27,999,826.88
7MO. CONCURSO	39	59,617,698.79	56,909,002.62
8VO. CONCURSO	65	114,115,230.94	111,935,270.00
9NO. CONCURSO	69	95,690,916.50	22,533,524.00
<b>TOTAL</b>	<b>409</b>	<b>581,005,790.08</b>	<b>501,647,966.91</b>

**2. INFORMACIÓN GENERAL**

El seguimiento a los proyectos de inversión pública (PIP) seleccionados en las convocatorias realizadas por el FONIPREL, se realizó con el objetivo de conocer su estado situacional, en relación al cumplimiento de las metas establecidas, plazos fijados y recursos asignados, a fin de tomar las acciones necesarias para superar las deficiencias que pudieran haberse producido.

La información que se presenta tiene como fuente: i) los informes trimestrales a setiembre 2014, presentados por las entidades visitadas del primer, segundo, tercer, quinta y sexto Concurso FONIPREL; y ii) las visitas in situ y reuniones personalizadas sostenidas con los beneficiarios en la semana del 22 al 26 de setiembre del presente.

En el departamento de Ayacucho se aprobaron hasta el noveno concurso, la elaboración / ejecución de 409 propuestas, de las cuales se han visitado 08 (2%).

Cuadro N° 3

**PROYECTOS VISITADOS – AYACUCHO (Norte –Centro)**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	MONTO EJECUTADO (S/.)
1ER. CONCURSO	1	1,171,761.00	1,171,761.00	1,171,761.00
2DO. CONCURSO	1	800,623.20	800,623.20	800,623.00
3ER. CONCURSO	2	4,869,645.00	4,869,645.00	4,635,498.53
5TO. CONCURSO	1	3,903,129.68	3,903,129.68	3,903,129.68
6TO. CONCURSO	3	9,842,436.00	9,842,436.00	9,842,436.00
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>20,587,594.88</b>	<b>20,587,594.88</b>	<b>20,353,448.21</b>

Los proyectos y estudios visitados (08), en lo referido al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de cofinanciamiento que a continuación se presentan el nivel que se indica en el Gráfico N° 1.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía


Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

1. El expediente técnico, tiene Resolución de aprobación
2. El estudio definitivo tiene informe de consistencia
3. Los cronogramas de ejecución física y financiera están actualizados
4. El beneficiario ha presentado sus informes trimestrales
5. El proyecto tiene variación de metas adecuadas a las normas SNIP (Para proyectos SNIP) o cuenta con aprobación del Órgano Resolutivo (Para proyectos no SNIP)
6. El beneficiario está registrado como Unidad Ejecutora en el Banco de Proyectos.
7. Tiene Acreditada la supervisión del proyecto en ejecución.
8. El beneficiario aporta su contrapartida de manera adecuada.

GRÁFICO Nº 1

NIVEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO  
EN PROYECTOS VISITADOS – AYACUCHO (Norte –Centro)

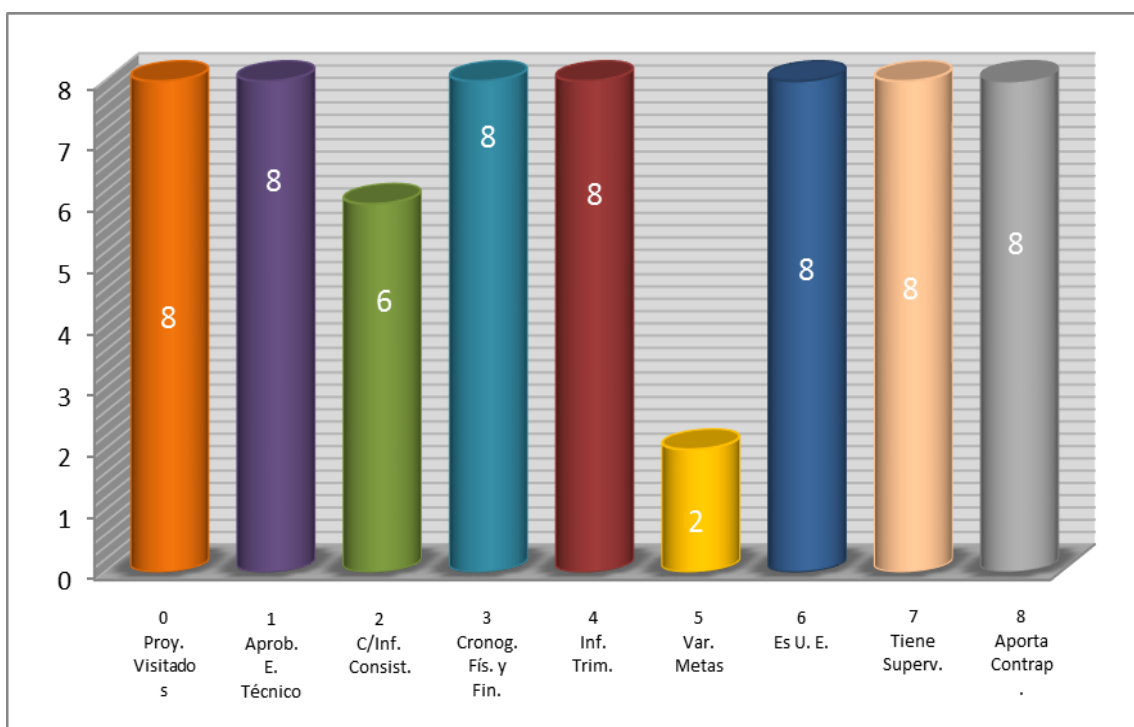



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública


"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

### 3. EJECUCIÓN FÍSICA

#### 3.1 Avance físico, según tipo de propuesta

Los 08 proyectos de Inversión Pública visitados en la región Ayacucho, presentan el avance físico global, siguiente:

Gráfico N° 02

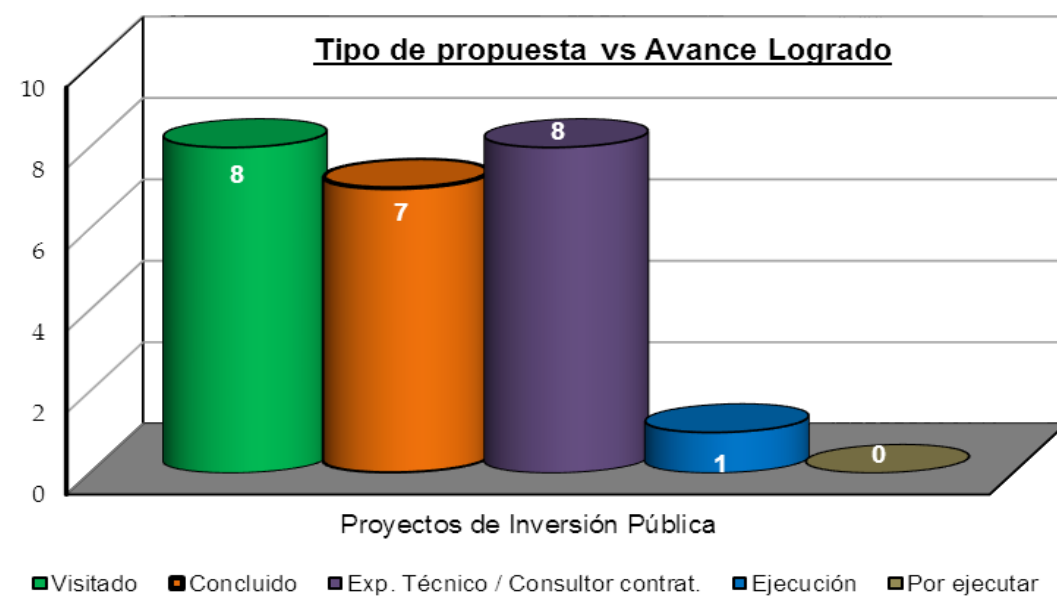

De los 08 Proyectos de Inversión Pública visitados 07 han concluido y 01 en ejecución, ninguno está pendiente de inicio. Sin embargo, está pendiente el informe de culminación de 04 proyectos, y 04 proyectos se encuentran observados su informe de culminación.

#### 3.2 Avance físico de cada proyecto visitado

La ejecución física de cada uno de los proyectos, visitados, presenta el estado situacional siguiente: 07 Proyectos de Inversión Pública se encuentran culminados y 01 PIP en ejecución. En el siguiente cuadro se puede observar el avance físico por cada PIP.

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
 "AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

**Cuadro N° 04**  
**AVANCE FÍSICO DE CADA PROYECTOS VISITADOS – AYACUCHO (Norte –Centro)**

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	POR INICIAR	AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEGÚN ETAPA DE EJECUCIÓN			AVANCE FISICO ACUMULADO (%)
				EN EXP. TÉCNICO	EN EJECUCIÓN	TERMINADA	
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO	6				1	100%
2	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	3				1	100%
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE PUTICA, INCARACCAY, HUAHUAPUQUIO, CHICHUCANCHA, HUANCARUCMA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	6				1	100%
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. HUMBERTO SÁNCHEZ DEL PINO DEL CENTRO POBLADO DE CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	6				1	100%
5	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LA I.E. SECUNDARIA "CARLOS CH. HIRAOKA" EN LA LOCALIDAD DE MACACHACRA	1				1	100%
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 347/MX-P DE MACACHACRA, EN LA LOCALIDAD DE MACACHACRA, DISTRITO DE IGUAÍN - HUANTA - AYACUCHO	2				1	100%
7	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOS INFANTILES DEL 1ER. NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS EE.SS. LEHEMAYO, BUENA GANA, SAN MARTÍN, ANCHIHUAY, ARHUIMAYO Y AMARGURA-MICRORED ANCO-RED SAN FRANCISCO, DIRESA AYACUCHO, DISTRITO DE ANCO-LA MAR	3				1	100%
8	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE YANASRACCAY - CUNYA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	5			1		77.63%
TOTAL					1	7	
AVANCE FISICO PORCENTUAL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)		1					100.00%
		2					100.00%
		3					100.00%
		5					77.63%
		6					100.00%

A continuación mencionamos algunos comentarios de lo observado en la visita a los siguientes proyectos:



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

- a) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO.
- El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla la Instalación del Sistema de Agua Potable: **Acción 1:** Instalación de línea de Conducción de agua potable reservorio Quicapata a reservorio San Joaquín, en una longitud de 3,086m, con tubería PVC UF ISO 4422 DN 160mm C-10 en 880 m, PVC UF ISO 4422 DN 160mm C-7.5 en 1,576 m y FºFº DN 160mm K-9 en 630m.- **Acción 2:** Construcción de reservorio agua V=500m³ será de tipo apoyado de forma circular con radio de 8 m. y altura 2.50m. de concreto armado.- **Acción 3:** Instalación de líneas de aducción: Instalación de tubería PVC UF ISO 4422 DN 160mm C-7.5 en 1,397.80m. desde el reservorio San Joaquín hacia las redes de distribución para los diversos sectores de abastecimiento, Andamarca, Santa Ana, San José y La Unión.- **Acción 4:** Ampliación de redes de Agua Potable: Instalación de 7,318.30m de tubería PVC UF ISO 4422 DN 110mm C-7.5, como redes de distribución en los diversos sectores del proyecto, Andamarca, Santa Ana, San José, Santa Cecilia y La Unión.- **Acción 5:** Mejoramiento de redes de agua potable. Cambio de tuberías existentes de AC DN 160mm. Con tuberías PVC UF ISO 4422 DN 160mm C-7.5 en 741.60m. - **Acción 6:** Instalaciones domiciliarias agua potable: Instalación de 368 unidades de conexiones domiciliarias en los diversos sectores del proyecto, Andamarca, Santa Ana, San José, Santa Cecilia y La Unión.- **Acción 7:** Planes y Programas de Educación Sanitaria: Talleres de sensibilización, difusión de medios documentales, visitas guiadas a las plantas de tratamiento, capacitaciones a la población beneficiaria. **En el Sistema de Alcantarillado:- Acción 1:** Ampliación de redes de Alcantarillado: Instalación de tubería PVC UF ISO 4435 DN 200mm S-25, en 12,615.69m en los diversos calles de los sectores de Andamarca, Santa Ana, San José, Santa Cecilia y La Unión.- **Acción 2:** Mejoramiento de colector: Instalación de tubería PVC UF ISO 4435 DN 200mm S-25 y FºFº K-7, en 341.99m en el colector N° 6. que es de tubería CSN DN 6".- **Acción 3:** Instalaciones domiciliarias de desagüe: Instalación de 367 unidades de conexiones domiciliarias en los diversos sectores del proyecto, Andamarca, Santa Ana, San José, Santa Cecilia y La Unión.
  - En la visita de Campo se verificaron las obras ejecutadas, en la cual se constató que el sistema de agua potable estaba concluido y en funcionamiento; así mismo por manifestación del Subgerente de Supervisión y Liquidación, se adicionaron mayores metrados de línea de distribución y conexiones domiciliarias, debido a que en el periodo de la formulación del PIP a nivel de perfil y la ejecución existió un desfase de 04 años, en el cual en la zona de intervención se tuvo migración e incremento de viviendas que no estuvieron considerados en el perfil,



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

motivo por el cual, se ha incrementado el cofinanciamiento por parte de la entidad en 359% aprox.

- La red de desagüe está concluida; así mismo por manifestación del Subgerente de Supervisión y Liquidación, se adicionaron mayores metros de línea de recolección y conexiones domiciliarias,
- De acuerdo a los documentos mostrados por la Subgerente de Supervisión y Liquidación, se ha ejecutado el programa de educación sanitaria.
- Lo que se encuentra pendiente es la presentación del Informe de culminación. Se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.

b) CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.

- El Proyecto de acuerdo al perfil, contempla sustituir las aulas existentes, del nivel inicial, primario y nivel secundario, bajo las siguientes características:- Sustitución de 03 aulas del nivel inicial (incluye servicios higiénicos internos), de un piso con techo aligerado y cobertura con teja.- Sustitución de 06 aulas del nivel primario, un pabellón de dos pisos de 03 aulas cada piso con techo aligerado.- Sustitución de 05 aulas del nivel secundario, un pabellón de dos pisos de 03 aulas por cada piso con techo aligerado.- Construcción de ambientes complementarios como: un pabellón que incluye 01 dirección, 01 sala de cómputo, 01 laboratorio para Química, Física, Biología, 01 sala para biblioteca y 01 aula multiuso.- Construcción de 02 escaleras para la comunicación de los pabellones de primaria, secundaria y los ambientes complementarios.- Construcción de servicios higiénicos para alumnos de primaria, secundaria y docentes.- Construcción de un patio multiuso y de formación para el nivel primaria y secundaria.- Implementación de mobiliarios, material educativo y equipos de cómputo.- Capacitación docente con énfasis en Lógico Matemático y Comunicación Integral.
- De la verificación hecha en la institución educativa, se constató que la obra está concluido y en funcionamiento, se ha realizado la ejecución respetando todos los componentes respecto del PIP viable. según manifestaron El director y los docentes de la I.E., manifiestan haber recibido la Obra con equipamiento y la capacitación, en el año 2011.
- Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la Institución Educativa y en buen estado de conservación, se observa que recibe mantenimiento adecuado.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

- Actualmente el informe de culminación fue subsanado por el beneficiario y presentado a FONIPREL, con fecha 15 de Octubre de 2014.
- c) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE PUTICA, INCARACCAY, HUAHUAPUQUIO, CHICHUCANCHA, HUANCARUCMA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO.
- El PIP Contempla la Construcción (sustitución) de infraestructura y residencia del personal en los Puestos de Salud de Putica, Huahuapuquio, Chichucancha y Huancarucma. Construcción del cerco perimétrico y obras exteriores en los puestos de salud de Incaraccay, Huahuapuquio, Chichucancha y Huancarucma y mejoramiento del cerco perimétrico del Puesto de salud Putica. Construcción (nueva) y mejoramiento de la infraestructura y residencia del personal del Puestos de salud de Incaraccay (programa arquitectónico enmarcado en los estándares de una distribución medico funcional adecuada a un establecimiento de salud tipo I-1). Adquirir mobiliario, mobiliario clínico y equipo biomédico necesario para todas las áreas de servicio en general a nivel de los cinco Puestos de Salud. Capacitación en el uso y programación de labores de mantenimiento y renovación periódica de los equipos existentes. Adquisición de Movilidad (moto lineal para los puestos de salud Putica, Incaraccay, Chichucancha y Huancarucma). Capacitación al personal en atención integral de salud del binomio madre -niño(a). Capacitación al personal en acciones extramurales. Capacitación al personal en gestión administrativa. Capacitación en la elaboración de planes de Adquisición de medicamentos e insumos. Elaboración del plan de capacitación en estrategias de empoderamiento de la población en prácticas de salud preventiva en niños(as) menores de 5 años de edad. Elaboración de investigación aplicada sobre el cuidado y salud de niños y niñas menores de 5 años de edad. Elaboración de programas de sensibilización sobre salud preventiva a la población e instituciones involucradas en general. Elaboración del plan de implementación del programa de consejería y educación sanitaria hacia a la población e instituciones involucradas con la salud de la infancia.
- De la verificación hecha en los puestos de Salud Incaraccay, Huahuapuquio y Putica, se constató que la obra está concluido y en funcionamiento. A los puestos de Salud Chichucancha y Huanrucma, no se pudo verificar, debido a que a 5 km de Cangallo de la única carretera que comunica a dichas localidades se encontraba escarbado una zanja



para instalar tubería de paso, que imposibilitó el paso del vehículo para continuar con la visita programada.

- Del puesto de Salud Incaraccay, la obra ejecutada cumple con los ambientes mínimo establecidos para un establecimiento de salud tipo I-1; se pudo observar que no funciona el grupo electrógeno, y tanque elevado de agua; además, como parte del equipamiento se ha entregado una moto lineal. Respecto a las capacitaciones, el personal del puesto de salud, menciona que no desconoce si realizaron capacitaciones con el Proyecto.
- Del puesto de Salud Huahuapuquio, la obra ejecutada cumple con los ambientes mínimo establecidos para un establecimiento de salud tipo I-1; además, como parte del equipamiento se ha entregado una moto lineal. Respecto a las capacitaciones, el personal del puesto de salud, menciona que no desconoce si realizaron capacitaciones con el Proyecto.
- Del puesto de Salud Putica, la obra ejecutada cumple con los ambientes mínimo establecidos para un establecimiento de salud tipo I-1; se pudo observar que área de Triage no cuenta con ambiente propio, se encuentra haciendo uso de un área común (pasadizo); además, como parte del equipamiento se ha entregado una moto lineal. Respecto a las capacitaciones, el personal del puesto de salud, menciona que no desconoce si realizaron capacitaciones con el Proyecto.
- Lo que se encuentra pendiente es la presentación del Informe de culminación. Se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.

d) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. HUMBERTO SÁNCHEZ DEL PINO DEL CENTRO POBLADO DE CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO.

- El PIP contempla la construcción de nuevos ambientes con material noble: 02 aulas de 56 m<sup>2</sup>, 01 Sala de Uso Múltiple (SUM) de 112 m<sup>2</sup>, 01 Aula de Cómputo de 84 m<sup>2</sup>, 01 Laboratorio Múltiple de 112 m<sup>2</sup> y 01 biblioteca de 84 m<sup>2</sup>; Mejoramiento del módulo de material noble existente; Construcción de 438.35 ml. de cerco perimétrico; Construcción de losa deportiva multiuso de 720 m<sup>2</sup>; Adquisición de mobiliarios para ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios y Capacitación a los padres de familia en los procesos de educación y formación de los niños en el hogar.
- De la verificación hecha en la institución educativa, se constató que la obra está concluido y en funcionamiento, se ha realizado la ejecución respetando todos los componentes de Infraestructura y equipamiento respecto del PIP viable. Otro, según manifestaron del director y los



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

docentes de la I.E., manifiestan no haber recibido la capacitación, que indica en el proyecto.

- Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la Institución Educativa y en buen estado de conservación, se observa que recibe mantenimiento adecuado.
- Lo que se encuentra pendiente es la presentación del Informe de culminación. Se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.

e) AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LA I.E. SECUNDARIA "CARLOS CH. HIRAOKA" EN LA LOCALIDAD DE MACACHACRA.

- El PIP consiste en la Construcción de: 06 aulas, dirección, administración (secretaría), laboratorio de ciencias, aula de cómputo, auditorium, biblioteca, sala de profesores, ambiente para APAFA, almacén y SS.HH. alumnos (varones y mujeres) con estructura de concreto armado y albañilería de ladrillo con losa aligerada inclinada a 02 aguas, así mismo la construcción del cerco perimétrico (609.4 ml).
- 2.- Capacitación e investigación en desarrollo agrícola, agropecuario y el fortalecimiento de las organizaciones escolares.
- 3.- Implementación con mobiliarios y equipos consistente en: 19 computadoras, 130 mesas bipersonales para aulas, 260 sillas para aulas, 10 pupitres, 80 sillas para auditorium, 30 sillas para biblioteca, 6 mesas para biblioteca, 19 muebles para computadora, instrumentos y materiales de ciencias, libros y materiales de estudio.
- Al momento de la visita de campo, se encontró que la infraestructura estaba en uso pleno por parte de los alumnos y profesores de la Institución Educativa.
- La obra se encuentra totalmente concluida, sin embargo se encuentra observado el informe de culminación correspondiente; además se ha observado deficiencias en los SS.HH alumnos (Varones y Mujeres) que por salvaguardar la integridad de los alumnos no se hace uso, además se ha verificado que no se ha realizado la entrega de materiales de ciencias, libros y materiales de estudio.
- El Director de la I.E. nos manifiesta que no se ha implementado el componente de Capacitación e investigación en desarrollo agrícola, agropecuario y el fortalecimiento de las organizaciones escolares.
- Se remitirá un oficio solicitando al beneficiario comunicando las recomendaciones formuladas y la presentación de los informes pendientes de entrega.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

- f) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 347/MX-P DE MACACHACRA, EN LA LOCALIDAD DE MACACHACRA, DISTRITO DE IGUAÍN - HUANTA - AYACUCHO.
- El PIP contempla la construcción de 04 aulas, dirección/secretaría, sala multiuso, guardianía, depósito, cocina, tanque elevado, Servicios Higiénicos (niños, niñas y docentes), todos con material noble y techo tipo loza aligerada; así mismo, y la construcción de 215 ml de cerco perimétrico, patio polideportivo y la Instalación de Juegos Infantiles.- Implementación con mobiliarios: 25 mesas circulares, 50 sillas para las aulas, 04 mesas para docentes, 08 estantes para docentes, 02 muebles para computadora, 05 mesas para ambientes administrativos, 10 sillas para ambientes administrativos, 04 estantes para ambientes administrativos; y equipos consistente en: 02 computadoras (uso administrativo), 02 Impresora, 01 Modulo de Materiales de Escritorio y 03 módulos Materiales Didácticos.- Capacitación y actualización a docentes.
  - Al momento de la visita de campo, se encontró que la infraestructura estaba en uso pleno por parte de los alumnos y profesores de la Institución Educativa.
  - La obra se encuentra totalmente concluida, se ha realizado la ejecución respetando todos los componentes respecto del PIP viable. según manifestaron El director y los docentes de la I.E., manifiestan haber recibido la Obra con equipamiento y la capacitación, en el año 2010.
  - Lo que se encuentra pendiente es la transferencia del proyecto al sector y subsanar las observaciones del Informe de culminación. Se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.
- g) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOS INFANTILES DEL 1ER. NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS EE.SS. LECHEMAYO, BUENA GANA, SAN MARTÍN, ANCHIHUAY, ARHUIMAYO Y AMARGURA-MICRORED ANCO-RED SAN FRANCISCO, DIRESA AYACUCHO, DISTRITO DE ANCO-LA MAR.
- El PIP consiste en la construcción de la unidad de vivienda médica y de servicios en los establecimientos de salud de Lechemayo y San Martín de material noble bajo un diseño estructural mixto: a porticado-confinado. - construcción de infraestructura nueva de los establecimientos de salud de Buena Gana, Anchihuay, Arhuimayo y amargura, todos de material noble con diseño estructural mixto: a porticado-confinado; implementación de equipos médicos estratégicos para los 06 puestos de salud, según categoría; capacitación a los profesionales de la salud en técnicas de



gestión y comunicación; campañas y servicios de promoción, información y prevención

- De la verificación hecha en los puestos de Salud Anchiuay, San Martin y Arhuimayo, se constató que la obra está concluido y en funcionamiento. A los puestos de Salud Lechemayo, Buena Gana y Amargura, no se pudo verificar, debido a la distancia y por limitaciones de tiempo y combustible.
- Del puesto de Salud Anchiuay, la obra ejecutada cumple con los ambientes mínimo establecidos para un establecimiento de salud tipo I-1; no se pudo verificar si funciona o no el grupo electrógeno (indican que nunca hicieron uso, no cuentan con la llave). Además, la cobertura de techo no es adecuado para la zona, existe fuertes filtraciones, que requiere una rehabilitación. Respecto al equipamiento, el personal responsable de Salud, indica que no se hicieron entrega del 100% de lo que indica en el perfil.
- Del puesto de Salud San Martin, se ejecutó un pabellón de atención de servicio, Caseta de Bombeo y caseta para el grupo Electrónico, pero en el perfil estuvo programado una Residencia de personal, mas no área de servicio, existe dicha modificación de meta. Así mismo, no se pudo verificar si funciona o no el grupo electrógeno (indican que nunca hicieron uso, no cuentan con la llave). Además, la cobertura de techo no es adecuado para la zona, existe fuertes filtraciones, que requiere una rehabilitación. Respecto al equipamiento, el personal responsable de Salud, indica que no se hicieron entrega del 100% de lo que indica en el perfil.
- Del puesto de Salud Arhuimayo, se ejecutó un pabellón de Residencia de Personal, Caseta de Bombeo y caseta para el grupo Electrónico, pero en el perfil estuvo programado un área de atención de servicio, más no Residencia de personal, existe dicha modificación de meta. Así mismo, no se pudo verificar si funciona o no el grupo electrógeno (indican que nunca hicieron uso, no cuentan con la llave). Respecto al equipamiento, el personal responsable de Salud, indica que no se hicieron entrega del 100% de lo que indica en el perfil.
- Lo que se encuentra pendiente es la subsanación del Informe de culminación. Se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.

h) REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE YANASRACCAY - CUNYA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

- El PIP consiste en la Rehabilitación y el Mejoramiento en una longitud total de 32.56 Km. Mediante la colocación de la capa de afirmado en un



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

espesor de 0.20 m. en un ancho de 5 m., manteniendo el trazo original de la vía y ampliando las plataformas angostas en zonas críticas. Construcción de obras de arte y drenaje nuevas debido a su inexistencia a lo largo de toda la vía. Construcción de muros de contención y protección a fin de conservar la plataforma vial contra la erosión y socavamiento. Señalización informativa, preventiva, reglamentaria de la vía, debido a su inexistencia a lo largo de toda la vía. Mantenimiento periódico y rutinario una vez ejecutada la rehabilitación y mejoramiento. Medidas de Mitigación Ambiental.

- Al momento de la visita de campo, se encontró que el proyecto se encuentra en proceso de construcción, con un avance aproximado del 77.63%, en la cual se han realizado voladuras, tendido de base y construcción de obras de arte. Faltando de ejecutar los componentes de capa de afirmado, cunetas, señalizaciones y pontones.
- El retraso de la ejecución de obra, se debió a que la Municipalidad ha realizado la intervención económica al consorcio RUPA RUPA, el 02 de agosto de 2013, por incumplir en alcanzar por menos de 80% del monto programado acumulado del nuevo calendario. Recién con fecha 07 de marzo de 2014, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 111-2014-MPH/GM se resuelve declarar finalizada la intervención económica y por consiguientes resolver el Contrato de Ejecución de Obra. Actualmente, vienen ejecutando por administración Directa.
- Se pudo observar el limitado número de máquinas y personal asignado para la ejecución de obra. Según Manifiesta el Residente de Obra, se debe a la limitada asignación presupuestal por parte de la Entidad, y al poco interés de las personas en trabajar por la ubicación del proyecto (puna).
- Lo que se encuentra pendiente es la presentación de los informes trimestrales I, II y III - 2014. Se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.

#### 4. EJECUCIÓN FINANCIERA

El FONIPREL tiene como fuentes de financiamiento, las señaladas en el Artículo 6° de la Ley 29125, Ley que establece su implementación y funcionamiento, habiendo transferido a los GGLL y GGRR, a setiembre de 2014, por efectos de los sexto primeros concursos, la suma de S/. 310, 270,170.29; habiéndose efectuado las transferencias conforme a una programación financiera presentada por el beneficiario a la firma del convenio, en el ámbito correspondiente a la Región Ayacucho.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas


Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

#### 4.1 Ejecución financiera según fuente de financiamiento

Los PIP objeto de las visitas de campo, alcanzan una inversión total de S/. 23, 850,085.94 nuevos soles, de los cuales estuvo programado ejecutar hasta la fecha la totalidad. Se ha logrado una ejecución financiera de S/. 25, 103,134.84 nuevos soles (105.25%), del monto ejecutado, el 98.86% provienen de la fuente FONIPREL y el 145.58% de la fuente de los beneficiarios. En el gráfico N° 03 se presenta la información señalada.

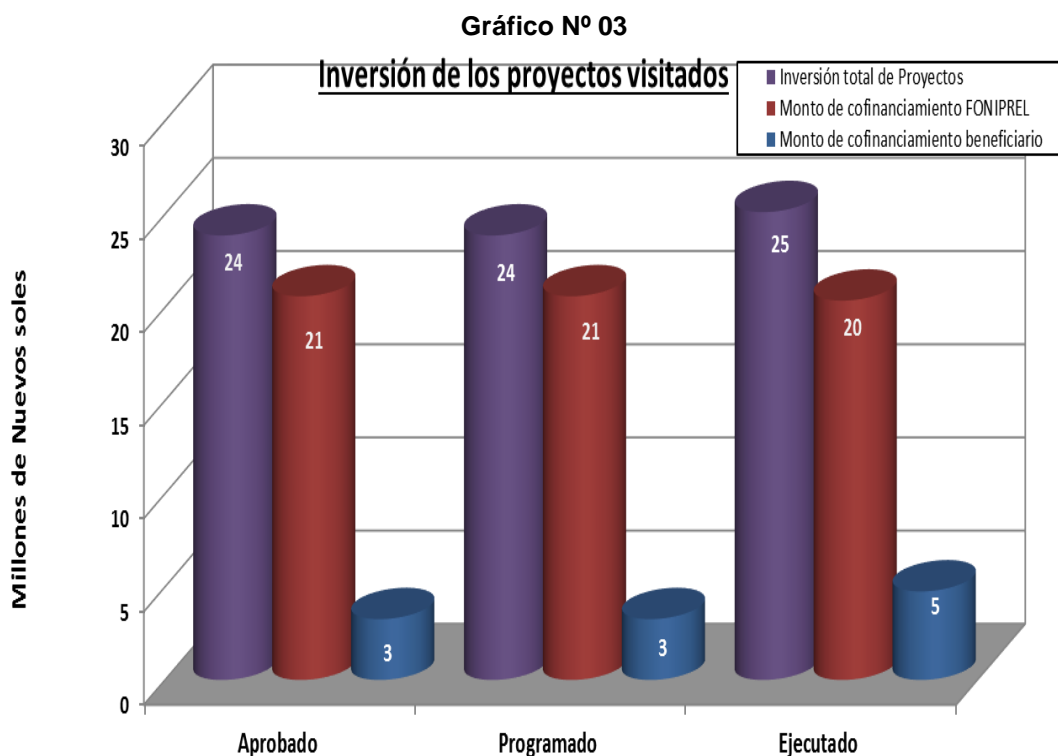

#### 4.2 Avance financiero de cada proyecto visitado.

La ejecución financiera de cada uno de los proyectos visitados, presenta el estado situacional siguiente:





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

**Cuadro N° 06**

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	DEL CONVENIO		DE LA INVERSIÓN		AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)
			INVERSIÓN TOTAL	COFINANC.	PROGRAM. A SETIEMBRE 2014	EJECUTADA A SETIEMBRE 2014	
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO	6	3,523,726.32	3,171,353.00	3,171,353.00	3,171,353.00	100.00%
2	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	3	2,461,029.00	1,968,823.00	1,968,823.00	1,763,210.53	89.56%
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE PUTICA, INCARACCAY, HUAHUAPUQUIO, CHICHUCANCHA, HUANCARUCMA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	6	5,155,469.00	4,639,922.00	4,639,922.00	4,639,922.00	100.00%
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. HUMBERTO SÁNCHEZ DEL PINO DEL CENTRO POBLADO DE CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	6	2,256,846.00	2,031,161.00	2,031,161.00	2,031,161.00	100.00%
5	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LA I.E. SECUNDARIA "CARLOS CH. HIRAOKA" EN LA LOCALIDAD DE MACACHACRA	1	1,673,944.00	1,171,761.00	1,171,761.00	1,171,761.00	100.00%
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 347/MX-P DE MACACHACRA, EN LA LOCALIDAD DE MACACHACRA, DISTRITO DE IGUAÍN - HUANTA - AYACUCHO	2	1,000,779.00	800,623.20	800,623.20	800,623.00	100.00%
7	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOS INFANTILES DEL 1ER. NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS EE.SS. LECHEMAYO, BUENA GANA, SAN MARTÍN, ANCHIHUAY, ARHUIMAYO Y AMARGURA-MICRORED ANCO-RED SAN FRANCISCO, DIRESA AYACUCHO, DISTRITO DE ANCO-LA MAR	3	3,626,027.00	2,900,822.00	2,900,822.00	2,872,288.00	99.02%
8	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE YANASRACCAY - CUNYA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	5	4,152,265.62	3,903,129.68	3,903,129.68	3,903,129.68	100.00%
<b>TOTAL</b>			<b>23,850,085.94</b>	<b>20,587,594.88</b>	<b>20,587,594.88</b>	<b>20,353,448.21</b>	<b>98.86%</b>
AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)			1				100.00%
			2				100.00%
			3				94.29%
			5				100.00%
			6				100.00%

A continuación mencionamos algunos comentarios del avance financiero observado en la visita a los siguientes proyectos:





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

- En General todos los proyectos visitados tienen un avance financiero ligeramente por encima de lo programado, que viene a ser 105.25%.
- Los proyectos visitados tienen un nivel de cumplimiento de su contrapartida que va del 0% al 358%. haciendo un promedio de cofinanciamiento de 145% por parte de los beneficiarios.

## 5. PRINCIPALES LOGROS

- 07 PIP visitados se encuentran en culminados y 01 PIP se encuentra de Ejecución.
- 26 aulas construidas
- 11 puestos de salud tipo I-1 construidos
- 368 conexiones domiciliarias de agua potable
- 367 conexiones domiciliarias de desagüe.

## 6. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS

- Incumplimiento mayoritario de la normatividad del SNIP para la ejecución de proyectos, es así que de 08 proyectos visitados 02 no cuentan con informe de consistencia, pese a estar obligados por la vigencia de la Directiva a partir de febrero del 2009; y 03 proyectos han realizado modificaciones sin informar de ello a la OPI institucional.
- Escasa información documentada en los municipios visitados, sólo dos tiene sus informes completos.
- Hay siete proyectos concluidos, sin embargo tres convenios no han remitido a la Secretaría Técnica de FONIPREL.
- De los otros cuatro convenios concluidos, los informes de culminación se encuentran observados.

## 7. CONCLUSIONES

- El FONIPREL se encuentra cofinanciando la ejecución / elaboración de 409 PIP/estudios, en la Región Ayacucho seleccionados hasta la novena Convocatoria.
- El importe del cofinanciamiento otorgado por el FONIPREL en las nueve convocatorias asciende a S/. 281,006 millones, de los cuales se han transferido a los GGRR y GGLL, el 86%.
- De los ocho PIPs visitados, siete proyectos, han concluido su ejecución física, sin embargo hasta la fecha se encuentran observados sus informes de culminación de cuatro proyectos y se encuentran omisas de presentación de tres proyectos.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

- Los 08 PIP, se ha ejecutado el 145.25% del presupuesto total aprobado, de los cuales, desagregando por fuente de financiamiento, el 98.86% del presupuesto comprometido por FONIPREL está ejecutado y el 145.58% de la contrapartida comprometida ha sido ejecutada hasta la fecha.

## 8. PANEL FOTOGRÁFICO

Ver Anexo 1

Lima, octubre de 2014

---

Edgar Román Romo  
Analista FONIPREL

er/jq/EDC



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

## ANEXO N° 01

### PANEL FOTOGRÁFICO DE OBRAS

<b>1. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA			
<b>REGIÓN:</b> AYACUCHO	<b>PROVINCIA:</b> HUAMANGA	<b>DISTRITO:</b> OCROS	<b>LOCALIDAD:</b> CHUMBES
<b>OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 2,461,029.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 1,968,823.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	102299		



Vista del pabellón ejecutado del nivel  
Primario



Vista del pabellón ejecutado del nivel  
Secundario

<b>2. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA			
<b>REGIÓN:</b> AYACUCHO	<b>PROVINCIA:</b> HUAMANGA	<b>DISTRITO:</b> HUAMANGA	<b>LOCALIDAD:</b> BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 3,523,726.32	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 3,171,353.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	71059		



Vista del Reservorio Ejecutado



Vista de Construcción de puente aéreo de  
línea de conducción de agua potable





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

<b>3. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO			
<b>REGIÓN:</b> AYACUCHO	<b>PROVINCIA:</b> CANGALLO	<b>DISTRITO:</b> CANGALLO	<b>LOCALIDAD:</b> PUTICA, INCARACCAY, HUAHUAPUQUIO, CHICHUCANCHA, Y HUANCARUCMA
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE PUTICA, INCARACCAY, HUAHUAPUQUIO, CHICHUCANCHA, HUANCARUCMA DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 5,155,469.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 4,639,922.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	177481		



Vista construcción del puesto de Salud  
Incaraccay



Vista de equipamiento en Puesto de Salud



Vista construcción del puesto de Salud  
Huapuquio – Almacén y Tanque Elevado



Vista construcción del puesto de Salud  
Huapuquio – zona de ambientes de Atención



Vista construcción del puesto de Salud Putica



Vista de equipamiento en Puesto de Salud



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

<b>4. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO				
<b>REGIÓN:</b> AYACUCHO	<b>PROVINCIA:</b> CANGALLO	<b>DISTRITO:</b> LOS MOROCHUCOS	<b>LOS</b>	<b>LOCALIDAD:</b> CHANQUIL
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. HUMBERTO SÁNCHEZ DEL PINO DEL CENTRO POBLADO DE CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO				
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 2,256,846.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b> S/. 2,031,161.00		
<b>CODIGO SNIP:</b>	196149			



Vista de Obra de Ingreso de la I.E.  
Humberto Sanchez del Pino



Vista de Obra de Pabellón

5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN			
REGIÓN: AYACUCHO	PROVINCIA: HUANTA	DISTRITO: IGUAIN	LOCALIDAD: MACACHACRA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 347/MX-P DE MACACHACRA, EN LA LOCALIDAD DE MACACHACRA, DISTRITO DE IGUAÍN - HUANTA – AYACUCHO.			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 1,000,779.00	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 800,623.20
CODIGO SNIP:	101653		



Vista de Obra de Pabellón Administrativo



Vista de Obra Pabellón Aulas



**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
 "AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

<b>6. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN			
<b>REGIÓN:</b> AYACUCHO	<b>PROVINCIA:</b> HUANTA	<b>DISTRITO:</b> IGUAIN	<b>LOCALIDAD:</b> MACACHACRA
<b>OBRA:</b> AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LA I.E. SECUNDARIA "CARLOS CH. HIRAOKA" EN LA LOCALIDAD DE MACACHACRA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 1,673,944.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 1,171,761.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	69727		



Vista de Obra de Ingreso de la I.E. Carlos Ch.  
Hiraoka



Vista de Obra Pabellón de Aulas

<b>7. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO			
<b>REGIÓN:</b> AYACUCHO	<b>PROVINCIA:</b> LA MAR	<b>DISTRITO:</b> ANCO	<b>LOCALIDAD:</b> LECHEMAYO, BUENA GANA, SAN MARTÍN, ANCHIHUAY, ARHUIMAYO Y AMARGURA
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOS INFANTILES DEL 1ER. NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS EE.SS. LECHEMAYO, BUENA GANA, SAN MARTÍN, ANCHIHUAY, ARHUIMAYO Y AMARGURA- MICRORED ANCO-RED SAN FRANCISCO, DIRESA AYACUCHO, DISTRITO DE ANCO-LA MAR.			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 3,626,207.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 2,900,822.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	124851		



Vista de Obra de modulo atención del  
Puesto de Salud Anchiuay



Vista de Obra de modulo residencia  
Personal Puesto de Salud Anchiuay





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "



Vista de Motocicleta adquirido con el Proyecto para el Puesto de Salud Anchihuay



Vista de Ingreso al Puesto de Salud San Martín



Vista de Ingreso al Puesto de Salud San Martín



Vista de Obra de modulo atención del Puesto de Salud San Martin



Vista de Motocicleta adquirido con el Proyecto para el Puesto de Salud San Martin



Vista de Ingreso al Puesto de Salud Arhuimayo





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "



Vista de Obra de modulo atención del  
Puesto de Salud Arhuimayo



Personal de Puesto de Salud Arhuimayo, verificando el  
equipamiento entregado según el Perfil

<b>8. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA			
<b>REGIÓN:</b> AYACUCHO	<b>PROVINCIA:</b> HUANTA	<b>DISTRITO:</b> HUANTA	<b>LOCALIDAD:</b>
<b>OBRA:</b> REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE YANASRACCAY - CUNYA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 4,152,265.62	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 3,903,129.68
<b>CODIGO SNIP:</b>	176020		



Vista de Obra de construcción de Pontón en  
el Km 28+24



Vista de Obra de mejoramiento de afirmado  
en el Km 14+00



Vista de Obra de en ejecución en el Km 20 y  
21



Vista de trabajo en Almacén en la localidad de  
Uchuraccay- 24
