

FONIPREL

**FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA
REGIONAL Y LOCAL**

Secretaría Técnica

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PUNO

VISITA DE CAMPO SETIEMBRE 2014

Lima, octubre de 2014

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de EconomíaDirección
General de Inversión Pública"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "**FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL FONIPREL****INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS– VISTAS DE CAMPO - PUNO****1. ANTECEDENTES**

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, a Setiembre de del 2014, ha realizado 09 Concursos para el Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública y Estudios de Preinversión.

En el siguiente cuadro se detalla información referida a las propuestas seleccionadas en los nueve concursos

Cuadro Nº 01
PROPUESTAS SELECCIONADAS EN LOS CONCURSOS FONIPREL

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE TRANSFERENCIA
1ER. CONCURSO	372	376 779 924,00	375 822 955,00	D.S. Nº 116-2008-EF
				D.S. Nº 062-2009-EF
				D.S. Nº 111-2010-EF
2DO. CONCURSO	265	294 685 998,00	293 843 755,00	D.S. Nº 089-2009-EF
				D.S. Nº 144-2010-EF
3ER. CONCURSO	181	268 895 903 ,00	254 390 739,00	D.S. Nº 068-2010-EF
4TO. CONCURSO	206	273 106 889,00	145 304 526,00	D.S. Nº 205-2010-EF
5TO. CONCURSO	266	462,049,961.96	455,018,676.00	D.S. Nº 211-2011-EF
				D.S. Nº 083-2012-EF
				D.S. Nº 102-2013-EF
6TO. CONCURSO	96	141,568,993.96	141,522,217.00	D.S. Nº 179-2012-EF
				D.S. Nº 124-2013-EF
7MO. CONCURSO	161	193,688,812.67	190,980,151.00	D.S. Nº 250-2013-EF
				D.S. Nº 043-2014-EF
8VO. CONCURSO	386	603,793,235.16	581,537,849.00	D.S. Nº 036-2014-EF
9NO. CONCURSO	454	827,064,730.54	237,690,761.00	D.S. Nº 278-2014-EF
TOTAL	2387	2,228,165,734.29	1,606,749,654.00	

Las propuestas seleccionadas en el departamento de Puno, en los nueve concursos, representan 197 propuestas entre proyectos y estudios; de los cuales se ha aprobado un cofinanciamiento por parte de FONIPREL S/. 290, 734,216.35. Actualizado al tercer trimestre del presente, se ha realizado una transferencia de S/. 250, 987,239.96, se muestra a detalle por convocatoria en el siguiente cuadro:

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de EconomíaDirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

Cuadro N° 02
PROPUESTAS SELECCIONADAS - PUNO

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)
1ER. CONCURSO	27	25,228,378.16	25,228,376.00
2DO. CONCURSO	14	25,775,868.96	25,775,868.96
3ER. CONCURSO	19	36,286,920.00	32,101,322.00
4TO. CONCURSO	28	33,939,685.00	33,939,685.00
5TO. CONCURSO	17	21,269,420.00	19,606,334.00
6TO. CONCURSO	12	17,086,981.00	17,086,981.00
7MO. CONCURSO	13	21,090,255.00	21,090,255.00
8VO. CONCURSO	28	49,067,302.00	49,067,302.00
9NO. CONCURSO	39	60,989,406.23	27,091,116.00
TOTAL	197	290,734,216.35	250,987,239.96

2. INFORMACIÓN GENERAL

El seguimiento a los proyectos de inversión pública (PIP) seleccionados en las convocatorias realizadas por el FONIPREL, se realizó con el objetivo de conocer su estado situacional, en relación al cumplimiento de las metas establecidas, plazos fijados y recursos asignados, a fin de tomar las acciones necesarias para superar las deficiencias que pudieran haberse producido.

La información que se presenta tiene como fuente: i) los informes trimestrales a setiembre 2014, presentados por las entidades visitadas del primer, segundo, tercer, quinta y sexto Concurso FONIPREL; y ii) las visitas in situ y reuniones personalizadas sostenidas con los beneficiarios en la semana del 22 al 26 de setiembre del presente.

En el departamento de Puno se aprobaron hasta el noveno concurso, la elaboración / ejecución de 197 propuestas, de las cuales se han visitado 07 (3.5%).

Cuadro N° 03
PROYECTOS VICITADOS - PUNO


CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	MONTO EJECUTADO (S/.)
1ER. CONCURSO	1	2,461,196.00	2,461,196.00	2,250,698.00
2DO. CONCURSO	1	18,614,168.00	18,614,168.00	18,614,138.00
3ER. CONCURSO	2	13,044,572.00	13,044,572.00	12,860,822.00
4TO. CONCURSO	1	5,169,091.00	5,169,091.00	5,169,092.00
TOTAL	8	39,289,027.00	39,289,027.00	38,894,750.00

Los proyectos visitados (07), en lo referido al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de cofinanciamiento que a continuación se presentan el nivel que se indica en el Gráfico N° 1.

1. El expediente técnico, tiene Resolución de aprobación
2. El estudio definitivo tiene informe de consistencia
3. Los cronogramas de ejecución física y financiera están actualizados
4. El beneficiario ha presentado sus informes trimestrales
5. El proyecto tiene variación de metas adecuadas a las normas SNIP (Para proyectos SNIP) o cuenta con aprobación del Órgano Resolutivo (Para proyectos no SNIP)
6. El beneficiario está registrado como Unidad Ejecutora en el Banco de Proyectos.
7. Tiene Acreditada la supervisión del proyecto en ejecución.
8. El beneficiario aporta su contrapartida de manera adecuada.

GRÁFICO N° 1

**NIVEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO EN
PROYECTOS VISITADOS – PUNO**

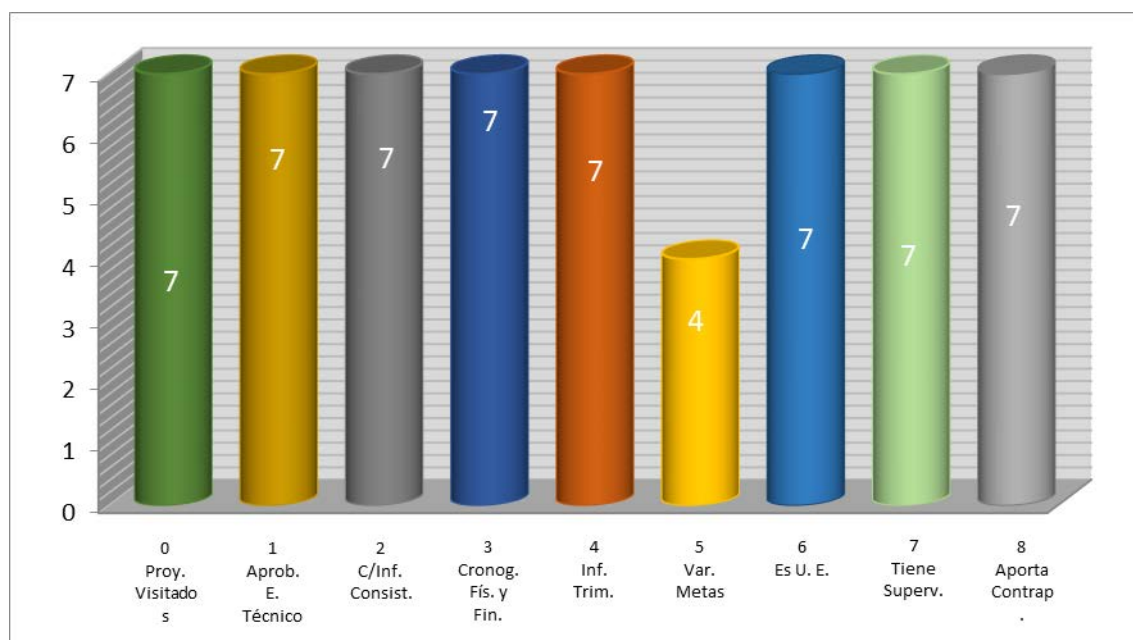


3. EJECUCIÓN FÍSICA

3.1 Avance físico, según tipo de propuesta

Los 07 proyectos de Inversión Pública visitados en la región Puno, presentan el avance físico global, siguiente:

Gráfico Nº 02

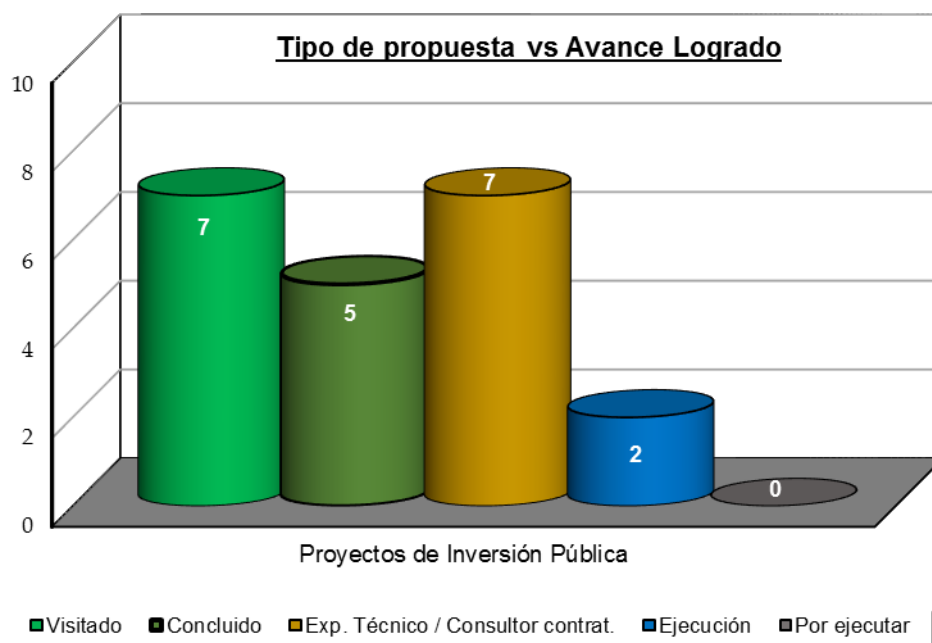

De los 07 Proyectos de Inversión Pública visitados 05 han concluido y 02 en ejecución, ninguno está pendiente de inicio. Sin embargo, está pendiente el informe de culminación de 02 proyectos, y 05 proyectos se encuentran observados su informe de culminación.

3.2 Avance físico de cada proyecto visitado

La ejecución física de cada uno de los proyectos, visitados, presenta el estado situacional siguiente: 05 Proyectos de Inversión Pública se encuentran culminados y 02 PIP en ejecución. En el siguiente cuadro se puede observar el avance físico por cada PIP.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

Cuadro N° 04
AVANCE FÍSICO DE CADA PROYECTOS VISITADOS – PUNO

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	POR INICIAR	AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEGÚN ETAPA DE EJECUCIÓN			AVANCE FISICO ACUMULADO (%)
				EN EXP. TÉCNICO	EN EJECUCIÓN	TERMINADA	
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 PUNO	1				1	100%
2	CONSTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN CABANILLA II ETAPA	3				1	100%
3	CONSTRUCCIÓN IRRIGACIÓN ORURILLO POSOCONI	2				1	100%
4	CONSTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN NEQUENEQUE MUÑANI	4				1	100%
5	MEJORAMIENTO EN LA IEP N° 70480 "NIÑO JESÚS DE PRAGA"- AYAVIRI	1				1	100%
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	4				1	100%
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL "K" SECTORES HUACAUTA, PUYUPATA, NORTE PAYLLA Y CHIMPASTANA, MELGAR	2				0	98%
TOTAL					1	6	
AVANCE FISICO PORCENTUAL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)		1					100.00%
		2					100.00%
		3					100.00%
		5					77.63%
		6					100.00%



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

A continuación mencionamos algunos comentarios de lo observado en la visita a los siguientes proyectos:

a) FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 PUNO

- El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla Mejoramiento de los ambientes, sustituyendo con construcción de material noble, con techo de loza aligerada de concreto armado:
 - Construcción de 02 aulas Pedagógicas
 - Construcción de 08 Talleres para Prácticas Técnico Productivos
 - Construcción de 01 Laboratorio Integrado de CTA
 - Construcción de 01 Taller de Banda Música
 - Construcción de 01 Taller de Educación Física
 - Construcción de 01 Sala de Capacitación y de Usos Múltiples
 - Construcción de 01 Taller de Educación Artística
 - Construcción de 01 Aula Innovación Pedagógica Tecnológica
 - Construcción de 01 Centro de Idiomas Extranjero / Originario
 - Construcción de 01 Sala de Docentes
 - Construcción 01 Biblioteca de Recursos Educativos
 - Construcción de 01 Centro de Orientación Educativa y Tutoría
 - Ambientes complementarios pequeños
 - Sub Dirección de Formación General
 - Sub Dirección de Áreas Técnicas
 - Sub Dirección de Administración
 - Sub Dirección de Turno Nocturno
 - 02 Secretarías
 - Guardianía
 - SS.HH
 - Construcción de 03 Cajas de escalera
 - Construcción de 01 Plataforma Deportiva Multiuso
 - Construcción de 74.05 M.L de cerco perimétrico
 - Capacitación a los docentes en didáctica educativa
 - Capacitación a los docentes para Fortalecimiento en Áreas de Formación Laboral (Industria de Vestidos, Textil, Electrónica, Electricidad, Informática y Computación, Cosmetología, Industria, Alimentaria y Construcción Civil)
 - Realización de evento Tecnológico
 - Expo feria Escolar Industrial

- Desarrollo de eventos "Escuela de Padres"
 - Reforzamiento con equipamiento de máquinas, herramientas y mobiliario de los Talleres Técnico Productivos (Industria de Vestidos, Textil, Electrónica, Electricidad, Informática y Computación, Cosmetología, Industria Alimentaria y Construcción Civil)
 - Reforzamiento con equipamiento de máquinas, herramientas y mobiliario de los Talleres y/o Ambientes de apoyo a la enseñanza educativa (Laboratorio Integrado CTA, Taller de Banda- Música, Taller de Educación Física, Sala de Capacitación y Usos Múltiples, Taller de Educación Artística, Aula de Innovación Pedagógica – Tecnológica, Centro de Idioma extranjera / Originario y Sala de Docentes)
 - Reforzamiento con mobiliario escolar para las aulas pedagógicas.
 - Capacitación al personal administrativo y directivo para una adecuada gestión institucional.
- En la visita de Campo se verificaron las obras ejecutadas, los ambientes fueron construidos y en alguno de ellos, por ejemplo el taller de alimentaria, tiene mayores metrados. El taller de música y guardería que inicialmente contemplado como ambientes separados, a la fecha funcionan en un solo ambiente. Los 8 talleres fueron construidos en su totalidad y en uso. La obra está en funcionamiento.
 - Lo que se encuentra pendiente es la presentación del Informe de culminación. Se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.

Fachada de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 - Puno



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

Pabellón donde funcionan los 08 talleres



Plataforma deportiva Multiusos



Aula Innovación Pedagógica Tecnológica para docentes



Taller de Computación y cosmetología



b) CONTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN CABANILLA II ETAPA

- El Proyecto de acuerdo al perfil, contempla Estudio definitivo, mejoramiento de Bocatoma, construcción de canal Principal en concreto, construcción de canal Lateral en concreto, construcción de drenes superficiales, cursos de Capacitación, asistencia técnica a usuarios de riego, pasantías a sistemas de riego, instalación de parcelas demostrativas, medidas de mitigación ambiental, gastos administrativos del proyecto.
- De la verificación hecha en el canal, se constató que la obra está concluida y en funcionamiento, los tramos del canal principal que contempla el PIP, han sido ejecutados y en uso, las compuertas donde dan inicio los canales laterales están en funcionamiento. Por falta de tiempo no se ha podido verificar todo el tramo de los canales laterales sólo se ha recorrido el canal principal de principio a fin. Actualmente el informe de culminación fue subsanado por el beneficiario y presentado a FONIPREL.

Bocatoma del Canal Cabanillas



Canal Principal de Cabanillas



Kilómetro 20.8 del canal principal y fin del canal



c) CONSTRUCCIÓN IRRIGACIÓN ORURILLO POSOCONI

- El PIP Contempla los siguientes componentes:
 - Estudio definitivo.
 - Construcción de 01 bocatoma.
 - Construcción de 15.825 km de canal principal revestido de concreto.
 - Construcción de 22.775 km de canal lateral revestido de concreto.
 - Construcción de 3.375 km de Drenes superficiales.

- Curso de capacitación 08 eventos.
 - Asistencia técnica a 2159 usuarios de riego.
 - Pasantías a sistemas de riego 03 visitas.
 - Instalación de parcelas demostrativas de 5 hras.
 - Capacitación del personal de PRORRODRE en 2 eventos.
 - Medidas de mitigación ambiental.
 - Gastos administrativos del proyecto.
- De la verificación hecha en el canal, se constató que la obra está concluida y en funcionamiento, los tramos del canal principal que contempla el PIP, han sido ejecutados y en uso, las compuertas donde dan inicio los canales laterales están en funcionamiento. Por falta de tiempo no se ha podido verificar todo el tramo de los canales laterales sólo se ha recorrido el canal principal de principio a fin. Actualmente el informe de culminación fue subsanado por el beneficiario y presentado a FONIPREL.

Bocatoma del canal de Orurillo-Posoconi



Canal Principal



En canal principal en el kilómetro 15.6 y el final



d) MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN NEQUENEQUE MUÑANI

- El PIP contempla los siguientes componentes y actividades:
 - Construcción de Bocatoma.
 - Construcción de canal Principal revestido de concreto.
 - Construcción de canal Lateral revestido de concreto.
 - Cursos de Capacitación.
 - Asistencia técnica a usuarios de riego.
 - Pasantías a sistemas de riego.
 - Instalación de Parcelas Demostrativas.
 - Medidas de Mitigación Ambiental.
 - Gastos administrativos del proyecto.
- De la verificación hecha en el canal, se constató que la obra está concluida y en funcionamiento, los tramos del canal principal que contempla el PIP, han sido ejecutados y en uso, las compuertas donde dan inicio los canales laterales están en funcionamiento. Por falta de tiempo no se ha podido verificar todo el tramo de los canales laterales sólo se ha recorrido el canal principal de principio a fin. Actualmente el informe de culminación fue subsanado por el beneficiario y presentado a FONIPREL.

Bocatoma del canal Nequeneque - Muñani



El inicio del canal lateral y parte del canal principal



Final del canal principal



e) MEJORAMIENTO EN LA IEP N° 70480 "NIÑO JESÚS DE PRAGA"- AYAVIRI

- El PIP consiste en la Construcción de:
 - Infraestructura
 - Construcción de 04 aulas.
 - Construcción de 04 ambientes administrativos (dirección, biblioteca, laboratorio de ciencia y tecnología, cocina y servicios higiénicos).
 - Construcción de plataforma deportiva.
 - Construcción de cerco perimétrico.
 - Mobiliario y equipos adecuados.
 - Adquisición de computadoras.
 - Adquisición de proyector multimedia.

- Adquisición de impresora.
- Adquisición de televisor.
- Adquisición de un DVD.
- Adquisición de módulos de mobiliario escolar.

Capacitación a docentes.

- Capacitación docente en diversificación curricular.
 - Capacitación docente en proyecto curricular.
 - Capacitación docente en implementación y ejecución curricular.
 - Capacitación en integración de las TIC en las sesiones de aprendizaje.
- Al momento de la visita de campo, se encontró que la infraestructura estaba en uso pleno por parte de los alumnos y profesores de la Institución Educativa.
 - Parte del equipamiento, como son el DVD, computadoras, y algunos mobiliarios escolares están en desuso por falta de mantenimiento.
 - Según manifiesta el director del plantel, se ha cumplido con las capacitaciones según indica el perfil y se comprometió adjuntar las actas firmadas una vez presenten el levantamiento de observaciones del informe de culminación.

Fachada de la IEP N° 70480 "NIÑO JESÚS DE PRAGA"- AYAVIRI el pabellón con las 04 aulas propuestas



Equipamiento del área de cómputo y los módulos escolares



f) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

- El PIP contempla la construcción de:
 - a. Construcción de modulo recreativo en las instituciones educativas iniciales Nro 89, Nro 211, Nro 237, Nro 224 y Nro 201 de la Ciudad de Ayaviri.
 - b. Institución Educativa Inicial 219.
 - Construcción de área administrativa.
 - Construcción de un aula.
 - Construcción de cerco perimétrico.
 - Construcción de servicios higiénicos.
 - c. Institución Educativa Inicial 89.
 - Construcción de área administrativa.
 - Construcción de cocina comedor.
 - Construcción de servicios higiénicos.
 - d. Institución Educativa Inicial 211.
 - Construcción de un aula.
 - Construcción de cocina comedor.
 - e. Institución Educativa Inicial 237
 - Construcción de plataforma deportiva.
 - Construcción de un aula.
 - Construcción de cerco perimétrico.
 - Construcción de servicios higiénicos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

f. Institución Educativa Inicial 224.

- Construcción de área administrativa.
- Construcción de un aula.
- Construcción de cerco perimétrico.
- Construcción de servicios higiénicos.
- Construcción de muro de contención.
- Construcción de cocina comedor.

g. Institución Educativa Inicial 201

- Construcción de un aula.
- Construcción de cerco perimétrico.
- Construcción de servicios higiénicos.

h. Adquisición de módulos de estimulación, para las instituciones educativas iniciales Nro 89, Nro 219, Nro 211, Nro 237, Nro 224 y Nro 201 de la Ciudad de Ayaviri.

i. Adquisición de módulo de mobiliario escolar, para las instituciones educativas iniciales Nro 89, Nro 219, Nro 211, Nro 237, Nro 224 y Nro 201 de la Ciudad de Ayaviri.

j. Capacitación oportuna a docentes.

- Capacitación docente en desarrollo de contenidos curriculares de las áreas de comunicación integral y lógico matemático.
- Capacitación docente en desarrollo de estrategias metodológicas, de cómo enseñar con un uso adecuado, de métodos técnicas juegos y dinámicas vivenciales, en las áreas de lógico matemático y comunicación integral.
- Capacitación docente en desarrollo de la programación curricular de aula y de institución.

- Al momento de la visita de campo, se encontró que las infraestructuras de cada institución educativa estaba en uso pleno por parte de los alumnos y profesores de las Instituciones Educativas iniciales.
- Todas las instituciones educativas se encuentra totalmente concluida, se ha realizado la ejecución respetando todos los componentes respecto del PIP viable. Según manifestaron las directoras y los docentes de la 06 I.E. iniciales, haber recibido la Obra con equipamiento y la capacitación, de acuerdo al perfil.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 211



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 219





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 224



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 237





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 089



INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 201





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

g) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL "K" SECTORES HUACAUTA, PUYUPATA, NORTE PAYLLA Y CHIMPASTANA, MELGAR

- El PIP consiste en la construcción de:
 - Bocatoma Tipo Móvil, con concreto armado $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ y $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ y contiene las partidas de trabajos preliminares, movimiento de tierras, concretos, encofrado y desencofrado, acero de refuerzo y varios.
 - Canal Principal semicircular: en una longitud de 7,025.00 metros lineales con concreto $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ para una capacidad de conducción de $0.500 \text{ m}^3/\text{seg.}$ y 62 Obras de Arte en todo el canal, entre ellos: 01 toma tipo partidor, 07 tomas laterales simples, 21 tomas laterales dobles, 21 pases peatonales, 10 pases vehiculares y 2 acueductos $L = 2.00 \text{ m}$, y contiene las partidas de trabajos preliminares, movimiento de tierras, concretos, Obras de Arte, encofrado y desencofrado, acero de refuerzo, juntas y sellos, otros accesorios y varios.
 - Canal Lateral semicircular - Chimpastana: en una longitud de 4,350.00 metros lineales con concreto $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ para una capacidad de conducción de $0.300 \text{ m}^3/\text{seg.}$ y 48 Obras de Arte en todo el canal, entre ellos: 14 tomas laterales simples, 03 tomas laterales dobles, 15 pases peatonales, 05 pases vehiculares y 10 acueductos $L = 2.00 \text{ m}$, y contiene las partidas de trabajos preliminares, movimiento de tierras, concretos, Obras de Arte, encofrado y desencofrado, acero de refuerzo, juntas y sellos, otros accesorios y varios.
 - Plan de Manejo ambiental, se aplicará criterios de remediación ambiental, manejo ambiental y la aplicación de un plan de contingencia.
 - Capacitación a productores agropecuarios del ámbito del canal "K", serán dictados exclusivamente respecto a aspectos de Gestión de Aguas de Riego.
- Del recorrido hecho al canal K, se constató que las compuertas de la Bocatoma no están en funcionamiento, y el cual requiere mantenimiento. La bocatoma no se ha construido en el lugar donde indicaba el perfil, esto ha ocasionado que disminuya en 109 metros del canal principal.

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

- Se encuentra pendiente la culminación de los 109 metros del canal principal y la presentación del canal principal.

Bocatoma del canal "K"



Canal principal



Fin del canal principal




4. EJECUCIÓN FINANCIERA

El FONIPREL tiene como fuentes de financiamiento, las señaladas en el Artículo 6º de la Ley 29125, Ley que establece su implementación y funcionamiento, habiendo transferido a los GGLL y GGRR, a setiembre de 2014, por efectos de los sexto primeros concursos, la suma de S/. 310,270,170.29; habiéndose efectuado las transferencias conforme a una programación financiera presentada por el beneficiario a la firma del convenio, en el ámbito correspondiente a la Región Puno.

4.1 Ejecución financiera según fuente de financiamiento

Los PIP objeto de las visitas de campo, según convenio, alcanzan una inversión total de S/. 55, 975,402.00 nuevos soles, de los cuales estuvo programado ejecutar hasta la fecha la totalidad. Se ha logrado una ejecución financiera de S/. 58,370,565.76 nuevos soles (104.28% de los montos convenidos), el 66.63% de lo ejecutado provienen de la fuente FONIPREL y el 33.37% de la fuente de los beneficiarios. En el gráfico N° 03 se presenta la información señalada.

Gráfico N° 03

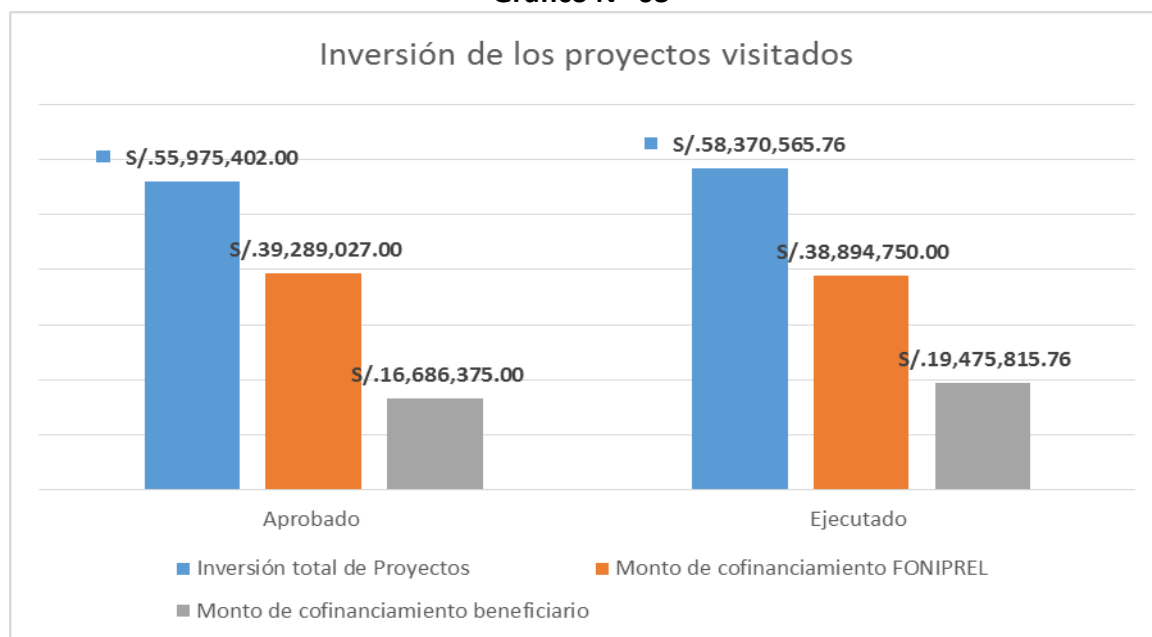

4.2 Avance financiero de cada proyecto visitado.

La ejecución financiera de cada uno de los proyectos visitados, presenta el estado situacional siguiente:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

Cuadro Nº 06

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	DEL CONVENIO		DE LA INVERSIÓN		AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)
			INVERSIÓN TOTAL	COFINANC.	PROGRAM. A SETIEMBRE 2014	EJECUTADA A SETIEMBRE 2014	
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 PUNO	1	3,043,794.00	2,108,557.00	3,043,794.00	2,992,038.00	98.30%
2	CONSTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN CABANILLA II ETAPA	3	18,635,102.00	13,044,572.00	18,635,102.00	18,422,239.00	98.86%
3	CONSTRUCCIÓN IRRIGACIÓN ORURILLO POSOCONI	2	22,251,799.00	15,576,259.00	22,251,799.00	24,671,441.00	110.87%
4	CONSTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN NEQUENEQUE MUÑANI	4	5,917,638.00	4,142,347.00	5,917,638.00	5,840,988.76	98.70%
5	MEJORAMIENTO EN LA IEP N° 70480 "NIÑO JESÚS DE PRAGA"- AYAVIRI	1	503,769.00	352,639.00	503,769.00	488,524.00	96.97%
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	4	1,283,430.00	1,026,744.00	1,283,430.00	4,335,386.00	126.22%
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL "K" SECTORES HUACAUTA, PUYUPATA, NORTE PAYLLA Y CHIMPASTANA, MELGAR	2	4,339,870.00	3,037,909.00	4,339,870.00	4,335,386.00	99.90%
TOTAL			55,975,402	39,289,027	55,975,402	61,086,002.76	109.13%
AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)			1				100.00%
			2				100.00%
			3				94.29%
			5				100.00%
			6				100.00%

A continuación mencionamos algunos comentarios del avance financiero observado en la visita a los siguientes proyectos:

- En General todos los proyectos visitados tienen un avance financiero ligeramente por encima de lo programado, que viene a ser 109.13%.
- Los proyectos visitados tienen un nivel de cumplimiento de su contrapartida que va del 96.97% al 126.22%.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

5. PRINCIPALES LOGROS

- 07 PIP visitados se encuentran en culminados y 01 PIP se encuentra de Ejecución.
- 04 canales de riego concluidos y en pleno uso
- 06 Instituciones educativas iniciales construidas y en plenos uso.
- 01 institución educativa primaria construida y en pleno uso.

6. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS

- Incumplimiento mayoritario de la normatividad del SNIP para la ejecución de proyectos, es así que de 07 proyectos visitados 02 no cuentan con informe de consistencia, pese a estar obligados por la vigencia de la Directiva a partir de febrero del 2009.
- Hay seis proyectos concluidos, de los cuales 5 ha presentado el informe de culminación pero mantienen observaciones.

7. CONCLUSIONES

- El FONIPREL se encuentra cofinanciando la ejecución / elaboración de 197 PIP/estudios, en la Región Puno seleccionados hasta la novena Convocatoria.
- El importe del cofinanciamiento otorgado por el FONIPREL en las nueve convocatorias asciende a S/. 290,734 millones, de los cuales se han transferido a los GGRR y GGLL, el 86%.
- De los 07 PIPs visitados, 05 proyectos, han concluido su ejecución física, 02 de ellos tienen pendiente terminar la ejecución y a su vez presentar el informe de culminación.

Lima, octubre de 2014

Paul Mercado Fonseca
FONIPREL
