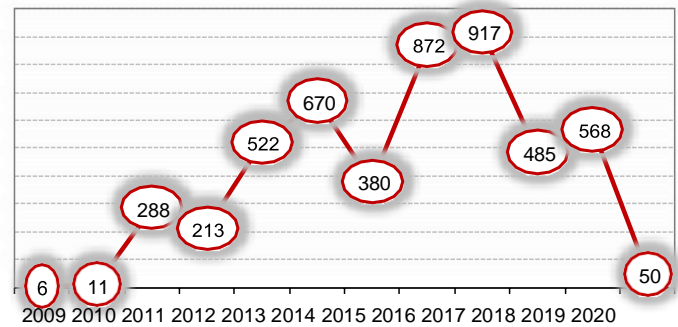


ADJUDICACIÓN

Adjudicación, 2009 – 2020*

AÑO	Nº DE PROYECTOS	MONTO DE INVERSIÓN (S/ MM)
2009	2	6
2010	6	11
2011	7	288
2012	19	213
2013	33	522
2014	73	670
2015	42	380
2016	52	872
2017	69	917
2018	53	485
2019	27	568
2020	7	50
	390	4 ,980

 Monto de inversión adjudicado, 2009 – 2020*
(S/ MM)


Meta de adjudicación 2020 según PROINVERSIÓN: S/602 MM
 Adjudicación al 13 de marzo de 2020: S/ 50 MM
Avance al 13 de marzo de 2020: 8%

*Información al 13/03/2020

NOTA: Se consideran los proyectos adjudicados, proyectos con convenios suscritos en ejecución, y proyectos con convenios concluidos.

PRÓXIMAS ADJUDICACIONES

Entidad pública	Fecha de adjudicación	Proyecto	Monto de inversión
MP Pasco	27/03/2020	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE PLAZA DE ARMAS EN LA CALLE MORALES JANAMPA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TINYAHUARCO (SMELTER) DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	S/ 2 MM
MP Pasco	27/03/2020	MEJORAMIENTO DE VIAS CON PISTAS, VEREDAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL JR. CESAR VALLEJO CUADRA 2 DEL SECTOR 2, DEL AA.HH ULIACHIN, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO-PASCO	S/ 0,6 MM
TOTAL			S/ 2,6 MM


NOTA: Fechas de otorgamiento de la Buena Pro según el cronograma de los procesos de selección según convocatorias publicadas en el portal de PROINVERSIÓN al 13/03/2020.

EJECUCIÓN (EMISIÓN DE CERTIFICADOS)

Durante los dos primeros meses del 2020 se ejecutaron S/ 85 MM en 20 proyectos, este monto representa el 17% de la meta establecida para el presente año (S/ 515 MM).

Ejecución (emisión de certificados), 2010 – 2020*

AÑO	Nº DE PROYECTOS	MONTO DE EJECUCIÓN (S/ MM)
2010	2	6
2011	4	10
2012	2	7
2013	12	151
2014	22	284
2015	43	353
2016	61	402
2017	64	396
2018	92	660
2019	101	703
2020	20	85
		3 ,057

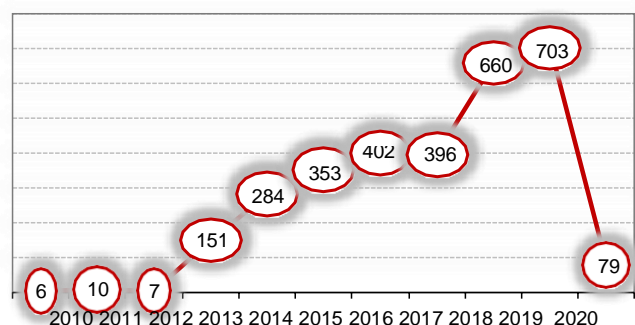 Monto de ejecución (emisión de certificados),
2010 – 2020*
(S/ MM)


Meta estimada de emisión de certificados 2020: S/515 MM
 Emisión al 29 de febrero de 2020: S/ 85 MM
Avance al 29 de febrero de 2020: 17%

*Información al 29/02/2020
