

# **FONIPREL**

**FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
REGIONAL Y LOCAL**

**Secretaria Técnica**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y/O ESTUDIOS**

**AMAZONAS  
VISITA DE CAMPO SETIEMBRE 2014**

(Primera y segunda Convocatoria)

**Lima, Octubre de 2014**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN "

## FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL FONIPREL

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS – VISTAS DE CAMPO - AMAZONAS  
(Primera y segunda Convocatoria)

### 1. ANTECEDENTES

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, a Setiembre del 2014, ha realizado 09 Concursos para el Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública y Estudios de Preinversión.

En el siguiente cuadro se detalla información referida a las propuestas seleccionadas en los cuatro concursos

Cuadro N° 01  
**PROPUESTAS SELECCIONADAS EN LOS CONCURSOS FONIPREL**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE TRANSFERENCIA
1ER. CONCURSO	372	376 779 924,00	375 822 955,00	D.S. N° 116-2008-EF
				D.S. N° 062-2009-EF
				D.S. N° 111-2010-EF
2DO. CONCURSO	265	294 685 998,00	293 843 755,00	D.S. N° 089-2009-EF
				D.S. N° 144-2010-EF
3ER. CONCURSO	181	268 895 903 ,00	254 390 739,00	D.S. N° 068-2010-EF
4TO. CONCURSO	206	273 106 889,00	145 304 526,00	D.S. N° 205-2010-EF
5TO. CONCURSO	266	462,049,961.96	455,018,676.00	D.S. N° 211-2011-EF
				D.S. N° 083-2012-EF
				D.S. N° 102-2013-EF
6TO. CONCURSO	96	141,568,993.96	141,522,217.00	D.S. N° 179-2012-EF
				D.S. N° 124-2013-EF
7MO. CONCURSO	161	193,688,812.67	190,980,151.00	D.S. N° 250-2013-EF
				D.S. N° 043-2014-EF
8VO. CONCURSO	386	603,793,235.16	581,537,849.00	D.S. N° 036-2014-EF
9NO. CONCURSO	454	827,064,730.54	237,690,761.00	D.S. N° 278-2014-EF
<b>TOTAL</b>	<b>2387</b>	<b>2,228,165,734.29</b>	<b>1,606,749,654.00</b>	



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”

Las propuestas seleccionadas en el departamento de Amazonas, en los nueve concursos, actualizado al tercer trimestre, se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2  
**PROPUESTAS SELECCIONADAS – AMAZONAS**

**PROPUESTAS SELECCIONADAS - AMAZONAS**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)
1ER. CONCURSO	17	15,658,901.77	15,658,901.77
2DO. CONCURSO	20	8,885,187.45	8,885,187.45
3ER. CONCURSO	0	0.00	0.00
4TO. CONCURSO	5	2,987,964.00	2,987,964.00
5TO. CONCURSO	5	6,452,173.00	4,931,958.00
6TO. CONCURSO	0	0.00	0.00
7MO. CONCURSO	8	1,316,667.80	1,316,667.80
8VO. CONCURSO	25	26,075,454.08	26,049,466.00
9NO. CONCURSO	30	50,111,117.16	26,742,614.00
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>111,487,465.26</b>	<b>86,572,759.02</b>

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

El seguimiento a los proyectos de inversión pública (PIP) y estudios de preinversión seleccionados en las convocatorias realizadas por el FONIPREL, se realiza con el objetivo de conocer su estado situacional, en relación al cumplimiento de las metas establecidas, plazos fijados y recursos asignados, a fin de tomar las acciones necesarias para superar las desviaciones que pudieran haberse producido.

La información que se presenta tiene como fuente: i) los informes trimestrales a setiembre 2014, presentados por las entidades visitadas del primer y segundo Concurso FONIPREL; y ii) las visitas in situ y reuniones personalizadas sostenidas con los beneficiarios en la semana del 22 al 27 de setiembre del presente.

En el departamento de Amazonas se aprobaron hasta el noveno concurso, la elaboración / ejecución de 110 propuestas, de las cuales se han visitado en ésta oportunidad 05 (4.5 %).



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”

Cuadro N° 3

**PROYECTOS VISITADOS – AMAZONAS**

CONVOCATORIA	CANTIDAD	MONTO TOTAL COFINANCIAMIENTO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO EJECUTADO
1er Concurso	4	5,790,917.11	5,790,917.11	5,468,847.00
2do Concurso	1	3,023,846.3	3,023,846.3	3,023,043.00
TOTAL	6	8,814,763.41	8,814,763.41	8,491,890.00

Los proyectos visitados (05), en lo referido al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de cofinanciamiento que a continuación se presentan el nivel que se indica en el Gráfico N° 1.

1. El expediente técnico, tiene Resolución de aprobación
2. El estudio definitivo tiene informe de consistencia
3. Los cronogramas de ejecución física y financiera están actualizados
4. El beneficiario ha presentado sus informes trimestrales
5. El proyecto tiene variación de metas adecuadas a las normas SNIP (Para proyectos SNIP) o cuenta con aprobación del Órgano Resolutivo (Para proyectos no SNIP)
6. El beneficiario está registrado como Unidad Ejecutora en el Banco de Proyectos.
7. Tiene Acreditada la supervisión del proyecto en ejecución.
8. El beneficiario aporta su contrapartida de manera adecuada.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas


Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”

### GRÁFICO Nº 1

#### NIVEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO EN PROYECTOS VISITADOS EN AMAZONAS

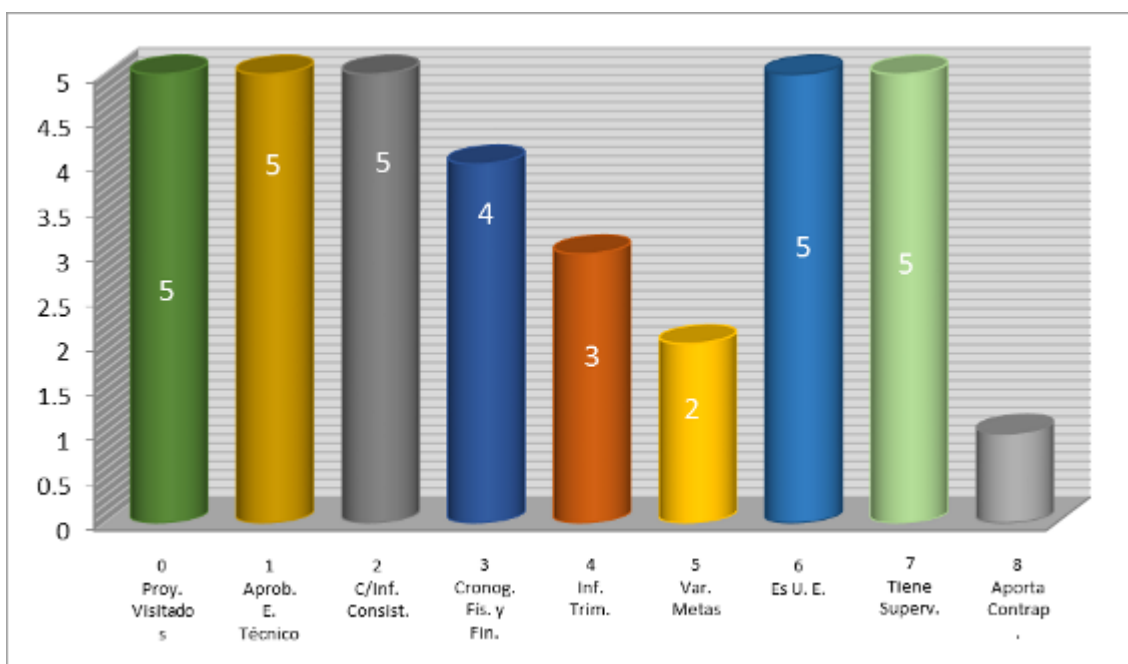



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública


“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”

### 3. EJECUCIÓN FÍSICA

#### 3.1 Avance físico, según tipo de propuesta

Los 5 PIP's visitados en la región Amazonas, presentan el avance físico global, siguiente:

Gráfico N° 02

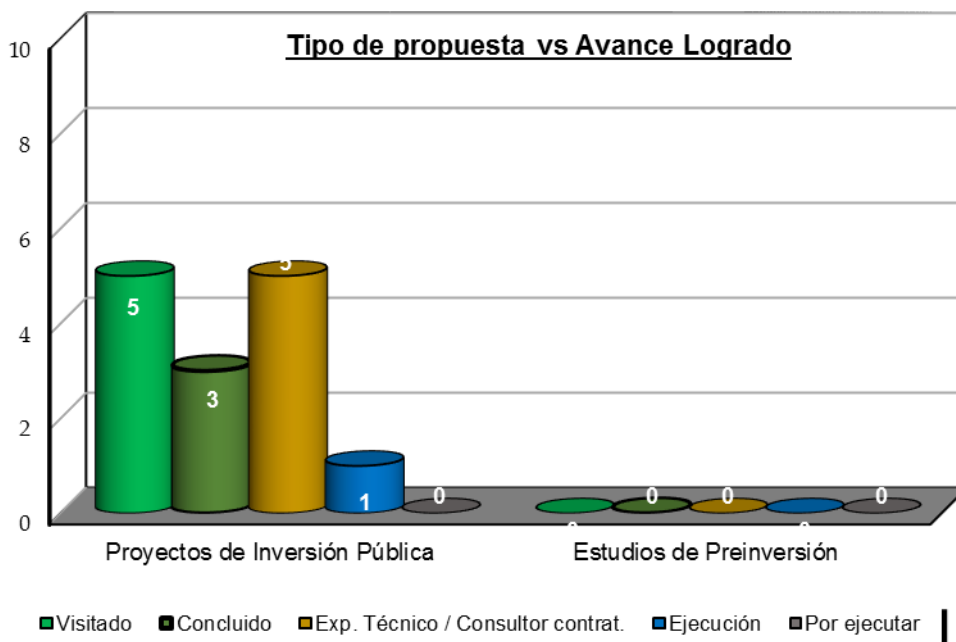

De los 05 PIP visitados 03 han concluido, 01 ha concluido pero le falta metas y 01 está en ejecución, ninguno está pendiente de inicio, de los cuales todos tienen pendiente los informes de culminación.

#### 3.2 Avance físico de cada proyecto visitado

La ejecución física de cada uno de los proyectos/estudios, visitados, presenta el estado situacional siguiente: Todos los PIP y estudios están en estado de ejecución y/o concluidos (05).



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”**

**Cuadro N° 04  
AVANCE FÍSICO DE CADA PROYECTOS VISITADO – AMAZONAS**

NOMBRE DEL ESTUDIO O PROYECTO	CONVOCATORIA	POR INICIAR	AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEGÚN ETAPA DE EJECUCION			AVANCE FISICO ACUMULADO
			EXPEDIENTE TECNICO	EJECUCION	TERMINADA	
Construcción de 05 aulas, SSHH, laboratorio, sala de innovación Pedagógica, dirección, auditorio, biblioteca y mobiliario de la I.E.S.M. José Olaya de Molinopampa-Chachapoyas-Amazonas	1				1	32%
Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de saneamiento básico de los sectores de Jazán, La Villa, Barrio Bellavista y Barrio El Porvenir, Distrito de Jazán, Bongará-Amazonas	1			1		59%
Recuperación de 6 aulas, dirección, ss.hh., cerco perimétrico, construcción de losa deportiva y equipamiento con mobiliario de la I.E. N° 16217, El Milagro	1				1	100%
Mejoramiento de trocha carrozable El Reposo - Jorobamba	1				1	100%
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - LEVANTO - SAN ISIDRO DEL MAYNO - MAGDALENA - EL TINGO	2				1	100%

A continuación mencionamos algunos comentarios de lo observado en la visita a los siguientes proyectos:



**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"**  
**"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN "**

- a) CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS, SSHH, LABORATORIO, SALA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA, DIRECCIÓN, AUDITORIO, BIBLIOTECA Y MOBILIARIO DE LA I.E.S.M. JOSÉ OLAYA DE MOLINOPAMPA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS.
- El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla la construcción de cinco aulas de material noble, construcción de un laboratorio, una sala de innovación pedagógica, una dirección, un auditorio, una biblioteca, servicios higiénicos, cerco perimétrico transparente, implementación con mobiliario escolar, entrega de dos libros a cada alumno, manual de uso para docentes y capacitación a los docentes.
  - En la visita de campo se ha estimado el incumplimiento de metas del proyecto, se pudo constatar con medidas de wincha el metrado de las metas ejecutadas y compararlas con el perfil, cabe indicar que las metas físicas del perfil son genéricas en la memoria y planos adjuntados, no se detalla el área de cada construcción solo indica en conjunto las áreas, esto no permite realizar en campo una verificación exacta de lo construido, ante ello se usará el área general para las construcciones según el perfil.
  - Resultando que el área total construida es de 645 m2 perteneciente a la construcción de cinco aulas de material noble, construcción de un laboratorio, una sala de innovación pedagógica, una dirección, un auditorio y una biblioteca en el perfil es de 1,968.67 m2 por lo tanto existe un metrado no ejecutado.
  - El área de los servicios higiénicos medido es 33 m2 y en el perfil se indica 160 m2 por lo tanto existe un metrado no ejecutado.
  - No enseñaron y no se verificó el cerco perimétrico transparente.
  - Según manifestación de profesor del colegio y alcalde se realizó la capacitación de los docentes y se distribuyó el material bibliográfico respectivo que se algunos se encuentran en la biblioteca, así como el mobiliario escolar (50 mesas bipersonales con sus respectivas 100 sillas) indicaron que los módulos fueron entregados de manera completa pero con mas de 05 años muchos se han deteriorado y sacados de las aulas.
  - Así mismo la municipalidad y los docentes del colegio manifestaron que con el proyecto ejecutaron una losa deportiva de 20x30 (600 m2) el cual no estaba considerado en el perfil aprobado, al revisar los informes trimestrales y formatos SNIP no se consigna dicha información, así mismo se solicitó el expediente técnico respectivo y la presentación de los comprobantes de pagos ú otros medios de pagos donde se consignen dichos gastos el cual no se entregó al momento de realizado el seguimiento.
  - Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la Institución Educativa.





**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”**

- La obra aún no ha sido transferida a la entidad correspondiente para su operación y mantenimiento, así mismo solo han presentado parcialmente los informes trimestrales y aún no se ha presentado el informe de culminación.
  - Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas.
- b) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS SECTORES DE JAZÁN, LA VILLA, BARRIO BELLAVISTA Y BARRIO EL PORVENIR, DISTRITO DE JAZÁN, BONGARÁ- AMAZONAS.
- El PIP contempla la ejecución de un sistema de agua potable a través de una captación, línea de aducción en 2,082.75 ml con tubería PVC clase 7.5 SAP de 4”, línea de distribución de 6,200.50 ml con tubería PVC clase 10 y 7.5 SAP de 3”, 2”, 1 1/2”, 1” y 3/4”, construcción de un reservorio apoyado de 142 m<sup>3</sup>, construcción de un pre filtro, filtro lento, sedimentador y 500 conexiones pre domiciliarias con sus respectivos medidores domiciliarios.
  - Construcción de las redes colectores en 5,821.60 ml con tubería UPVC 160 mm, 118 buzones de concreto y la instalación de 500 conexiones pre domiciliarias.
  - Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales única de cámara de rejillas, tanques sépticos y pozos de percolación.
  - Campañas de educación a la población y capacitación al personal técnico.
  - En la visita de Campo se verificaron las obras ejecutadas de manera indirecta porque el sistema está enterrado y visualmente no se puede verificar, pero se constató que el sistema de agua potable no está en funcionamiento y no está concluido según el operador del sistema de agua y alcantarillado de la municipalidad, verificó por sectores, el Sector Señor de los Milagros está instalado el desagüe y parcialmente el agua, funcionando solo el desagüe cabe indicar que éste sector no estaba considerado en el perfil, el sector Jazan se ha instalado el agua y desagüe hasta un lugar denominado La Curva después solo el desagüe funcionando únicamente éste, el Sector La Villa se ha instalado agua y desagüe, funcionando ambos, aquí se ha considerado ora captación y un reservorio para el agua que no se ha ejecutado pero tampoco estaba considerado en el perfil, el Sector El Porvenir se ha instalado solo el desagüe parcialmente y en el Sector Bellavista se han instalado el agua y desagüe funcionando ambos.
  - No está construido la captación para el agua y la línea de aducción correspondiente, así mismo el Reservorio de 142 m<sup>3</sup>, tampoco el pre filtro, filtro lento y sedimentador y de las 500 conexiones domiciliarias de agua y



**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”**

desague solo están instaladas según el operador del sistema 50 conexiones de desague, se ha verificado algunos la construcción de algunos buzones de concreto. Se verificó que solamente funciona el desague porque la red colecta el desague y lo arroja directamente al río Utcubamba y quebradas adyacentes sin ningún tipo de tratamiento y solo funciona la parte adyacente al río y la parte ubicada al otro lado de la carretera no funciona porque el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no ha autorizado la construcción de 04 pases que cruzan la carretera.

- La entidad mostró en el almacén materiales de construcción como tuberías de diferentes diámetros, fierros de construcción, herramientas y otros que según manifestación de la entidad serán usados en la obra al momento de reiniciarse los trabajos.
  - Así mismo con el proyecto se ha comprado una retroexcavadora marca Holland, un volquete marca Hino y una camioneta 4x4, los cuales no han sido considerados en el perfil.
  - La entidad nos mostró una Pre Liquidación Técnica Financiera presentada el 26 de setiembre del 2012 el avance físico del agua potable es del 16.61 %, del alcantarillado del 93 % haciendo un total de 59 %, así mismo el gasto efectuado es de S/. 2'452,784.61 del cual S/. 2'359,035.93 corresponde al FONIPREL y S/. 93,748.60 a la municipalidad.
  - El proyecto aún no ha sido transferido a la entidad correspondiente para su operación y mantenimiento por no estar concluido y según la documentación remitida ha presentado solo algunos informes trimestrales faltando el informe de culminación.
  - Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, sobre todo para que se complete las actividades faltantes y el cumplimiento de la remisión de los informes.
- c) RECUPERACIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SS.HH., CERCO PERIMÉTRICO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DE LA I.E. N° 16217, EL MILAGRO.
- El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla la construcción de seis aulas, dirección, servicios higiénicos de material noble con techo de losa aligerada de concreto armado y cerco perimétrico de muro de ladrillo, adquisición de mobiliario escolar, y capacitación a docentes.
  - En la visita de campo se ha estimado el incumplimiento de metas del proyecto, se pudo constatar con medidas de wincha el metrado de las metas ejecutadas y compararlas con el perfil.
  - Se verificó la existencia de 06 aulas con un área construida de 349 m2 y el del perfil consignaba 288 m2 con material noble.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”**

- Se verificó la construcción de una dirección de 13.50 m<sup>2</sup> de área construida con material noble.
- Se verificó la construcción de un servicio higiénico de 26.50 m<sup>2</sup> de área construida con material noble.
- Se verificó la construcción de una Losa Deportiva de 20 x 30 m con un área construida de 600 m<sup>2</sup> de concreto que coincide con el área considerada en el perfil de 600 m<sup>2</sup>.
- Se observó la construcción de un cerco perimétrico pero no se pudo medir por limitancia de acceso pero según el director encargado del colegio manifestó que se cumplió con la meta consignada en el perfil de 349.55 ml.
- Se constató que en cada salón un mobiliario conformado por 60 mesas bipersonales con 02 sillas cada uno, se indica que muchos ya se han deteriorado y están inutilizados por el transcurso de los años.
- Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la Institución Educativa.
- El proyecto ha sido transferido a la entidad correspondiente para su operación y mantenimiento, según la documentación remitida ha presentado los informes trimestrales y el informe de culminación, los cuales tienen observaciones que tienen que ser levantadas para su aprobación.
- Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas.

**d) MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EL REPOSO - JOROBAMBA.**

- El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla el mejoramiento de 19 kms de carretera de 4.00 m de ancho, con la aplicación de una capa de material afirmado de e=0.20 m y otra capa de material granulado de e=0.20 m hasta el km 08+500, luego hasta el km 19+000 solo se aplicará una sub capa de 0.20 m de material afirmado sin bermas, así mismo la construcción de 03 badenes, 02 losas armadas para puentes y alcantarilla, 19.00 km de cunetas y plazoletas cada 500 m, señalizaciones y capacitación.
- En la visita de campo se ha estimado visualmente el cumplimiento de metas del proyecto, se usó como instrumento de medida de longitud el odómetro de la movilidad usada para el traslado, actualmente la trocha está en uso.
- Cabe indicar que desde el km 0+000 al 03+500 aproximadamente se ejecutó el año 2013 para la terminación de la meta consignada en el perfil.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN "**

- Se verificó la ejecución del mejoramiento de los 19 km de trocha medida con odómetro, no se pudo constatar las capas ó sub capas de material afirmado y/ó granular, según manifestación de la entidad las lluvias anuales desde el año 2009 han deteriorado la trocha desapareciendo dichas capas ante ello la municipalidad ha realizado los mantenimientos periódicos para la operatividad de la misma, así mismo se observa deterioro exagerado de las cunetas no pudiéndose identificar y medir con exactitud las construidas en su oportunidad, caso parecido son las plazoletas cada 500 m que no se pueden identificar con exactitud y espaciamiento que según la entidad las lluvias y el mantenimiento periódico las minimizado ó han borrado en muchos casos.
  - Se observó la construcción de 03 badenes, 02 alcantarillas y 02 puentes, así mismo se observa la existencia parcial de los 19 kms de cunetas, según manifestación de la entidad éstas se han deteriorado por las lluvias en todos estos años pero se solicitó su mantenimiento permanente para evitar éstos deterioros.
  - Se ha observado que la obra ejecutada tiene mantenimiento limitado ocasionando un deterioro del afirmado, las cunetas están parcialmente colmatadas, el cual pone en riesgo futuro la operatividad de la trocha carrozable.
  - El proyecto aún no ha sido transferido a la entidad correspondiente para su operación y mantenimiento y según la documentación remitida ha presentado solo los informes trimestrales faltando el informe de culminación.
  - Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, remitirá de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, tanto en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio, como en la remisión del levantamiento de las observaciones a los informes trimestrales.
- e) MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - LEVANTO - SAN ISIDRO DEL MAYNO - MAGDALENA - EL TINGO.
- El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla el mejoramiento a nivel de afirmado de 44 km de carretera con un espesor de 0.15 m, ancho de calzada 4.00 m, bermas de 0.50 m, además comprende construcción de 55 km de cunetas triangulares de 0.75 x 0.50 m si revestir, construcción de 20 alcantarillas, obras de señalización e informativas, construcción de plataformas en contra pendiente para estabilizar terrenos en zonas de falla.
  - En la visita de campo se ha estimado visualmente el cumplimiento de metas del proyecto, se usó como instrumento de medida de longitud el odómetro de la movilidad usada para el traslado, actualmente la trocha está en uso.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN "**

- Se verificó la ejecución del mejoramiento de los 44 km de trocha medida con odómetro, no se observa las capas ó sub capas de material afirmado y/ó granular solo restos del mismo, el ancho de la calzada es variable pero en promedio es 4.00 m según manifestación de la entidad desde el año 2009 las lluvias anuales han deteriorado la trocha desapareciendo dichas capas ante ello la municipalidad ha realizado los mantenimientos periódicos para la operatividad de la misma, así mismo se observa deterioro exagerado de las cunetas no pudiéndose identificar y medir con exactitud las construidas en su oportunidad.
- Se han identificado 38 alcantarillas cantidad mayor al número considerado en el perfil, así mismo se ha verificado las señales informativas de kilometraje en la carretera y señalización respectiva y la construcción de 03 muros de contención no se especifica la cantidad en la ficha SNIP respectiva.
- Así mismo la entidad informó la construcción de 02 puentes de concreto que no estaba considerado en la ficha SNIP.
- Se ha observado que la obra ejecutada tiene mantenimiento limitado ocasionando un deterioro del afirmado, las cunetas están parcialmente colmatadas, el cual pone en riesgo futuro la operatividad de la trocha carrozable.
- El proyecto ha sido transferido a la entidad correspondiente para su operación y mantenimiento y según la documentación remitida ha presentado el informe de culminación el cual presenta observaciones de tipo técnicas y financieras para su aprobación.
- Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, remitirá de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, tanto en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio, como en la remisión del levantamiento de las observaciones a los informes trimestrales y de culminación presentados.




#### 4. EJECUCIÓN FINANCIERA

El FONIPREL tiene como fuentes de financiamiento, las señaladas en el Artículo 6º de la Ley 29125, Ley que establece su implementación y funcionamiento, habiendo transferido a los GGLL y GGRR, a setiembre de 2014, por efectos de los nueve concursos, la suma de S/. 1,606 749 654,00; habiéndose efectuado las transferencias conforme a una programación financiera presentada por el beneficiario a la firma del convenio.

##### 4.1 Ejecución financiera según fuente de financiamiento

Los PIP objeto de las visitas de campo, alcanzan una inversión total de S/. 9 861 224,12, de los cuales S/. 8 814 763,41 es de la fuente FONIPREL y S/. 1 046 460,71 de la entidad de los cuales estuvo programado ejecutar hasta la fecha la totalidad, sin embargo se ha ejecutado únicamente S/. 9 255 905,00 (93.87%), lo que constituye una limitada ejecución financiera. Del monto ejecutado, el 91,75% provienen de la fuente FONIPREL que viene hacer S/. 8 491 890,00 y el 8.25% de la fuente de los beneficiarios que viene hacer S/. 764 015,00. En el gráfico N° 03 se presenta la información señalada.

Gráfico N° 03

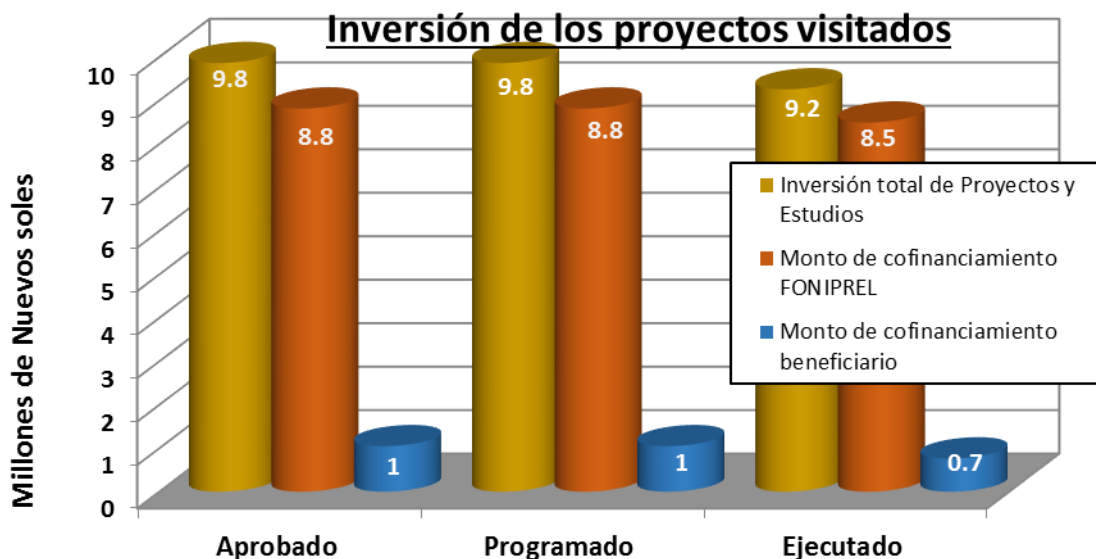



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”**

**4.2 Avance financiero de cada proyecto visitado.**

La ejecución financiera de cada uno de los proyectos visitados, presenta el estado situacional siguiente:

**Cuadro Nº 06**

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	DEL CONVENIO			DE LA INVERSIÓN TOTAL		AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)	
			INVERSIÓN TOTAL	COFINANC.	ENTIDAD	PROGRAM. A SETIEMBRE 2014	EJECUTADA A SETIEMBRE 2014		
1	Construcción de 05 aulas, SSHH, laboratorio, sala de innovación Pedagógica, dirección, auditorio, biblioteca y mobiliario de la I.E.S.M. José Olaya de Molinopampa-Chachapoyas-Amazonas	1	S/. 1,206,737.00	S/. 1,025,725.00	S/. 181,012.00	S/. 1,206,737.00	S/. 1,096,735.00	90.88%	
2	Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de saneamiento básico de los sectores de Jazán, La Villa, Barrio Bellavista y Barrio El Porvenir, Distrito de Jazán, Bongará-Amazonas	1	S/. 2,976,337.90	S/. 2,678,704.11	S/. 297,633.79	S/. 2,976,337.90	S/. 2,452,278.00	82.39%	
3	Recuperación de 6 aulas, dirección, ss.hh., cerco perimétrico, construcción de losa deportiva y equipamiento con mobiliario de la I.E. N° 16217, El Milagro	1	S/. 832,905.00	S/. 749,614.50	S/. 83,290.50	S/. 832,905.00	S/. 829,711.00	99.62%	
4	Mejoramiento de trocha carrozable El Reposo - Jorobamba	1	S/. 1,485,415.00	S/. 1,336,873.50	S/. 148,541.50	S/. 1,485,415.00	S/. 1,595,970.00	107.44%	
5	Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Levanto - San Isidro del Mayno - Magdalena - El tingo	2	S/. 3,359,829.22	S/. 3,023,846.30	S/. 335,982.92	S/. 3,359,829.22	S/. 3,281,211.00	97.66%	
TOTAL			S/. 9,861,224.12	S/. 8,814,763.41	S/. 1,046,460.71	S/. 9,861,224.12	S/. 9,255,905.00	93.86%	
AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL TOTAL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)								1	91.90%
								2	97.66%

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	DEL CONVENIO			DE LA INVERSIÓN FONIPREL		AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)	
			INVERSIÓN TOTAL	COFINANC.	ENTIDAD	PROGRAM. A SETIEMBRE 2014	EJECUTADA A SETIEMBRE 2014		
1	Construcción de 05 aulas, SSHH, laboratorio, sala de innovación Pedagógica, dirección, auditorio, biblioteca y mobiliario de la I.E.S.M. José Olaya de Molinopampa-Chachapoyas-Amazonas	1	S/. 1,206,737.00	S/. 1,025,725.00	S/. 181,012.00	S/. 1,025,725.00	S/. 1,024,322.00	99.86%	
2	Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de saneamiento básico de los sectores de Jazán, La Villa, Barrio Bellavista y Barrio El Porvenir, Distrito de Jazán, Bongará-Amazonas	1	S/. 2,976,337.90	S/. 2,678,704.11	S/. 297,633.79	S/. 2,678,704.11	S/. 2,358,036.00	88.03%	
3	Recuperación de 6 aulas, dirección, ss.hh., cerco perimétrico, construcción de losa deportiva y equipamiento con mobiliario de la I.E. N° 16217, El Milagro	1	S/. 832,905.00	S/. 749,614.50	S/. 83,290.50	S/. 749,614.50	S/. 749,615.00	100.00%	
4	Mejoramiento de trocha carrozable El Reposo - Jorobamba	1	S/. 1,485,415.00	S/. 1,336,873.50	S/. 148,541.50	S/. 1,336,873.50	S/. 1,336,874.00	100.00%	
5	Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Levanto - San Isidro del Mayno - Magdalena - El tingo	2	S/. 3,359,829.22	S/. 3,023,846.30	S/. 335,982.92	S/. 3,023,846.30	S/. 3,023,043.00	99.97%	
TOTAL			S/. 9,861,224.12	S/. 8,814,763.41	S/. 1,046,460.71	S/. 8,814,763.41	S/. 8,491,890.00	96.34%	
AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL FONIPREL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)								1	94.44%
								2	99.97%





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”**

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	DEL CONVENIO			DE LA INVERSIÓN ENTIDAD		AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)
			INVERSIÓN TOTAL	COFINANC.	ENTIDAD	PROGRAM. A SETIEMBRE 2014	EJECUTADA A SETIEMBRE 2014	
1	Construcción de 05 aulas, SSHH, laboratorio, sala de innovación Pedagógica, dirección, auditorio, biblioteca y mobiliario de la I.E.S.M. José Olaya de Molinopampa-Chachapoyas-Amazonas	1	S/. 1,206,737.00	S/. 1,025,725.00	S/. 181,012.00	S/. 181,012.00	S/. 72,413.00	40.00%
2	Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de saneamiento básico de los sectores de Jazán, La Villa, Barrio Bellavista y Barrio El Porvenir, Distrito de Jazán, Bongará-Amazonas	1	S/. 2,976,337.90	S/. 2,678,704.11	S/. 297,633.79	S/. 297,633.79	S/. 94,242.00	31.66%
3	Recuperación de 6 aulas, dirección, ss.hh., cerco perimétrico, construcción de losa deportiva y equipamiento con mobiliario de la I.E. N° 16217, El Milagro	1	S/. 832,905.00	S/. 749,614.50	S/. 83,290.50	S/. 83,290.50	S/. 80,096.00	96.16%
4	Mejoramiento de trocha carrozable El Reposo - Jorobamba	1	S/. 1,485,415.00	S/. 1,336,873.50	S/. 148,541.50	S/. 148,541.50	S/. 259,096.00	174.43%
5	Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Levanto - San Isidro del Mayno - Magdalena - El tingo	2	S/. 3,359,829.22	S/. 3,023,846.30	S/. 335,982.92	S/. 335,982.92	S/. 258,168.00	76.84%
TOTAL			S/. 9,861,224.12	S/. 8,814,763.41	S/. 1,046,460.71	S/. 1,046,460.71	S/. 764,015.00	73.01%
AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL ENTIDAD, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)							1	71.20%
							2	76.84%

A continuación mencionamos algunos comentarios del avance financiero observado en la visita a los siguientes proyectos y estudios:

- En General todos los proyectos visitados tienen en promedio un avance financiero total del 93.86 % que es por debajo de lo programado.
- Las entidades tienen un nivel de cumplimiento de su contrapartida en promedio del 73.01 % que en muchas entidades aún no han cumplido sosteniendo ser muy alto el aporte.
- La inversión del FONIPREL en los proyectos tienen un nivel de ejecución del 96.34 %.
- En 03 proyectos se han ejecutado las metas contempladas en los perfiles aprobados y financiados por el FONIPREL en dos (02) se ha incumplido la ejecución de metas, éstas son las municipalidades distritales de Molinopampa y Jazan cuyos avances físicos son del 32 % y 59 % respectivamente inclusive en éste último se encuentra en la contraloría porque se uso el dinero para la compra de maquinaria pesada y vehículo no contemplados en el perfil aprobado.





## 5. PRINCIPALES LOGROS

- 03 PIP visitados se encuentran culminados físicamente pero falta los informes de culminación respectivos.
- 63 Kms de camino vecinal mejorados.
- 03 badenes construidos
- 40 alcantarillas construidas
- 04 puentes construidos
- 06 aulas construidas
- 01 losa deportiva construida
- 01 dirección construida
- 01 servicio higiénico construida
- 01 cerco perimétrico construido

## 6. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS

- La obras corresponden a la primera y segunda convocatoria (años 2008 y 2009) los cuales no se pueden distinguir con precisión y detalle las capas y subcapas, cunetas y obras de arte en el mejoramiento de las trochas carrozables debido a las lluvias, años de uso e incluso ya han tenido mantenimientos periódicos que limitan una evaluación precisa de las metas cumplidas.
- En los centros educativos construidos, el equipamiento realizado en cada aula con sillas, mesas y otros ya están deteriorados e inservibles por los años de uso por lo tanto tampoco se puede realizar una evaluación precisa de éstos.
- Los perfiles aprobados contienen metas muy genéricas en unidades y cantidades que no permite en campo una evaluación precisa del cumplimiento de las mismas.
- Los proyectos evaluados pertenecen a gestiones anteriores a la actual el cual no les permite tener disponible la documentación para los informes trimestrales y de culminación por ello la demora en el cierre de los mismos pese a culminarse físicamente.
- Hay un nivel de aporte de las contrapartida muy por debajo del aporte proporcional de los recursos de FONIPREL, en 04 casos de los 05 visitados el aporte del Gobierno local es por debajo de lo consignado en el convenio.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”**

## **7. CONCLUSIONES**

- De los 05 PIP visitados, tres proyectos, han concluido su ejecución física, sin embargo hasta la fecha no han cumplido con levantar las observaciones al informe de culminación presentado.
- Dos PIP aún no han concluido físicamente siendo sus avances físicos del 32 y 59 %.
- En los 05 PIP se han ejecutado el 93.86 % del presupuesto total aprobado, de los cuales, desagregando por fuente de financiamiento, el 96.34 % del presupuesto comprometido por FONIPREL está ejecutado y sólo el 73.01 % de la contrapartida comprometida de la entidad ha sido ejecutada hasta la fecha.

## **8. PANEL FOTOGRÁFICO**

Ver Anexo 1

Lima, Octubre de 2014

---

Renato Claudio Moya Carnero  
Analista FONIPREL

rm/jq//EDC



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”

## ANEXO Nº 01

### PANEL FOTOGRÁFICO DE OBRAS

<b>1. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAZAN			
<b>REGIÓN:</b> AMAZONAS	<b>PROVINCIA:</b> BONGARA	<b>DISTRITO:</b> JAZAN	<b>LOCALIDAD:</b> VISCHONGO
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS SECTORES DE JAZÁN, LA VILLA, BARRIO BELLAVISTA Y BARRIO EL PORVENIR, DISTRITO DE JAZÁN, BONGARÁ-AMAZONAS.			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 2 976 337,90	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 2 678 704,11
<b>CODIGO SNIP:</b>	75139		



Vista de la construcción de buzones de desague



Vista de desague sin concluir el cual las aguas servidas se arrojan al río



Vista de materiales adquiridos y almacenados en un local de la municipalidad para usarse una vez reiniciadas las obras



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”

<b>2. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOPAMPA			
<b>REGIÓN:</b> AMAZONAS	<b>PROVINCIA:</b> CHACHAPOYAS	<b>DISTRITO:</b> MOLINOPAMPA	<b>LOCALIDAD:</b> MOLINOPAMPA
<b>OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS, SSHH, LABORATORIO, SALA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA, DIRECCIÓN, AUDITORIO, BIBLIOTECA Y MOBILIARIO DE LA I.E.S.M. JOSÉ OLAYA DE MOLINOPAMPA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 1 206 737,00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 1 025 725,00
<b>CODIGO SNIP:</b>	53577		



Vista General del centro educativo



Medición de las aulas los cuales son menor al área del perfil

<b>3. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL MILAGRO			
<b>REGIÓN:</b> AMAZONAS	<b>PROVINCIA:</b> UTCUBAMBA	<b>DISTRITO:</b> EL MILAGRO	<b>LOCALIDAD:</b> EL MILAGRO
<b>OBRA:</b> RECUPERACIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SS.HH., CERCO PERIMÉTRICO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DE LA I.E. N° 16217, EL MILAGRO.			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 832 905,00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 749 614,50
<b>CODIGO SNIP:</b>	51826		



Vista de las aulas del centro educativo cuyas áreas son acordes al perfil aprobado



Vista General del centro educativo y de la loza deportiva construida





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”**

<b>4. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL MILAGRO</b>			
<b>REGIÓN:</b> AMAZONAS	<b>PROVINCIA:</b> UTCUBAMBA	<b>DISTRITO:</b> EL MILAGRO	<b>LOCALIDAD:</b> EL REPOSO - JOROBAMBA
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EL REPOSO - JOROBAMBA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 1 485 415,00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 1 336 873,50
<b>CODIGO SNIP:</b>	53170		



Alcantarilla construida en la trocha carrozable mejorada



Badén construido



Carretera operativa se observa la cuneta



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ”

<b>5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS</b>			
<b>REGIÓN:</b> AMAZONAS	<b>PROVINCIA:</b> CHACHAPOYAS	<b>DISTRITO:</b>	<b>LOCALIDAD:</b> CHACHAPOYAS – LEVANTO – SAN ISIDRO DEL MAYNO – MAGDALENA Y EL TINGO
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - LEVANTO - SAN ISIDRO DEL MAYNO - MAGDALENA - EL TINGO.			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 3 359 829.22	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 3 023 846.30
<b>CODIGO SNIP:</b>	81923		



Protección construida en la carretera la cual está operativa



Letreros informativos
