

FONIPREL

**FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA
REGIONAL Y LOCAL**

Secretaria Técnica

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y/O ESTUDIOS

**CAJAMARCA
VISITA DE CAMPO SETIEMBRE 2014**

(4^{ta} y 5^{ta} Convocatoria)

Lima, Octubre 2014



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de EconomíaDirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL FONIPREL

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y/O ESTUDIOS – VISTAS DE CAMPO -
CAJAMARCA

(Cuarta y Quinta Convocatoria)

1. ANTECEDENTES

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, a setiembre del 2014, ha realizado 09 Concursos para el Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública y Estudios de Preinversión.

En el siguiente cuadro se detalla información referida a las propuestas seleccionadas en los nueve concursos.

Cuadro N° 01

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE TRANSFERENCIA
1ER. CONCURSO	372	376 779 924,00	375 822 955,00	D.S. N° 116-2008-EF
				D.S. N° 062-2009-EF
				D.S. N° 111-2010-EF
2DO. CONCURSO	265	294 685 998,00	293 843 755,00	D.S. N° 089-2009-EF
				D.S. N° 144-2010-EF
3ER. CONCURSO	181	268 895 903 ,00	254 390 739,00	D.S. N° 068-2010-EF
4TO. CONCURSO	206	273 106 889,00	145 304 526,00	D.S. N° 205-2010-EF
5TO. CONCURSO	266	462,049,961.96	455,018,676.00	D.S. N° 211-2011-EF
				D.S. N° 083-2012-EF
				D.S. N° 102-2013-EF
6TO. CONCURSO	96	141,568,993.96	141,522,217.00	D.S. N° 179-2012-EF
				D.S. N° 124-2013-EF
7MO. CONCURSO	161	193,688,812.67	190,980,151.00	D.S. N° 250-2013-EF
				D.S. N° 043-2014-EF
8VO. CONCURSO	386	603,793,235.16	581,537,849.00	D.S. N° 036-2014-EF
9NO. CONCURSO	454	827,064,730.54	237,690,761.00	D.S. N° 278-2014-EF
TOTAL	2387	2,228,165,734.29	1,606,749,654.00	

Las propuestas seleccionadas en el departamento de Cajamarca, en los nueve concursos, representan 179 propuestas entre proyectos y estudios; de los cuales se ha aprobado un cofinanciamiento por parte de FONIPREL S/. 213, 214,260.77 nuevos soles. Actualizado al tercer trimestre del presente, se ha realizado una transferencia de S/. 160, 352,001.51 nuevos soles, se muestra a detalle por convocatoria en el siguiente cuadro:



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de EconomíaDirección
General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”**

**Cuadro N° 2
PROPUESTAS SELECCIONADAS – CAJAMARCA**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)
1ER. CONCURSO	35	37,993,072.28	37,993,072.28
2DO. CONCURSO	25	14,745,626.77	14,682,799.00
3ER. CONCURSO	19	21,588,910.00	21,588,910.00
4TO. CONCURSO	12	13,436,417.00	13,436,417.00
5TO. CONCURSO	13	22,925,384.66	22,925,384.66
6TO. CONCURSO	5	5,114,836.05	5,114,836.05
7MO. CONCURSO	10	6,395,024.52	6,395,024.52
8VO. CONCURSO	27	20,096,154.02	19,083,440.00
9NO. CONCURSO	33	70,918,835.47	19,132,118.00
TOTAL	179	213,214,260.77	160,352,001.51

2. INFORMACIÓN GENERAL

El seguimiento a los proyectos de inversión pública (PIP) y estudios de preinversión seleccionados en las convocatorias realizadas por el FONIPREL, se realiza con el objetivo de conocer su estado situacional, en relación al cumplimiento de las metas establecidas, plazos fijados y recursos asignados, a fin de tomar las acciones necesarias para superar las desviaciones que pudieran haberse producido.

La información que se presenta tiene como fuente: i) los informes trimestrales a setiembre 2014, presentados por las entidades visitadas de la cuarta y quinta convocatoria FONIPREL; y ii) las visitas in situ en la semana del 22 al 26 de setiembre del presente.

En el departamento de Cajamarca se aprobaron para el Quinto y Sexto concurso, la elaboración / ejecución de 18 propuestas, de las cuales se han visitado 05 (28%) y corresponden al rubro de proyectos.

**Cuadro N° 3
PROYECTOS VISITADOS – CAJAMARCA**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	MONTO EJECUTADO (S/.)
5 ^{TO} . CONCURSO	4	13,192,590.06	13,192,590.06	10,607,868.00
6 ^{TO} . CONCURSO	1	1,379,004.00	1,379,004.00	1,310,055.00
TOTAL	5	14'571,594.06	12,380,323.34	11,917,923.00

Los proyectos visitados (05), en lo referido al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de cofinanciamiento que a continuación se presentan el nivel que se indica en el Gráfico N° 1.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía


Dirección
General de Inversión Pública

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"**

1. El expediente técnico, tiene Resolución de aprobación
2. El estudio definitivo tiene informe de consistencia
3. Los cronogramas de ejecución física y financiera están actualizados
4. El beneficiario ha presentado sus informes trimestrales
5. El proyecto tiene variación de metas adecuadas a las normas SNIP (Para proyectos SNIP) o cuenta con aprobación del Órgano Resolutivo (Para proyectos no SNIP)
6. El beneficiario está registrado como Unidad Ejecutora en el Banco de Proyectos.
7. Tiene Acreditada la supervisión del proyecto en ejecución.
8. El beneficiario aporta su contrapartida de manera adecuada.

GRÁFICO Nº 1

**NIVEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO
EN PROYECTOS VISITADOS – CAJAMARCA**

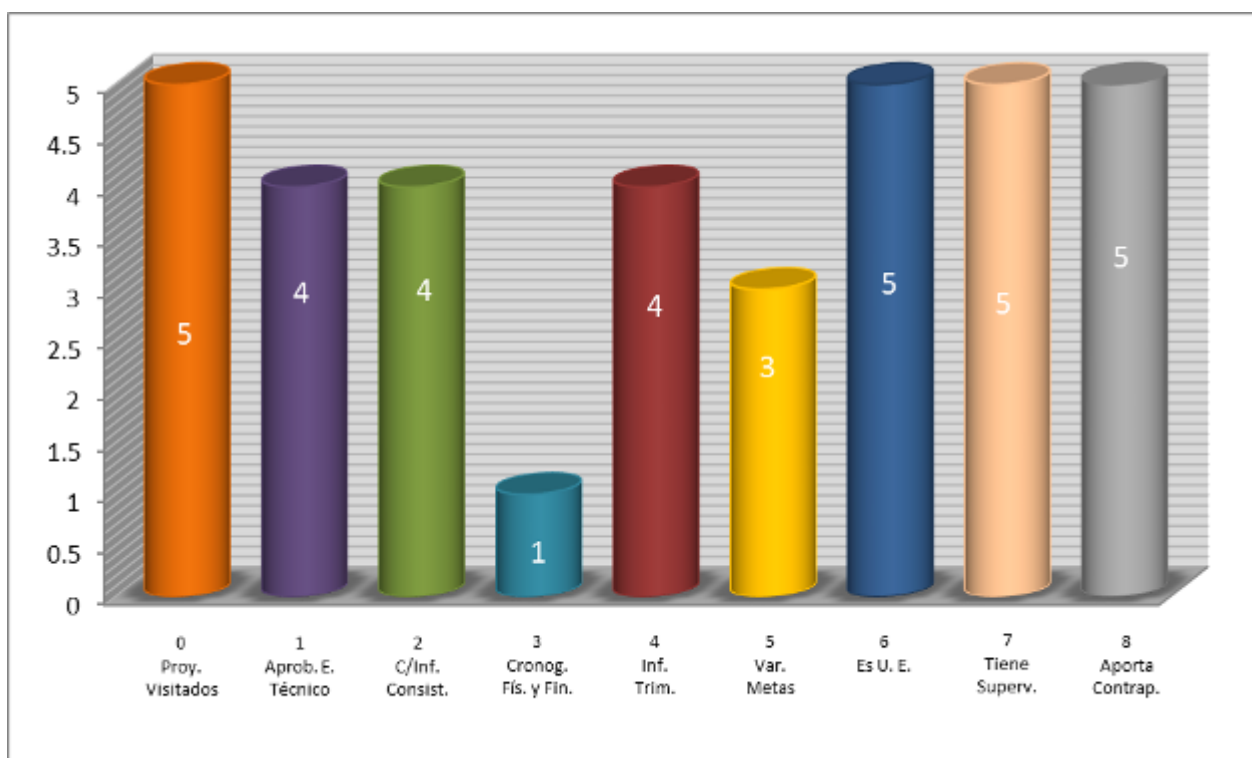



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública


“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

3. EJECUCIÓN FÍSICA

3.1 Avance físico, según tipo de propuesta

Los 5 PIP's visitados en la región Cajamarca, presentan el avance físico global, siguiente:

Gráfico N° 02

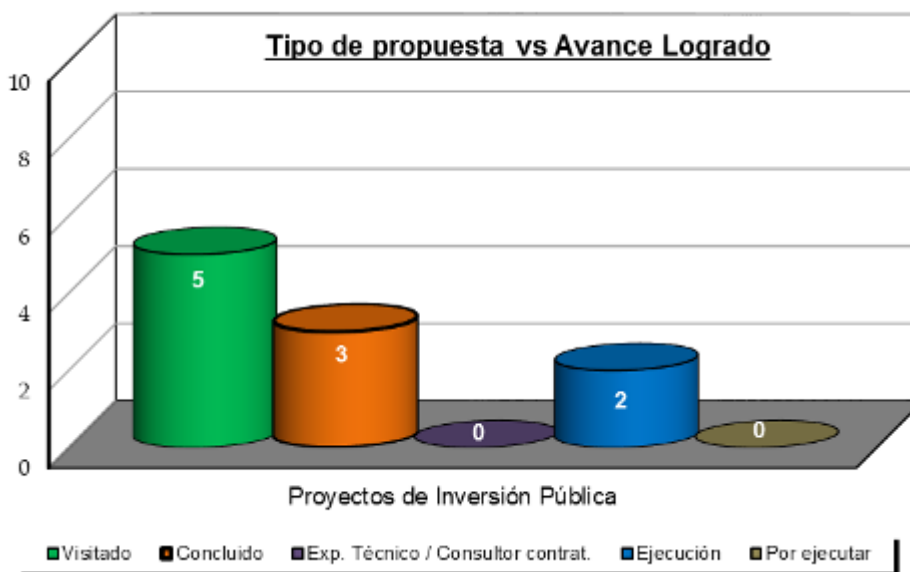

De los 05 PIP visitados 03 han concluido y 02 en ejecución, ninguno está pendiente de inicio, sin embargo está pendiente los informes de culminación.

3.2 Avance físico de cada proyecto visitado

La ejecución física de cada uno de los proyectos, visitados, presenta el estado situacional siguiente: Todos los PIP están en estado de ejecución y/o concluidos (05).



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de EconomíaDirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

Cuadro N° 04
AVANCE FÍSICO DE CADA PROYECTOS VISITADOS – CAJAMARCA

N°	DESCRIPCION	CONVOCATORIA	POR INICIAR	AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEGÚN ETAPA DE EJECUCION			AVANCE FISICO ACUMULADO (%)
				EN EXP. TECNICO	EN EJECUCION	TERMINADA	
1	RECONSTRUCCION I.E. 82294 CUNGUNDAY - CAJABAMBA.	5				1	100%
2	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BLANCA, DISTRITO UNION AGUA BLANCA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA	6				1	100%
3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL - EL TORO, EN EL DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA	5				1	100%
4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUASMÍN - EL BALCÓN, EN EL DISTRITO DE HUASMÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA	5			1		85%
5	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE REGADIO DE LA CUENCA DEL RIO CHONTA DISTRITOS BAÑOS DEL INCA-LLACANORA -JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	5			1		90%
TOTAL			0	0	2	3	
AVANCE FISICO PORCENTUAL SEGÚN CONVOCATORIA		5					94%
		6					100%

A continuación mencionamos algunos comentarios de lo observado en la visita a los siguientes proyectos:

- a) RECONSTRUCCION I.E. 82294 CUNGUNDAY - CAJABAMBA.
- El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla la construcción de seis (06) aulas, una batería de SS.HH. para niños y niñas por separado con tres inodoros y un lavadero corrido con tres caños para las niñas, 01 SS.HH para el personal; hombres y mujeres por separado (con un inodoro, un lavatorio y un urinario para los varones y un inodoro y un lavatorio para las damas), construcción de ambientes generales como: 01 biblioteca, 01 sala de computo, 01 dirección, 01 sala de uso múltiples, 01 sala de profesores, 01 deposito-guardianía, 01 tópico y psicología, 01 losa deportiva para usos múltiples, cerco perimétrico, escalera de acceso al segundo piso, 01 sistema de desagüe adecuado para la zona, 01 sistema de drenaje para aguas de lluvia, pasillos, veredas rampas, jardineras y áreas verdes. El cerco perimétrico en su mayor extensión será de mampostería confinada y en la fachada principal será enrejado.
 - En la visita de campo se verificaron las obras ejecutadas en la institución educativa, se constataron cambios en lo ejecutado respecto del PIP



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”**

viable, fundamentalmente en lo siguiente: construcción de ambientes que corresponden a: 01 batería adicional de SS.HH para niños y niñas en el segundo nivel, 01 comedor cafetería, 01 almacén y 01 ambiente para cocina.

- Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa está actualmente en uso por alumnos y profesores de la Institución Educativa.
 - A la fecha la entidad no ha cumplido con levantar las observaciones a los informes trimestrales correspondientes al IV trimestre 2012, I al IV trimestre del 2013 y el informe de culminación, el cual fue presentado y observado.
 - Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas.
 - En razón a causales de incumplimiento señaladas en el convenio 036-2011-FONIPREL, Con memorando N° 1859-2013-EF/63.01, se solicita a la dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público la suspensión temporal de uso de recursos del FONIPREL.
- b) MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE REGADIO DE LA CUENCA DEL RIO CHONTA DISTRITOS BAÑOS DEL INCA-LLACANORA - JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
- El PIP contempla la ejecución del Revestimiento de los canales en forma trapezoidal con concreto simple $f'c=175$ Kg/cm² en un espesor de 10.00cm en una longitud de 42.42 Km, proveer Tomas laterales considerado la elaboración y colocado de 212.00 tarjetas metálicas para la distribución lateral de agua y la Capacitación a los usuarios mediante talleres con los objetivos de fortalecer la comisión de riego con capacidad de autogestión, eficiente manejo de la infraestructura de riego, tecnologías de riego parcelario y minimizar conflictos en la distribución del agua.
 - En la visita de Campo se verificaron las obras ejecutadas correspondiente a 11 canales de regadío distribuidos en los distritos de Baños del Inca, Llacanora y Jesús, de los cuales solo fueron posible la visita de 03 canales de regadío, constatándose que los sistemas de riego se encuentran en ejecución; se estima un avance de 90%, faltando ejecutar las partidas y/o actividades de instalación de compuertas metálicas, juntas de dilatación y la capacitación a los usuarios.
 - De los canales de regadío visitadas se verificó el dimensionamiento de las secciones las cuales han sufrido modificaciones en espesor de muro $e=0.15$ m.
 - Asimismo, no se pudo llegar a otros canales por limitaciones de tiempo y combustible para el extenso recorrido del sistema.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”**

- A la fecha la entidad no ha cumplido con presentar informes trimestrales correspondientes al II y III trimestre del 2014.
 - No ha presentado los contratos de consultoría, supervisión, contratista, resúmenes de valorizaciones y resolución de aprobación de expediente técnico y sus correspondientes registros de acuerdo a la normativa vigente del SNIP, de acuerdo a la visita de campo se constató la presencia de la supervisión.
 - Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas y el cumplimiento de la remisión de los informes.
- c) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL - EL TORO, EN EL DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA.
- El PIP contempla la rehabilitación de 29.855 km de canal de concreto trapezoidal, a lo largo de todo el canal se proyectan obras complementarias como: mejoramiento de obras de arte (pontón, acueductos, caídas), contemplan la construcción de sistemas de drenajes, construcción de tramos de canal en concreto donde hayan colapsado, así como gaviones para protección de los mismos, así mismo se ha considerado la capacitación a los beneficiarios en técnicas de riego, gestión administrativa, fortalecimiento institucional y alianzas estratégicas (cadenas productivas) y participación de las entidades públicas y privadas en la promoción de la agricultura en el distrito de Celendín, capacitación y mitigación ambiental.
 - El proyecto fue culminado hace un año, sin embargo hasta la fecha no han emitido el informe de culminación correspondiente.
 - La verificación hecha en el proyecto, se pudo constatar que se han realizado cambios en lo ejecutado respecto del PIP viable, se ha considerado la construcción de un canal entubado y cámaras de inspección, señalar además que el expediente técnico, de acuerdo a su presupuesto, indicaba la instalación de un diámetro de 800 mm, verificando en el campo que el diámetro es de 700 mm.
 - El sistema de riego no se encuentra en funcionamiento, se ha observado que la obra ha sufrido daños producto de deslizamientos presentados en el talud, ocasionando derrumbes en 02 tramos del canal, a pesar de contar con protección (la construcción de gaviones), es debido a esta ocurrencia el canal no está operativo.
 - Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se remitirá un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, tanto en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio, como en



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"**

la remisión del informe de culminación correspondiente y los informes trimestrales pendientes.

d) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUASMÍN - EL BALCÓN, EN EL DISTRITO DE HUASMÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA.

- El PIP Consiste en la construcción e instalación del canal telescópico entubado a presión cuyos diámetros varían en tres tramos, el primer tramo que va de la progresiva 0+000 al 5+000 tiene una longitud de 5.0 km de tubería HDPE PN 6 cuyo diámetro es 315mm, el segundo tramo va de la progresiva 5+000 al 8+600 de 3.60 km de tubería C-5 UF PVC cuyo diámetro es 250mm y el tercer tramo comienza de la progresiva 8+600 al 10+600 de 2.00 km de longitud y con tubería C-5 UF PVC cuyo diámetro es 110mm, para la red de riego El Balcón – Huasmín, la construcción de toma de concreto armado, desarenador, la distribución del caudal en la línea de tubería será con 04 hidrantes (válvulas de compuerta), cámaras y tapas de protección. La línea de tubería contará con 02 cámaras reductoras de presión (02 Unid), se construirá un reservorio de Geo membrana con un volumen de $V=680m^3$. La capacitación a los beneficiarios en técnicas de riego, gestión administrativa, fortalecimiento institucional y alianzas estratégicas (cadenas productivas) y participación de las entidades públicas y privadas en la promoción de la agricultura en el Distrito de Huasmín.
- El proyecto ha sido dividido en 2 etapas, esto de acuerdo a lo manifestado por el sub gerente de obras.
- La segunda etapa estaría incluyendo la construcción de un reservorio de volumen 680 m³.
- Al momento de la visita del sistema de riego se constató que la infraestructura está en etapa de pruebas hidráulicas.
- A la fecha la entidad no ha cumplido con presentar el levantamiento de observaciones de los informes trimestrales.
- Ante las ocurrencias anotadas en los párrafos precedentes, se remitirá un oficio solicitando al beneficiario el sustento y la subsanación de las mismas y el cumplimiento de la remisión de los informes con la finalidad de culminar con el convenio.

e) MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BLANCA, DISTRITO UNION AGUA BLANCA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA.

- El PIP consiste en la Construcción de 05 ambientes para aulas, Construcción de 01 ambiente para dirección. Construcción de 01 ambiente para sala de docentes. Construcción de 01 ambiente para laboratorio de cómputo. Construcción de 01 ambiente para laboratorio de



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”**

física, química y biología. Construcción de 01 ambiente para biblioteca. Construcción de 01 ambiente para sala de usos múltiples. Construcción de un ambiente para departamento de educación física. Construcción de servicios higiénicos para alumnos varones, mujeres y docentes; estos ambientes serán de material noble, con techo de teja andina sobre estructura portante de madera, y pisos de porcelanato. Construcción de un patio de usos múltiples con accesorios deportivos (arcos de fútbol, tablero de basquetbol, net de voleibol). Construcción de cerco perimétrico de 281.00 m (111.00 m de ladrillo tipo soga, 44.00 m de malla metálica y 126.00 de cerco vivo). Adquisición de 70 Carpetas unipersonales, adquisición de 18 módulos de madera para computadora, 18 sillas de madera, 01 pizarra acrílica para lab. Cómputo y 01 pupitre de melanina y 01 silla de madera para lab. cómputo, adquisición de 04 mesas de melanina, 02 estantes de melanina con puertas de seguridad y 01 pupitre de melanina y 01 silla de madera para laboratorio de Cómputo. para lab. Física, química y biología, adquisición de 04 mesas de melanina, 16 sillas de metal y dos estantes de melanina sin puertas de seguridad para biblioteca, adquisición de 03 estantes de melanina con puertas de seguridad para el departamento de educación física, adquisición de 50 sillas de plástico para sala de usos múltiples y una mesas de melanina , adquisición de 15 equipos de cómputo con monitor LCD de 17, adquisición de impresora, adquisición de equipo audiovisual, adquisición de equipo para lab. Física, química y biología.

- Al momento de la visita de campo, se encontró que la infraestructura estaba en uso pleno por parte de los alumnos y profesores de la Institución Educativa por lo que la obra se encuentra totalmente concluida.
- El acabado de pisos de cada ambiente es de cemento pulido, el cerco perimétrico no es de ladrillo y de malla metálica, siendo el instalado del tipo “cerco vivo”.
- Los montos asignados a los componentes de mobiliario y equipamiento no fueron ejecutados, según manifestación del gerente de infraestructura, fue ejecutado con un programa escolar ejecutado por la Municipalidad Distrital de Cajamarca.
- A la fecha la entidad no ha cumplido con presentar los informes III y IV trimestre 2013, I y II trimestre 2014.
- Se remitirá un oficio al beneficiario solicitando la presentación de los informes trimestrales pendientes y el informe de culminación con la finalidad de culminar con el convenio.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

El FONIPREL tiene como fuentes de financiamiento, las señaladas en el Artículo 6º de la Ley 29125, Ley que establece su implementación y funcionamiento,



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública


**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"**

habiendo transferido a los GGLL y GGRR, a setiembre de 2014, por efectos de los nueve concursos, la suma de S/. 160, 352,001.51; habiéndose efectuado las transferencias conforme a una programación financiera presentada por el beneficiario a la firma del convenio, en el ámbito correspondiente a la Región Cajamarca.

4.1 Ejecución financiera según fuente de financiamiento

Los PIP/estudios objeto de las visitas de campo, alcanzan una inversión total de S/. 14,571,594.06, de los cuales estuvo programado ejecutar hasta la fecha la totalidad, sin embargo se ha ejecutado únicamente S/. 11,917,923.00 (93.03%), lo que constituye una limitada ejecución financiera. Del monto ejecutado, el 87.91% provienen de la fuente FONIPREL y el 12.09% de la fuente de los beneficiarios. En el gráfico N° 03 se presenta la información señalada.

Gráfico N° 03

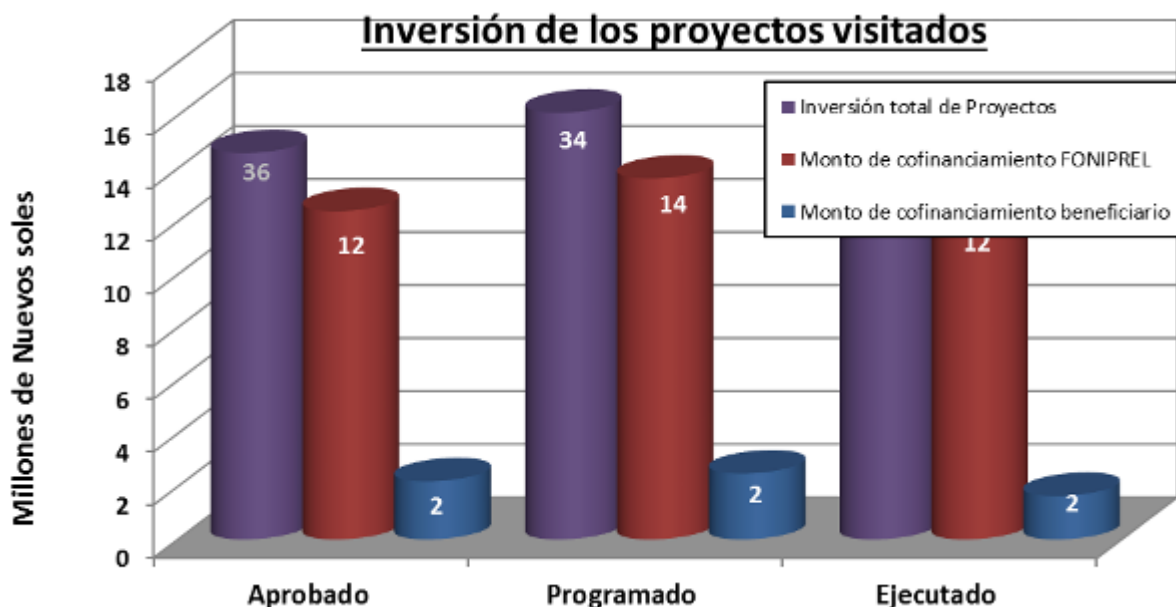

4.2 Avance financiero de cada proyecto visitado.

La ejecución financiera de cada uno de los proyectos visitados, presenta el estado situacional siguiente:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"**

Cuadro Nº 06

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	DEL CONVENIO		DE LA INVERSIÓN		AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)	
			INVERSIÓN TOTAL	COFINANC.	PROGRAM. A SETIEMBRE 2014	EJECUTADA A SETIEMBRE 2014		
1	RECONSTRUCCION I.E. 82294 CUNGUNDAY - CAJABAMBA.	5	S/. 1,659,383.00	S/. 1,626,195.00	S/. 1,617,161.00	S/. 1,617,161.00	100.00%	
2	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BLANCA, DISTRITO UNION AGUA BLANCA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA	6	S/. 1,379,004.00	S/. 1,310,054.00	S/. 1,310,055.00	S/. 1,310,055.00	100.00%	
3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL - EL TORO, EN EL DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA	5	S/. 2,982,665.63	S/. 2,923,012.32	S/. 2,920,908.00	S/. 2,920,908.00	100.00%	
4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUASMÍN - EL BALCÓN, EN EL DISTRITO DE HUASMÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA	5	S/. 3,592,920.43	S/. 3,521,062.02	S/. 4,793,212.47	S/. 3,197,752.00	66.71%	
5	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE REGADIO DE LA CUENCA DEL RIO CHONTA DISTRITOS BAÑOS DEL INCA-LLACANORA -JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	5	S/. 4,957,621.00	S/. 3,000,000.00	S/. 4,793,212.47	S/. 2,970,000.00	61.96%	
			S/. 14,571,594.06	S/. 12,380,323.34	S/. 15,434,548.94	S/. 12,015,876.00	77.85%	
AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)							1	100.00%
							2	82.17%

A continuación mencionamos algunos comentarios del avance financiero observado en la visita a los siguientes proyectos y estudios:

- De los proyectos visitados, tres (03) de ellos tienen un avance financiero al 100% de lo programado, dos (02) por debajo de lo programado, sobretodo en el cumplimiento del cofinanciamiento de FONIPREL.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”**

- Los proyectos visitados tienen un nivel de cumplimiento de su contrapartida del 100%, a excepción del proyecto de la provincial de Cajamarca que cuentan con una ejecución de contrapartida del 55%.
- El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUASMÍN - EL BALCÓN, EN EL DISTRITO DE HUASMÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA”, ha sido dividido en 2 etapas; la primera etapa tiene un avance financiero del 91%, sin embargo con la segunda etapa de acuerdo a su programación su avance financiero sería del 61.96%, mientras que los recursos de FONIPREL han sido ejecutados al 90.82%.

5. PRINCIPALES LOGROS

- 03 PIP visitados se encuentran en culminados.
- 11 aulas construidas
- 16.41 Km de canal para sistema de riego construida (no se incluye las no visitadas).
- Mejoramiento de aproximadamente 34 km de canal de riego.

6. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS

- Los fenómenos climáticos adversos como las lluvias han originado paralizaciones de obra por la imposibilidad de trasladar materiales y realizar las actividades inherentes a la obra, según manifestaciones del personal de cada entidad.
- Escasa información documentada como en el caso de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, las cuatro (4) entidades restantes si han presentado informes trimestrales y/o informes de culminación, estando pendiente el levantamiento de observaciones.

7. CONCLUSIONES

- El FONIPREL se encuentra cofinanciando la ejecución / elaboración de 18 PIP/estudios, en la Región Cajamarca seleccionados en la quinta y sexta Convocatoria.
- El importe del cofinanciamiento otorgado por el FONIPREL en estas dos (2) convocatorias asciende a S/. 14'571,594.06 millones, de los cuales se han transferido a los GGRR y GLL, el 100%.
- De los 05 PIP visitados, tres proyectos, han concluido su ejecución física, sin embargo hasta la fecha dos (02) de ellos tienen pendiente el levantamiento de



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”**

observaciones de informes trimestrales e informes de culminación y uno (01) la presentación del informe de culminación.

- De Los 05 PIP, se ha ejecutado el 93.03% del presupuesto total aprobado, de los cuales, desagregando por fuente de financiamiento, el 87.91% del presupuesto comprometido por FONIPREL está ejecutado y el 75% de la contrapartida comprometida ha sido ejecutada hasta la fecha.

8. PANEL FOTOGRÁFICO

Ver Anexo 1

Lima, Octubre de 2014

Hernan Ballena Rodriguez
Analista FONIPREL

hb,jq//CT



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

ANEXO Nº 01

PANEL FOTOGRÁFICO DE OBRAS

1. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA			
REGIÓN: CAJAMARCA	PROVINCIA: CAJABAMBA	DISTRITO: CAJABAMBA	LOCALIDAD: CUNGUNDAY
OBRA: RECONSTRUCCION I.E. 82294 CUNGUNDAY - CAJABAMBA.			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 1'659,383	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 1'626,195
CODIGO SNIP:	86988		



Vista Panorámica de la I.E.
Re-Construida



Vista del frontis de la I.E. Re-Construida



Vista del pabellón y la losa
recreativa



Vista de una de las aulas



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"**

2. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL			
REGIÓN: CAJAMARCA	PROVINCIA: SAN MIGUEL	DISTRITO: UNION AGUA BLANCA	LOCALIDAD: -----
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BLANCA, DISTRITO UNION AGUA BLANCA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL – CAJAMARCA.			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 1'379,004	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 1'310,054
CODIGO SNIP:	85012		



Vista de 2 pabellones y la losa deportiva



Vista del tercer pabellón, losa deportiva y del cerco perimétrico "cerco vivo"



Vista de la sala de laboratorio



Vista del laboratorio de cómputo



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

3. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN			
REGIÓN: CAJAMARCA	PROVINCIA: CELENDIN	DISTRITO: CELENDIN	LOCALIDAD: -----
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SENDAMAL - EL TORO, EN EL DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 2'982,665.63	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 2'923,012.32
CODIGO SNIP:	190478		



Vista del camino de acceso



Vista del canal de regadío



Vista del 1^{er} tramo entubado colapsado ocasionado por derrumbe del talud.



Vista del 2^{do} tramo entubado colapsado por derrumbe del talud.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

4. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN			
REGIÓN: CAJAMARCA	PROVINCIA: CELENDIN	DISTRITO: HUASMIN	LOCALIDAD: -----
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUASMÍN - EL BALCÓN, EN EL DISTRITO DE HUASMÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 3,592,920.43	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 3,521,062.02
CODIGO SNIP:	190460		



Vista de la estructura de toma ó captación.



Vista de la estructura del desarenador y sistema de rebose y limpia



Vista de la estructura correspondiente a la cámara de válvulas.



Vista interior de la cámara, se aprecia la válvula de aire



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Economía

Dirección General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
" AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA			
REGIÓN: CAJAMARCA	REGIÓN: CAJAMARCA	REGIÓN: BAÑOS DEL INCA - LLACANORA - JESUS	LOCALIDAD: -----
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE REGADIO DE LA CUENCA DEL RIO CHONTA DISTRITOS BAÑOS DEL INCA-LLACANORA -JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 4,957,621.00	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 3,000,000.00
CODIGO SNIP:	176686		



Vista del canal de concreto (Dist. de Llacanora) en la progresiva 2+340, también se aprecia la válvula compuerta en proceso de instalación.



Vista de la instalación del marco de la válvula compuerta y del canal de concreto en la progresiva 2+960



Vista del canal de concreto (Dist. de Jesús), también se aprecia falta de acabados y sin instalación de válvula compuerta.



Vista del canal de concreto (Dist. de Jesús), también se aprecia falta de acabados y sin instalación de válvula compuerta.
