

FONIPREL

**FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA
REGIONAL Y LOCAL**

Secretaria Técnica

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

**CUSCO
VISITA DE CAMPO SETIEMBRE 2014**

(Cuarta, Quinta y Sexta Convocatoria)

Lima, Octubre de 2014



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de EconomíaDirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL FONIPREL

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS – VISTAS DE CAMPO - CUSCO
(Cuarta, Quinta y Sexta Convocatoria)

1. ANTECEDENTES

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, a Octubre del 2014, ha realizado 09 Concursos para el Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública y Estudios de Preinversión.

En el siguiente cuadro se detalla información referida a las propuestas seleccionadas en los cuatro concursos

Cuadro Nº 01
PROPUESTAS SELECCIONADAS EN LOS CONCURSOS FONIPREL

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE TRANSFERENCIA
1ER. CONCURSO	372	376 779 924,00	375 822 955,00	D.S. Nº 116-2008-EF
				D.S. Nº 062-2009-EF
				D.S. Nº 111-2010-EF
2DO. CONCURSO	265	294 685 998,00	293 843 755,00	D.S. Nº 089-2009-EF
				D.S. Nº 144-2010-EF
3ER. CONCURSO	181	268 895 903 ,00	254 390 739,00	D.S. Nº 068-2010-EF
4TO. CONCURSO	206	273 106 889,00	145 304 526,00	D.S. Nº 205-2010-EF
5TO. CONCURSO	266	462,049,961.96	455,018,676.00	D.S. Nº 211-2011-EF
				D.S. Nº 083-2012-EF
				D.S. Nº 102-2013-EF
6TO. CONCURSO	96	141,568,993.96	141,522,217.00	D.S. Nº 179-2012-EF
				D.S. Nº 124-2013-EF
7MO. CONCURSO	161	193,688,812.67	190,980,151.00	D.S. Nº 250-2013-EF
				D.S. Nº 043-2014-EF
8VO. CONCURSO	386	603,793,235.16	581,537,849.00	D.S. Nº 036-2014-EF
9NO. CONCURSO	454	827,064,730.54	237,690,761.00	D.S. Nº 278-2014-EF
TOTAL	2387	2,228,165,734.29	1,606,749,654.00	

Las propuestas seleccionadas en el departamento de Cusco, en los nueve concursos, actualizado al segundo trimestre, se muestra en el siguiente cuadro:



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de EconomíaDirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

Cuadro N° 2
PROPUESTAS SELECCIONADAS – CUSCO

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENT TO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)
1ER. CONCURSO	10	7,275,559.67	7,275,559.67
2DO. CONCURSO	9	12,955,286.32	12,955,286.32
3ER. CONCURSO	4	5,330,018.00	5,330,018.00
4TO. CONCURSO	10	9,246,467.00	9,246,467.00
5TO. CONCURSO	16	23,450,645.80	19,638,599.80
6TO. CONCURSO	4	5,555,911.49	5,555,911.49
7MO. CONCURSO	5	20,047,226.00	20,047,226.00
8VO. CONCURSO	16	45,842,553.52	45,216,561.00
9NO. CONCURSO	24	70,400,023.80	15,690,794.00
TOTAL	98	200,103,691.60	140,956,423.28

2. INFORMACIÓN GENERAL

El seguimiento a los proyectos de inversión pública (PIP) y estudios de preinversión seleccionados en las convocatorias realizadas por el FONIPREL, se realiza con el objetivo de conocer su estado situacional, en relación al cumplimiento de las metas establecidas, plazos fijados y recursos asignados, a fin de tomar las acciones necesarias para superar las desviaciones que pudieran haberse producido.

La información que se presenta tiene como fuente: i) los informes trimestrales a setiembre 2014, presentados por las entidades visitadas del cuarto, quinto y sexto Concurso FONIPREL; y ii) las visitas in situ y reuniones personalizadas sostenidas con los beneficiarios en la semana del 21 de setiembre al 27 de setiembre del presente.

En el departamento de Cusco se aprobaron hasta el sexto concurso, la elaboración / ejecución de 53 propuestas, de las cuales se han visitado 09 (9%).

Cuadro N° 3
PROYECTOS VISITADOS – CUSCO

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	MONTO EJECUTADO (S/.)
4TO. CONCURSO	1	458,443.00	329,060.00	2.228.630,00
5TO. CONCURSO	5	10,856,798.30	10,856,799.00	1.840.878,00
6TO. CONCURSO	3	4,686,851.00	4,686,851.00	2.269.375,00
TOTAL	9	16.002.092.30	15,872,710.00	6.338.883,00



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público


"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

Los proyectos visitados (09), en lo referido al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de cofinanciamiento que a continuación se presentan el nivel que se indica en el Gráfico N° 1.

1. El expediente técnico, tiene Resolución de aprobación
2. El estudio definitivo tiene informe de consistencia
3. Los cronogramas de ejecución física y financiera están actualizados
4. El beneficiario ha presentado sus informes trimestrales
5. El proyecto tiene variación de metas adecuadas a las normas SNIP (Para proyectos SNIP) o cuenta con aprobación del Órgano Resolutivo (Para proyectos no SNIP)
6. El beneficiario está registrado como Unidad Ejecutora en el Banco de Proyectos.
7. Tiene Acreditada la supervisión del proyecto en ejecución.
8. El beneficiario aporta su contrapartida de manera adecuada.

GRÁFICO N° 1

**NIVEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO
EN PROYECTOS VISITADOS – CUSCO**

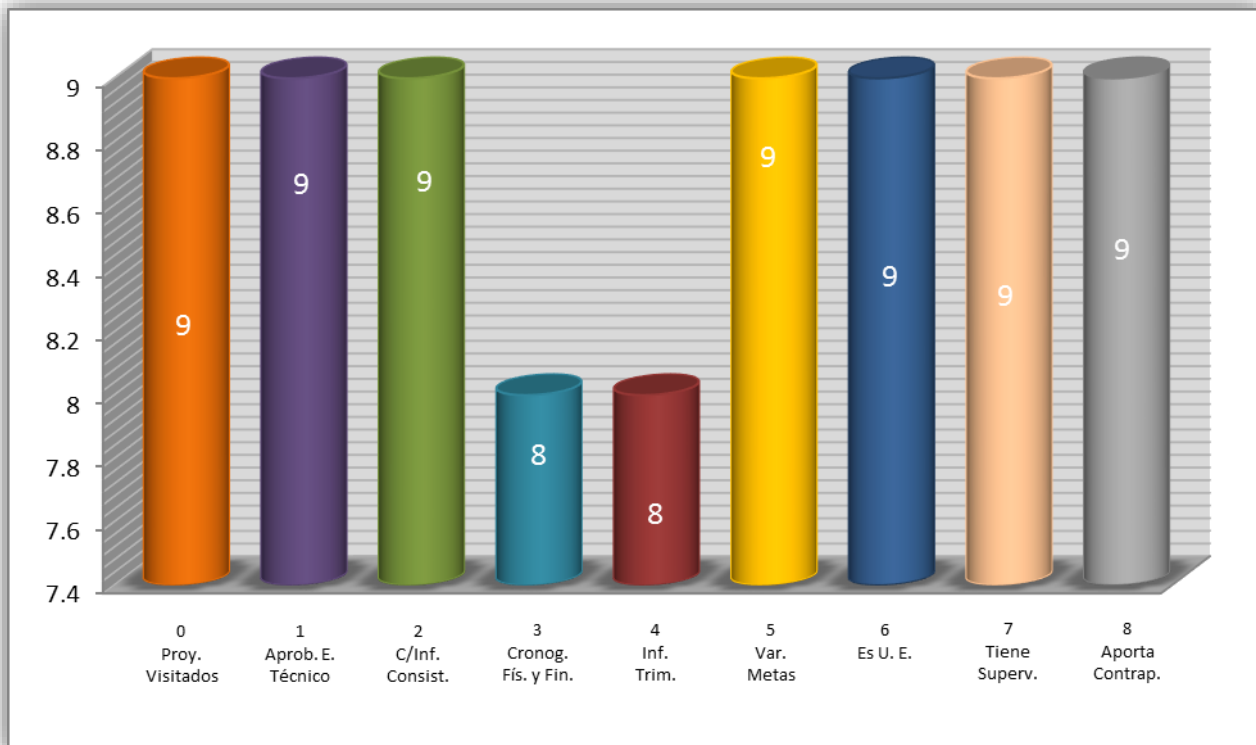



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público


"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

3. EJECUCIÓN FÍSICA

3.1 Avance físico, según tipo de propuesta

Los 9 PIP's de inversión visitados en la región Cusco, presentan el avance físico global, siguiente:

Gráfico N° 02

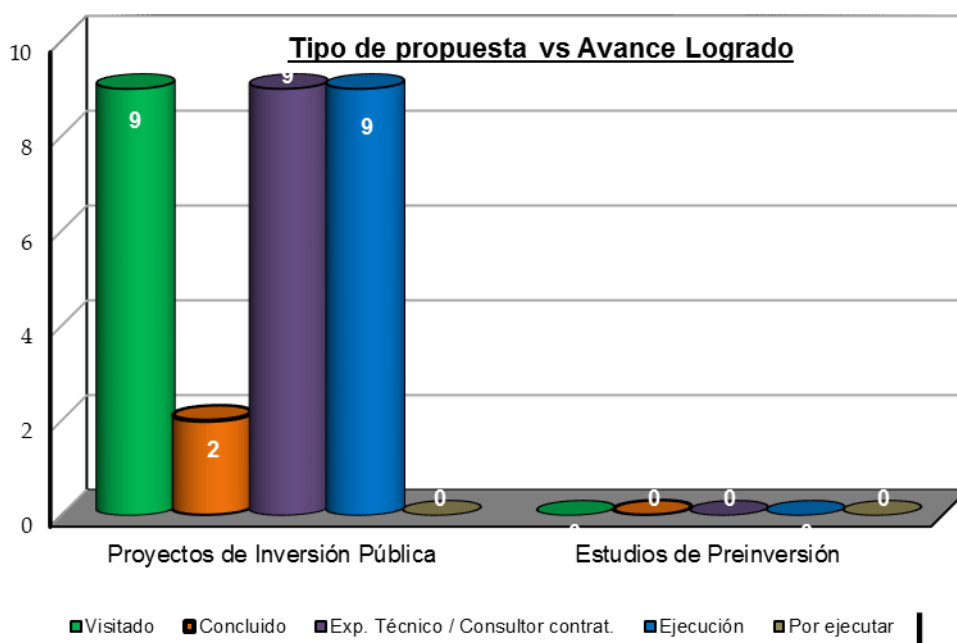

3.2 Avance físico de cada proyecto visitado

La ejecución física de cada uno de los proyectos, visitados, presenta el estado situacional siguiente: Todos los PIPs están en estado de ejecución (06) y/o concluidos (02).



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

Cuadro N° 04 AVANCE FÍSICO DE CADA PROYECTOS VISITADOS – CUSCO

N°	NOMBRES DE PROYECTOS A SER VISITADOS	CONVOCATORIA	POR INICIAR	AVANCE FISICO DEL PROYECTO Ó SEGÚN ETAPA DE EJECUCION			AVANCE FISICO ACUMULADO (%)
				EN EXP. TECNICO	EN EJECUCION	TERMINADA	
1	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 50100 LA NAVAL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO ; CONVENIO 103-2011-FONIPREL	5	0	1	1		80
2	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50006 JORGE LUIS NAVARRETE EN LA URB. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO ; CONVENIO 040-2011-II-FONIPREL	6	0	1	1		90
3	MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 50362 DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO-PROVINCIA DE PARURO ; CONVENIO 038-2011-II-FONIPREL	6	0	1	1		95
4	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANOQUITE-TIHUICTI, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO ; CONVENIO 092-2011-FONIPREL	5	0	1	1		85
5	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUQUISQUE - HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO ; CONVENIO 095-2011-FONIPREL	5	0	1	1		85
6	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE COYA, MICRORED PISAC - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO DISTRITO COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO ; CONVENIO 094-2011-FONIPREL	5	0	1	1		80
7	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. N° 50483 VIRGEN DEL CARMEN DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, REGIÓN CUSCO ; CONVENIO 101-2011-FONIPREL	5	0	1	1		95
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50520 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACHAC, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO : CONVENIO 039-2011-II-FONIPREL	6	0	1	1		95
9	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 50484 NIVEL PRIMARIO CCOLCA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO ; CONVENIO 078-2010-FONIPREL	4	0	1	1		95
TOTAL			0	9	9	0	
AVANCE FISICO PORCENTUAL SEGÚN CONVOCATORIA		4					95
		5					85
		6					93



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

A continuación mencionamos algunos comentarios de lo observado en la visita a los siguientes proyectos:

a) **MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 50100 LA NAVAL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA – CUSCO.**

- El Proyecto, de acuerdo al perfil, tiene construcción de ambientes pedagógicos (Nivel Primaria(12 aulas, 01 laboratorio de computo), Nivel secundario(02 aulas, 01 laboratorio especial de Física, Química, biología, 01 taller multifuncional, 01 laboratorio de computo), ambientes complementarios(01 biblioteca escolar compartida para primaria y secundaria, 01 aula de O.B.E para el nivel secundario), ambientes administrativos y de servicio compartida para ambos niveles(Construcción de 01 dirección, 01 secretaria y espera, 01 sala de profesores, 01 tópico, 01 depósito de material educativo, SS.HH para docentes y SS.HH para alumnos del nivel secundario y la remodelación de SS.HH del nivel primario, 01 comedor escolar), construcción de infraestructura externa (01 patio de honor, cerco perimétrico en 60ml y la remodelación de loza deportiva multifuncional, tratamiento de Jardines y áreas verdes, Construcción de veredas, Mitigación del Impacto Ambiental). El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas empotradas con las siguientes especificaciones: Cimentaciones: zapatas $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$, vigas de cimentación $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% de piedra mediana y sobre cimientos $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$; Columnas y vigas: en estructura de fierro armada con un concreto de $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$; Mampostería (Muros de cabeza y sogá) con bloques de KK de 0.24x0.14x0.09 y ladrillo Artesanal (corriente) de 8x12x24cm, asentado con mortero de cemento y arena en una proporción de 1:6; El piso será enchapado con cerámico de 30 x 30, colocado sobre una superficie de concreto simple que será vaciada sobre una base empedrada en el caso de ambientes administrativos será con parquet; Puertas de Madera tablero rebajado con cerraduras, serán hechos con piezas escuadradas de sección rectangular de madera cedro o similar, cepillados en sus caras expuestas; Ventanas de madera con vidrio incoloro semi-doble, la colocación de ventanas en las fenestraciones de superficies verticales serán a una altura determinada del piso terminado dejadas para la iluminación o ventilación de un ambiente; Cielo raso con enlucido de Yeso; Cobertura de techo con planchas de fibro cemento-eternit tipo teja andina, sobre estructura de madera (tijerales), El sistema de evacuación de Aguas pluviales comprende la colocación de canaletas, tuberías de evacuación de aguas pluviales (montantes) así como los aditamentos y soportes para las canaletas y tuberías, El sistema de iluminación es el tipo convencional del tipo directo con artefactos fluorescentes, rectos, simples. la infraestructura externa: Cerco Perimétrico con perfile metálicos, con columnas intermedias y tendrá



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

una altura promedio de 2.50 m., sobrecimiento de 0.60 m X 0.15m de espesor, Veredas de concreto, se ubicaran en el perímetro de las construcciones nuevas y en las zonas de tránsito, consiste en la losa de concreto vaciada sobre una base empedrada con piedras medianas de 4 cuyo diseño de mezcla es de 175 Kg/cm², Patio de honor y losa deportiva de 1640.00 m², será construido a base de concreto $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ sobre piedra mediana de 4 a 6 (pulgadas). Implementación con mobiliario y equipo escolar y la capacitación a padres de familia y docentes del nivel primaria y secundaria en temas de comunicación familiar(sentido de propósito de la familia, fijar metas y objetivos), autoestima(sentido de seguridad, conocer los talentos y desarrollar el potencial), en valores en la familia(el rol de los padres), aprendamos a estudiar en familia, prevención de la violencia intrafamiliar(construir la competencia: superar obstáculos y celebrar logros, construir la seguridad: los límites que sirven diferencia entre límite y castigo) todo esto a través de 02 talleres.

- Al momento de la visita de campo, se encontró que la infraestructura estaba en proceso de construcción, con un avance aproximado del 80%, en la cual se han contemplado los ambientes y obras complementarias propuestos en el perfil, Así también , se pudo constatar que se han realizado cambios en lo ejecutado respecto del PIP viable, fundamentalmente en lo siguiente:
Se modificó ubicación de la cocina-comedor adosándola al pabellón existente de secundaria, no ejecutando la escalera considerada en el plano A-01 del estudio de pre inversión.
Se reubico y redimensiono la losa multifuncional para habilitar área para estacionamiento de vehículos particulares; por lo que se deberá considerar si cumple con las medidas reglamentarias deportivas.
No se culminado en colocar el cerco perimétrico en la parte posterior y lateral del colegio; asimismo no se ha implementado con el material didáctico, material de educación física, equipamiento eléctrico, sanitario y equipo de cómputo, así como el componente de capacitación.
En tal sentido se deberá culminar con los tendidos del sistema de agua, desagüe y para el tanque elevado que se ejecutan; así también no se ha ejecutado el tanque cisterna considerando está indicado en el informe de consistencia.
No se realizan los trabajos de mantenimiento en los servicios higiénicos ni en los depósitos de implementos deportivos y depósito de material didáctico.
Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa no está actualmente en uso por los alumnos ni profesores de la Institución Educativa.
- Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

b) MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50006 JORGE LUIS NAVARRETE EN LA URB. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO

- Construcción de doce aulas las cuales se distribuyen dos bloques de dos niveles de concreto armado con muros de ladrillo, entepiso de losa aligerada y techo de losa aligerada cubierta con teja de arcilla, las aulas tienen una capacidad de 40 alumnos. Construcción de un bloque administrativo de dos niveles, primer nivel se tendrá la dirección, secretaria y SS.HH. en el segundo nivel se encuentra la sala de profesores.
- Construcción de una edificación con área de 71.34 m² para la sala de computo. Construcción de un bloque de dos niveles de concreto armado para la biblioteca y comedor.
- Construcción de SS. HH. de concreto armado muros de ladrillo y techo de losa aligerada con cubierta de teja de arcilla en un área de 68.16 m². Se tendrá cinco inodoros en los SS. HH. mujeres y 05 inodoros en SS. HH. varones.
- Construcción de 4 cajas de escaleras, rampas y puente, Mejoramiento de cerco perimétrico existente, Construcción de veredas, habilitación de áreas verdes, compra de 40 computadoras. 02 computadoras laptop 01 impresora láser, 02 proyectores multimedia, 01 fotocopidora, 02 televisores de 29", 02 reproductores de DVD, 01 sistema de alarma contra robo para el centro de cómputo; mesas, sillas y estantes para la biblioteca.
- Mesas, sillas y utensilios de cocina; escritorios y gabinetes para el área administrativa.
- La verificación hecha en la institución educativa, se pudo constatar que se han realizado cambios en lo ejecutado respecto del PIP viable, fundamentalmente en lo siguiente:
El puente que unen los dos pabellones ejecutados (aulas con baños de damas y varones, computo, comedor y cocina, le falta habilitar la estructura metálica para colocarle una cobertura longitudinalmente.
No se culminado con implementar con la totalidad de mobiliarios, equipamiento y áreas verdes; del mismo modo el componente de capacitación no se ha ejecutado; según lo indicado por el supervisor de la obra Ing. Axel Araoz Silva y el encargado de Obras de la Municipalidad de Santiago Ing. Omar Alegría con quien se realizó la visita.
Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la Institución Educativa.
- Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

c) MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 50362 DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO-PROVINCIA DE PARURO.

- Sistema aporticado, cimentación con zapatas y mampostería de bloque de Ladrillo: INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA: consiste en la construcción de 6 aulas de 52 m² cada una, un aula de uso múltiple de 80 m² y un aula de centro de cómputo de 80 m². La infraestructura complementaria, administrativa, servicios y externa: Consiste en la construcción de un ambiente para Biblioteca de 115.00 m², un S.S.H.H. Docentes de 5.00 m², un acondicionamiento de ambientes de 102.00 m², una cocina y depósito de 15.00 m², una guardianía de 13.00 m², un S.S.H.H. de varones (2 Inod., 3lav., 3Urin., 1Vest., 1Du) de 15 m², un S.S.H.H. de mujeres (2 Inod., 2lav., 1Vest., 1Du) de 13 m², un Botadero de 2.00 m², Veredas de circulación de 325.00 m². Cerco Perimétrico de 141.00 ml, Ampliación patio de Honor de 392.00 m². y Muro de contención de 70 ml. Mobiliario y Equipamiento Educativo: consiste en la adquisición de 06 Pizarras Acrílicas; 39 Módulos Primaria: 1 mesa + 1 silla (1 a 2); 88 Módulos de primaria de 1 mesa + 1 silla (3 a 6); 04 Pupitres y sillas para docentes; 07 Estantes para depósito de libros; 07 Mobiliarios de sala de lectura biblioteca (mesas); 40 Mobiliarios de sala de lectura biblioteca (sillas); 13 módulos para computadoras; 26 sillas individuales para el centro de cómputo; 02 Módulos para impresoras; 13 Computadoras Compatibles; 01 TV de 32 y DVD para sala de usos múltiples; 39 Diccionarios y la Implementación de Cocina de la IE.
- La verificación a la institución educativa, no se pudo constatar lo ejecutado internamente por encontrarse cerrada.
Según lo indicado por el supervisor de la obra Arq. Sandro Cuba Mercado de la Municipalidad de Pillpinto; el proyecto ejecutado se encuentra en liquidación técnica – financiera y en transferencia a la DRE/UGEL del ministerio de educación.
- Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario el estado situacional de la misma.

d) MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANOQUITE-TIHUICTI, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO – CUSCO.

- El abastecimiento de agua potable se dispone del Manante denominado Kehuar Huataccasa con un caudal de 15 lt/seg, del cual se captara 4.29 lt/seg. que será conducido por una línea de conducción de 7493 m de los cuales 5100 m. con tubería PVC SAP NTP ISO 4422 de 160 mm y 2393 m. con tubería PVC SAP NTP ISO 4422 de 100 mm; la longitud de la red de distribución es de 9956 m con tubería PVC SAP NTP ISO 4422 de 90 y



63 mm. Además se construirá 01 reservorio de almacenamiento uno de 70 m³ de capacidad para Maska. En Tihuicti, teniendo en cuenta que existe un reservorio de 40 m³ de reciente construcción que será incorporado al sistema para la red de colectores se considerara el existente en la localidad de Tihuicti, de reciente construcción que entregaran el caudal a 02 buzones y se instalaran nuevas redes en la localidad de Maska en una longitud de 1297 m con TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 160 mm y para el emisor 1840.65 m con tubería PVC UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200 mm incl. anillo. Además se considera la construcción de 49 buzones estándar. Construcción de un tanque séptico tipo Imhoff con sus respectivas cámaras de rejillas y lechos de secado.

- El recorrido se hizo con el Gerente de Obras Arq. Reynaldo Atasi Castilla, y el Residente Ing. Jose Huaman Huallpa, quienes manifestaron conocer los detalles del proyecto y un representante de la obra quien hizo de guía; asimismo se pudo llegar a la captación ubicado en lo alto de la localidad de Huanquite; por limitaciones de tiempo por lo extenso y geográficamente accidentado del recorrido del sistema de agua este se recorrió por tramos.
- Se observa en el punto captación que se encuentra muy expuesto por lo cual habilitaran un cerco perimétrico con su respectiva señalética el mismo que se observa en el estudio de preinversión; las cajas de concreto para las válvulas de purga deberán fijarse al terreno natural.
- No se pudieron observar los tendidos de conducción del sistema de agua desde la captación hasta el reservorio y luego hacia las redes de distribución por encontrarse cubiertos en toda su longitud.
- El reservorio de 50 m³ se encuentra con un cerco perimétrico metálico pero no contiene cerradura y/o candado que brinde seguridad en su interior; así también el cuarto de máquinas no tiene la tapa sanitaria, tampoco tiene la escalera de gato para ingresar y observar el funcionamiento del bombeo del agua que ingresa y se deriva a las redes de distribución.
- En la visita de Campo se verificaron las obras ejecutadas, constatándose que el sistema de agua potable encuentra en funcionamiento; encontrándose en ejecución los tendidos de distribución hacia las redes y conexiones domiciliarias.
- Con referencia al sistema de alcantarillado y buzones (red principal); estos se encuentran en ejecución sus tendidos domiciliarios y en ejecución los buzones de concreto.
- El sistema de tratamiento (tanque Imhoff) contiene: cámara de rejillas, tanque imhoff, lecho de secado de lodos, filtro biológico, obras de concreto, muros, cerco perimétrico; además se prevé reforestación en la planta de tratamiento de aguas residuales y capacitación en educación sanitaria; no realizando las veredas de concreto $f'c=140 \text{ kg/cm}^2$, suministrar y completar accesorios en la línea de distribución; el acarreo y eliminación del material excedente se deberá ejecutar para optimizar la seguridad en el perímetro al sistema de tratamiento (tanque Imhoff).



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

- El Arq. Reynaldo Atasi Castilla y el Ing. Jose Huaman Huallpa, mencionan que el proyecto se encuentra en proceso de culminación de partidas ejecutadas y recepción de obra.
- Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, se prevé tomar acciones mediante la remisión de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, se remitirá un oficio solicitando al beneficiario el sustento y la subsanación de las mismas, sobre todo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado el cumplimiento de la remisión de los informes.

e) MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE - HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO – CUSCO.

- Mejoramiento de la vía en 22.446 Km con superficie de rodadura afirmada de 0.30m, con una plataforma de 5.50 m., Construcción de Obras de Drenaje, Obras de Arte, Muros de Contención, Forestación, Reforestación, Paneles de señales informativas, señales restrictivas y actividades de mantenimiento rutinario y periódico.
- Al momento de la visita, el proyecto se encuentra en plena ejecución y funcionamiento; actualmente se está ejecutando las bases para puente Yaurisque que está camino a Huanoquite; tampoco no se ha habilitado e instalado la totalidad de la señalización considerada en el proyecto.
- Están en ejecución las obras de arte y drenaje (alcantarillado); así mismo los pontones, puentes y badenes a lo largo de la carretera; en el Km 09 se ejecuta 01 muro de protección (gavión) de los 05 considerados.
- El ingeniero residente Rubén Coayla Mamani, El ingeniero supervisor Luis Aedo y el Gerente de Obras Arq. Reynaldo Atasi Castilla, indican que los residentes del centro poblado de Yaurisque no facilitan la libre disponibilidad de áreas donde se ejecutaran obras civiles y para las obras de asfalto; del mismo modo algunas zonas presentan deslizamiento del talud y no se ha procedido a su limpieza, todo ello poniendo en riesgo la operatividad de la carretera.
- No se ha ejecutado el componente de protección de medio ambiente y las reposiciones respectivamente.
- Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, remitirá de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, tanto en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio, como en la remisión del informe de culminación correspondiente y los informes trimestrales faltantes.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

f) MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE COYA, MICRORRED PISAC - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO DISTRITO COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

- **COMPONENTE 1:** Construcción de infraestructura de concreto armado con mampostería de ladrillo y cobertura de teja andina sobre tijerales de madera en un área construido de 413.3035 m². La infraestructura nueva consta de un solo nivel con los siguientes Ambientes: Unidad de Administración con 57.73 m², Unidad de Consulta Externa 233.72 m², Unidad de Servicios Generales 13.26 m², Unidades complementarias en 96.47 m². Así mismo Infraestructura complementaria es de 38.61 m² (sala de uso múltiple, grupo electrógeno y bombas) como cerco perimétrico, veredas, tanque elevado, tratamiento de áreas verdes, cuneta, pista de estacionamiento. **COMPONENTE 2:** Adquisición de Equipamiento médico Adquisición de 43 mobiliarios para la unidad de administración, 19 mobiliarios, 07 equipos clínicos y 45 equipos biomédicos para la Unidad de Consultas Externas además 06 mobiliarios para la unidad de servicios generales, 03 mobiliarios para la Unidad Complementaria y 04 para otros (Autoclave, Grupo electrógeno, electrobomba, motor fuera de borda). **COMPONENTE 3:** Capacitación e mejoras de las capacidades de desempeño para la atención, administración y gestión de calidad. **Acción 1.-** Capacitación del personal en prioridades clínicas. Curso - Taller de capacitación en AEPI Clínico para 5 profesionales del CS (1 médicos, 1 obstetriz, 1 enfermera, 1 tec. en enfermería). Curso - Taller en AEPI Comunitario para 3 profesionales del establecimiento de salud (1 obstetriz, 1 enfermera, 1 técnicos en enfermería). **Acción 2.-** Capacitación del personal en habilidades y destrezas para la mejora de competencias. Curso - Taller en prevención en la Desnutrición Infantil (1 médico, 1 obstetriz, 1 enfermera, 1 técnicos en enfermería) en total 4 profesionales. Curso - Taller para el fortalecimiento de las habilidades y destrezas para el manejo del sistema informático, dirigido a 1 obstetriz, 1 enfermera, 1 técnicos en enfermería. En total 3 profesionales. Estas capacitaciones del personal de salud se llevaran acabo con tutores acreditados y con amplia experiencia regional. **COMPONENTE 4:** Capacitación a los representantes de la población con mayor participación en labores preventivos promocionales con participación del personal del Puesto de Salud **Acción 1:** Capacitación a las madres del comité de vaso de leche con participación del personal del C.S. Capacitación por personal del CS a 15 madres del Vaso de Leche a traves de Talleres participativos en temas de prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades diarreicas agudas y desnutrición infantil. **Acción 2:** Charlas mensuales de sensibilización a la población en temas relacionados al consumo de alcohol, enfermedades infectocontagiosas y enfermedades del sistema respiratorio. **Acción 3:** Capacitación a los promotores de las 15 comunidades. Capacitación por el personal del PS Coya a través de Talleres a 15 Promotores de salud en AEPI Comunitario, Nutrición, Enfermedades de Transmisión Sexual, con la finalidad de promover dentro de la comunidad la cultura de la salud preventiva . **Acción 4:** Elaboración de trípticos sobre desnutrición infantil.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

- El recorrido se hizo con el Gerente de Obras, quien manifestó conocer los detalles de la obra e hizo de guía; del componente 01 no se observa la Infraestructura complementaria (sala de uso múltiple, grupo electrógeno, bombas, sistema de alarmas).
- El componente 02 ADQUISICION DE MOBILIARIOS no se han completado en su totalidad; el componente 03 CAPACITACION y componente 04 EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y OTROS no se han realizado.
- El Gerente de Obras indica que a la fecha el supervisor y el residente de la obra no han entregado sus informes y valorizaciones en el presente año los cuales se derivan en la no elaboración y presentación de los informes trimestrales hacia FONIPREL; en tal sentido lo solicitaran notarialmente y cumplir según lo indicado en el convenio.
- Ante las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, remitirá de un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, tanto en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio, como en la remisión del informe de culminación correspondiente y los informes trimestrales faltantes.

g) MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. N° 50483 VIRGEN DEL CARMEN DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, REGIÓN CUSCO.

- El PIP consiste en la construcción de un módulo de material noble de dos pisos con 6 aulas, 5 SSHH, Biblioteca, Oficinas administrativas, losa deportiva, tanque elevado; así mismo la implementación de mobiliario, material didáctico y equipos de cómputo; además capacitación docente y a los padres de familia.
- El recorrido a las instalaciones de la entidad educativa I.E N°50843 se realizó con el ingeniero supervisor Cesar Jiménez Manrique y el Gerente de Infraestructura ingeniero Washington Yucra , observándose su ejecución física culminada; el componente de capacitación se encuentra en proceso; por lo cual el supervisor indica que ésta se encuentra en proceso de liquidación técnica-financiera y posteriormente presentación del informe de culminación.
- Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la Institución Educativa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

h) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50520 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACHAC, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI – CUSCO.

- Construcción de cuatro aulas, servicios higiénicos, tratamiento integral de áreas complementarias, construcción de patio de honor, mejoramiento de ambientes, construcción de cerco perimétrico con albañilería de adobe, y dotación de equipos y mobiliarios
- El recorrido a las instalaciones de la entidad educativa I.E N°50520 se realizó con el ingeniero supervisor Alberto Cusihualpa Sotaya y el Gerente de Infraestructura ingeniero Washington Yucra observándose su ejecución física casi culminarse; el componente de capacitación se encuentra en proceso; por lo cual el supervisor indica que ésta se encuentra en proceso de liquidación técnica-financiera y posteriormente presentación del informe de culminación.
- Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la Institución Educativa.

i) MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 50484 NIVEL PRIMARIO CCOLCA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO

- El PIP consiste en la construcción de un módulo de material noble de dos pisos con 6 aulas, 5 SSHH, Biblioteca, Oficinas administrativas, losa deportiva, tanque elevado; así mismo la implementación de mobiliario, material didáctico y equipos de cómputo; además capacitación docente y a los padres de familia construcción de cuatro aulas, servicios higiénicos, tratamiento integral de áreas complementarias, construcción de patio de honor, mejoramiento de ambientes, construcción de cerco perimétrico con albañilería de adobe, y dotación de equipos y mobiliarios.
- El recorrido a las instalaciones de la entidad educativa I.E N°50484 se realizó con el Gerente de Infraestructura ingeniero Washington Yucra observándose su ejecución física casi culminada; el componente de capacitación se encuentra en proceso; por lo cual el supervisor indica que ésta se encuentra en proceso de liquidación técnica-financiera y posteriormente presentación del informe de culminación.
- Al momento de la visita realizada se constató que la infraestructura educativa está actualmente en uso por los alumnos y profesores de la Institución Educativa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"


4. EJECUCIÓN FINANCIERA

El FONIPREL tiene como fuentes de financiamiento, las señaladas en el Artículo 6º de la Ley 29125, Ley que establece su implementación y funcionamiento, habiendo transferido a los GGLL y GGRR, a setiembre de 2014, por efectos de los seis primeros concursos, la suma de S/.60,001,842.28; habiéndose efectuado las transferencias conforme a una programación financiera presentada por el beneficiario a la firma del convenio, en el ámbito correspondiente a la Región de Cusco.

4.1 Ejecución financiera según fuente de financiamiento

Los PIP's objeto de las visitas de campo, alcanzan una inversión total de S/. 16,002,092.30, de los cuales estuvo programado ejecutar hasta la fecha la totalidad, sin embargo se ha ejecutado únicamente S/. 12, 389, 250,00 (77.42%), lo que constituye una limitada ejecución financiera. Del monto ejecutado, el 60.64% provienen de la fuente FONIPREL y el 39.36% de la fuente de los beneficiarios. En el gráfico N° 03 se presenta la información señalada.

Gráfico N° 03

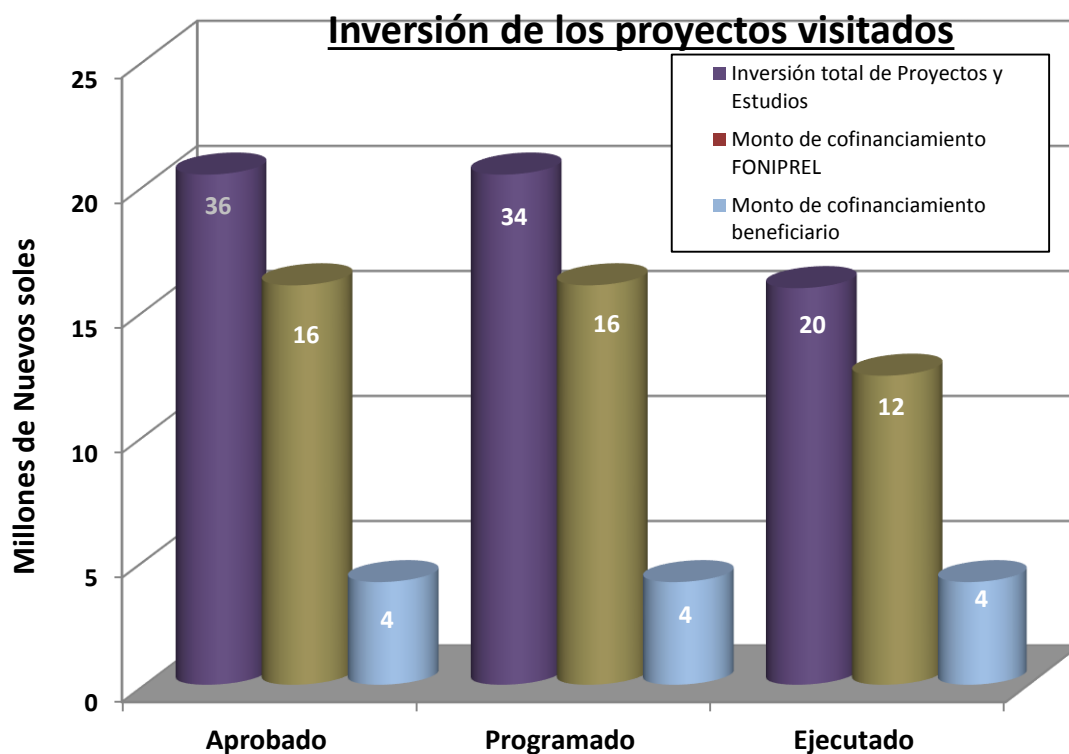



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

4.2 Avance financiero de cada proyecto visitado.

La ejecución financiera de cada uno de los proyectos visitados, presenta el estado situacional siguiente:

Cuadro Nº 06

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	DEL CONVENIO		DE LA INVERSIÓN		AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)
			INVERSIÓN TOTAL	COFINANC.	PROGRAM. AL 2014	EJECUTADA AL 2014	
1	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 50484 NIVEL PRIMARIO CCOLCA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO	4	S/. 539,345.00	S/. 458,443.00	S/. 539,345.00	S/. 458,442.00	85.00%
2	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE COYA, MICRORED PISAC - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO DISTRITO COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	5	S/. 1,787,826.00	S/. 1,251,477.00	S/. 1,787,826.00	S/. 1,249,481.00	69.89%
3	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANOQUITE-TIHUICTI, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO	5	S/. 2,073,677.20	S/. 1,762,625.62	S/. 2,073,677.20	S/. 1,791,876.00	86.41%
4	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUQUISQUE - HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO	5	S/. 5,482,545.51	S/. 4,660,163.68	S/. 5,482,545.51	S/. 4,710,476.00	85.92%
5	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. Nº 50483 VIRGEN DEL CARMEN DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, REGIÓN CUSCO	5	S/. 1,987,223.00	S/. 1,551,747.00	S/. 1,987,223.00	S/. 1,551,562.00	78.08%
6	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 50100 LA NAVAL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	5	S/. 2,329,693.00	S/. 1,630,785.00	S/. 2,329,693.00	S/. 1,620,378.00	69.55%
7	MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 50362 DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO-PROVINCIA DE PARURO	6	S/. 1,844,790.00	S/. 1,475,832.00	S/. 1,844,790.00	S/. 1,475,831.00	80.00%
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50520 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACHAC, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO	6	S/. 2,098,670.00	S/. 1,574,002.00	S/. 2,098,670.00	S/. 1,574,002.00	75.00%
9	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50006 JORGE LUIS NAVARRETE EN LA URB. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	6	S/. 2,286,730.00	S/. 1,637,017.00	S/. 1,986,730.00	S/. 1,457,001.00	73.34%
TOTAL			S/. 20,430,499.71	S/. 16,002,092.30	S/. 20,130,499.71	S/. 15,889,049.00	78.93%
AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)						1	80.00%
						2	87.50%



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

A continuación mencionamos algunos comentarios del avance financiero observado en la visita a los siguientes proyectos:

- En General 07 proyectos visitados tienen un avance financiero por debajo de lo programado, sobretodo en el cumplimiento de la contrapartida de los beneficiarios.
- Los proyectos visitados tienen un nivel de cumplimiento de su contrapartida que va del 0% al que cuentan con una ejecución de contrapartida al 90%.

5. PRINCIPALES LOGROS

- 02 PIP visitados se encuentran por culminados.
- 01 PIP Mejoramiento del Logro de Aprendizaje en los alumnos del Nivel Primario de la I.E. N 50362 de Pillpinto, Distrito de Pillpinto-Provincia de Paruro fue visitado externamente; observándose un avance físico cercano al 100 %.
- 22.446 Km, entre Yaurisque-Huanoquite de camino mejorado.
- 05 colegios visitados se encuentran funcionamiento y con población escolar matriculada.
 - 1) MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 50484 NIVEL PRIMARIO CCOLCA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI – CUSCO.
 - 2) MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. N° 50483 VIRGEN DEL CARMEN DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, REGIÓN CUSCO.
 - 3) MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 50362 DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO-PROVINCIA DE PARURO.
 - 4) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50520 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACHAC, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI – CUSCO.
 - 5) MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50006 JORGE LUIS NAVARRETE EN LA URB. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO – CUSCO.
- EI PUESTO DE SALUD DE COYA, MICRORED PISAC - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE - DIRESA DISTRITO COYA, se encuentra en funcionamiento y con atención pública.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

6. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS

- Los procesos de adjudicación para los expedientes técnicos y obras han iniciado con mucho retraso y la materialización de los contratos han tomado más tiempo de lo previsto.
- Demora en la elaboración del expediente técnico por parte del consultor.
- Demora en la adquisición de materiales para los casos de ejecución por administración Directa.
- Los fenómenos climáticos adversos como las lluvias han originado paralizaciones de obra por la imposibilidad de trasladar materiales y realizar las actividades inherentes a la obra.
- De 09 proyectos visitados 06 cuentan con informe de consistencia; y 02 proyecto ha realizado modificaciones sin informar de ello a la OPI institucional.
- Adecuada información documentada en los municipios visitados, donde 7 tienen sus informes completos.

7. CONCLUSIONES

- El FONIPREL se encuentra cofinanciando la ejecución de 30 PIP/estudios, en la Región Cusco seleccionados en la cuarta, quinta y sexta Convocatoria.
- El importe del cofinanciamiento otorgado por el FONIPREL en las seis primeras convocatorias asciende a S/. 63,813,888.28 millones, de los cuales se han transferido a los GGRR y GLL, el 100%.
- De los 09 PIP visitados, dos proyectos, están concluidos en su ejecución física, sin embargo hasta la fecha no han presentado el informe de culminación correspondiente.
- De los 09 proyectos visitados, se ha ejecutado un promedio del 90% del presupuesto total aprobado.

8. PANEL FOTOGRÁFICO

Ver Anexo 1

Lima, Octubre de 2014

Alex Rios Navarro
Analista FONIPREL

ar/,jq//EDC



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

ANEXO N° 01

PANEL FOTOGRÁFICO DE OBRAS

1. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA			
REGIÓN: CUSCO	PROVINCIA: ANTA	DISTRITO: ANTA	LOCALIDAD: ANTA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50100 LA NAVAL, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA – CUSCO"			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 2,329,693.00	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 1,630,785.00
CODIGO SNIP:	175643		



Vista del ingreso Principal de la
Entidad Educativa N°50100



Vista Panorámica dentro de la
Entidad Educativa N°50100



Vista del pabellón ejecutado



Vista del interior de laboratorio
Nivel Secundaria -Segundo Piso



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

2. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO			
REGIÓN: CUSCO	PROVINCIA: CUSCO	DISTRITO: SANTIAGO	LOCALIDAD: SANTIAGO
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50006 JORGE LUÍS NAVARRETE EN LA URBANIZACIÓN AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL CUSCO"			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 2,286,730,00	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 1,637,017,00
CODIGO SNIP:	175643		



Vista frontal del ingreso de la
Entidad Educativa N°50100



Vista principal del ingreso,
Pabellón ejecutado



Vista frontal de la Rampa – Puente
Biblioteca - Aulas



Vista frontal de Pabellón de aulas
Nivel Primario



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

3. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLPINTO			
REGIÓN: CUSCO	PROVINCIA: PARURO	DISTRITO: PILLPINTO	LOCALIDAD: PILLPINTO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 50362 DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO, PROVINCIA DE PARURO – CUSCO "			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 1,844,790.00	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 1,475,832.00
CODIGO SNIP:	140961		



Vista del ingreso principal a la Entidad
Educativa N°50362
Nivel Primario



Patio de Honor – Cerco perimétrico



Vista frontal del pabellón ejecutado
Nivel primario



Veredas, escalera y paso a desnivel



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

4. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE			
REGIÓN: CUSCO	PROVINCIA: PARURO	DISTRITO: HUANOQUITE	LOCALIDAD: HUANOQUITE - TIHUCTI
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANOQUITE – TIHUCTI, DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA DE PARURO – CUSCO"			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 2,073,677.20	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/.1,762,652.62
CODIGO SNIP:	158377		



Captación de agua



Válvula de control y registro



Válvula de purga y control de presión



Caja de derivación del agua



Vista del tanque Inhoff - Sedimentación



Vista del proceso de sedimentación



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE			
REGIÓN: CUSCO	PROVINCIA: PARURO	DISTRITO: HUANOQUITE	LOCALIDAD: HUANOQUITE - YAURISQUE
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE - HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA DE PARURO – CUSCO".			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 5,482,545.51	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 4,660,163.68
CODIGO SNIP:	167783		



Cruce para línea de alcantarillado



Vista panorámica de muro de contención



Alcantarilla de alivio



Transitabilidad sobre la vía ejecutada



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

6. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA			
REGIÓN: CUSCO	PROVINCIA: CALCA	DISTRITO: COYA	LOCALIDAD: COYA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL PUESTO DE SALUD DE COYA, MICRORED PISAC – RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE – DIRESA CUSCO, DISTRITO COYA, PROVINCIA DE CALCA – CUSCO"			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 1,787,826.00	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 1,251,477.00
CODIGO SNIP:	177306		



Vista frontal del Puesto de Salud



Vista interior del Puesto de Salud



Vista superior del Puesto de Salud



Vista posterior y puerta-cerco metálico



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de EconomíaDirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
 "AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

7. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA			
REGIÓN: CUSCO	PROVINCIA: QUISPICANCHIS	DISTRITO: QUIQUIJANA	LOCALIDAD: QUIQUIJANA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50483 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI – CUSCO"			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 1,987,223.00	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 1,551,747.00
CODIGO SNIP:	189311		



Vista frontal del IE N° 50483
Virgen del Carmen



Vista del Pabellón ejecutado

8. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA			
REGIÓN: CUSCO	PROVINCIA: QUISPICANCHIS	DISTRITO: QUIQUIJANA	LOCALIDAD: QUIQUIJANA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50484 NIVEL PRIMARIO CCOLCA DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI – CUSCO"			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 539,345.00	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 458,533.00
CODIGO SNIP:	189311		



Pabellón ejecutado frontal del IE N° 50484
Nivel primario Ccolca



Vista de los servicios higiénicos



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

9. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA			
REGIÓN: CUSCO	PROVINCIA: QUISPICANCHIS	DISTRITO: QUIQUIJANA	LOCALIDAD: QUIQUIJANA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 50520 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SACHAC, DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI – CUSCO"			
MONTO DE INVERSIÓN:	S/. 52,098,670,.00	COFINANCIAMIENTO FONIPREL:	S/. 1,574,002.00
CODIGO SNIP:	198108		



Pabellón ejecutado frontal del
IE N° 50520



Vista del comedor - cocina



Vista del centro de cómputo



Vista de salón de clases
