

**FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
REGIONAL Y LOCAL**

**Secretaria Técnica**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

**JUNÍN (TARMA & CHANCHAMAYO)  
VISITA DE CAMPO SETIEMBRE 2014**

**Lima, Octubre de 2014**



## FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL FONIPREL

### INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS– VISTAS DE CAMPO - AYACUCHO

#### 1. ANTECEDENTES

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, a Setiembre de del 2014, ha realizado 09 Concursos para el Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública y Estudios de Preinversión.

En el siguiente cuadro se detalla información referida a las propuestas seleccionadas en los nueve concursos

Cuadro N° 01  
**PROPUESTAS SELECCIONADAS EN LOS CONCURSOS FONIPREL**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE TRANSFERENCIA
1ER. CONCURSO	372	376 779 924,00	375 822 955,00	D.S. N° 116-2008-EF
				D.S. N° 062-2009-EF
				D.S. N° 111-2010-EF
2DO. CONCURSO	265	294 685 998,00	293 843 755,00	D.S. N° 089-2009-EF
				D.S. N° 144-2010-EF
3ER. CONCURSO	181	268 895 903 ,00	254 390 739,00	D.S. N° 068-2010-EF
4TO. CONCURSO	206	273 106 889,00	145 304 526,00	D.S. N° 205-2010-EF
5TO. CONCURSO	266	462,049,961.96	455,018,676.00	D.S. N° 211-2011-EF
				D.S. N° 083-2012-EF
				D.S. N° 102-2013-EF
6TO. CONCURSO	96	141,568,993.96	141,522,217.00	D.S. N° 179-2012-EF
				D.S. N° 124-2013-EF
7MO. CONCURSO	161	193,688,812.67	190,980,151.00	D.S. N° 250-2013-EF
				D.S. N° 043-2014-EF
8VO. CONCURSO	386	603,793,235.16	581,537,849.00	D.S. N° 036-2014-EF
9NO. CONCURSO	454	827,064,730.54	237,690,761.00	D.S. N° 278-2014-EF
<b>TOTAL</b>	<b>2387</b>	<b>2,228,165,734.29</b>	<b>1,606,749,654.00</b>	

Las propuestas seleccionadas en el departamento de Junín, en los nueve concursos, representan 166 propuestas entre proyectos y estudios; de los cuales se ha aprobado un cofinanciamiento por parte de FONIPREL S/. 234 518 002,93 (Doscientos Treinta y Cuatro Millones Quinientos Dieciocho Mil dos y 93/100 Nuevos Soles). Actualizado al tercer trimestre del presente, se ha realizado una trasferencia de S/. 197 605 967,16 (Ciento Noventa y Siete Millones Seiscientos Cinco Mil Novecientos Sesenta y Siete con 16/100 Nuevos Soles), se muestra a detalle por convocatoria en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 2

**PROPUESTAS SELECCIONADAS - JUNIN**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENT O (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)
1ER. CONCURSO	21	19,825,800.39	19,825,800.39
2DO. CONCURSO	23	26,182,511.35	26,182,511.35
3ER. CONCURSO	12	24,345,986.00	24,345,986.00
4TO. CONCURSO	12	22,597,023.00	22,597,023.00
5TO. CONCURSO	20	31,520,535.60	31,484,535.60
6TO. CONCURSO	6	5,371,165.40	5,371,165.40
7MO. CONCURSO	14	12,697,279.94	12,697,279.94
8VO. CONCURSO	32	50,193,442.48	50,193,442.48
9NO. CONCURSO	26	41,784,258.77	4,908,223.00
<b>TOTAL</b>	<b>166</b>	<b>234,518,002.93</b>	<b>197,605,967.16</b>

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

El seguimiento a los proyectos de inversión pública (PIP) seleccionados en las convocatorias realizadas por el FONIPREL, se realizó con el objetivo de conocer su estado situacional, en relación al cumplimiento de las metas establecidas, plazos fijados y recursos asignados, a fin de tomar las acciones necesarias para superar las deficiencias que pudieran haberse producido.

La información que se presenta tiene como fuente: i) los informes trimestrales a setiembre 2014, presentados por las entidades visitadas del primer, segundo, tercer, quinta y sexto Concurso FONIPREL; y ii) las visitas in situ y reuniones personalizadas sostenidas con los beneficiarios en la semana del 22 al 26 de setiembre del presente.

En la región Junín se aprobaron hasta el noveno concurso, la elaboración / ejecución de 166 propuestas, de las cuales se han visitado 06 (3.61%).

Cuadro N° 3

**PROYECTOS VISITADOS – JUNÍN (Tarma - Chanchamayo)**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENT O (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	MONTO EJECUTADO (S/.)
1ER. CONCURSO	1	2,038,197.60	2,038,197.60	2,038,197.60
2DO. CONCURSO	4	2,594,510.08	2,594,510.08	2,592,511.45
4TO. CONCURSO	1	3,253,369.00	3,253,369.00	1,749,864.51
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>7,886,076.68</b>	<b>7,886,076.68</b>	<b>6,380,573.56</b>

Los proyectos y estudios visitados (06), en lo referido al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de cofinanciamiento que a continuación se presentan el nivel que se indica en el Gráfico N° 1.



Ministerio  
de Economía y Finanzas


Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública


"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

1. El expediente técnico, tiene Resolución de aprobación
2. El estudio definitivo tiene informe de consistencia
3. Los cronogramas de ejecución física y financiera están actualizados
4. El beneficiario ha presentado sus informes trimestrales
5. El proyecto tiene variación de metas adecuadas a las normas SNIP (Para proyectos SNIP) o cuenta con aprobación del Órgano Resolutivo (Para proyectos no SNIP)
6. El beneficiario está registrado como Unidad Ejecutora en el Banco de Proyectos.
7. Tiene Acreditada la supervisión del proyecto en ejecución.
8. El beneficiario aporta su contrapartida de manera adecuada.

**GRÁFICO N° 1**  
**NIVEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO**  
**EN PROYECTOS VISITADOS – JUNÍN (Tarma & Chanchamayo)**

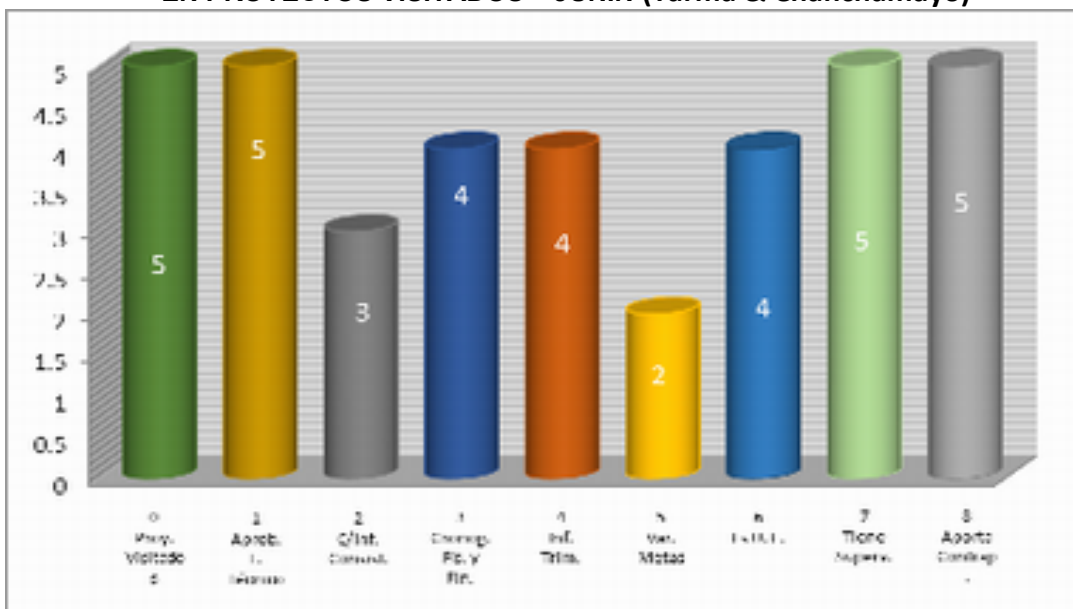

**GRÁFICO N° 2**  
**NIVEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO**  
**EN ESTUDIOS VISITADOS – JUNÍN (Tarma & Chanchamayo)**

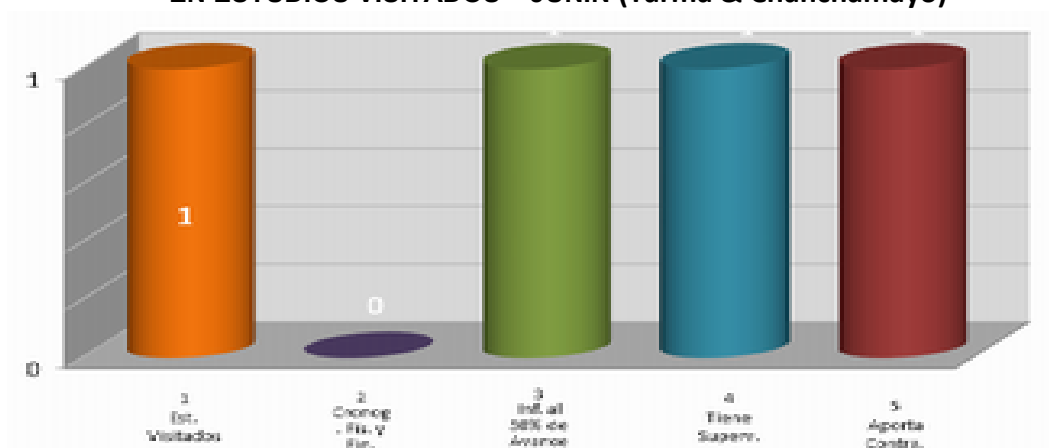


### 3. EJECUCIÓN FÍSICA

#### 3.1 Avance físico, según tipo de propuesta

Los 05 proyectos y 01 Estudio de Inversión Pública visitados en la región Junín, presentan el avance físico global, siguiente:

**Gráfico N° 03**

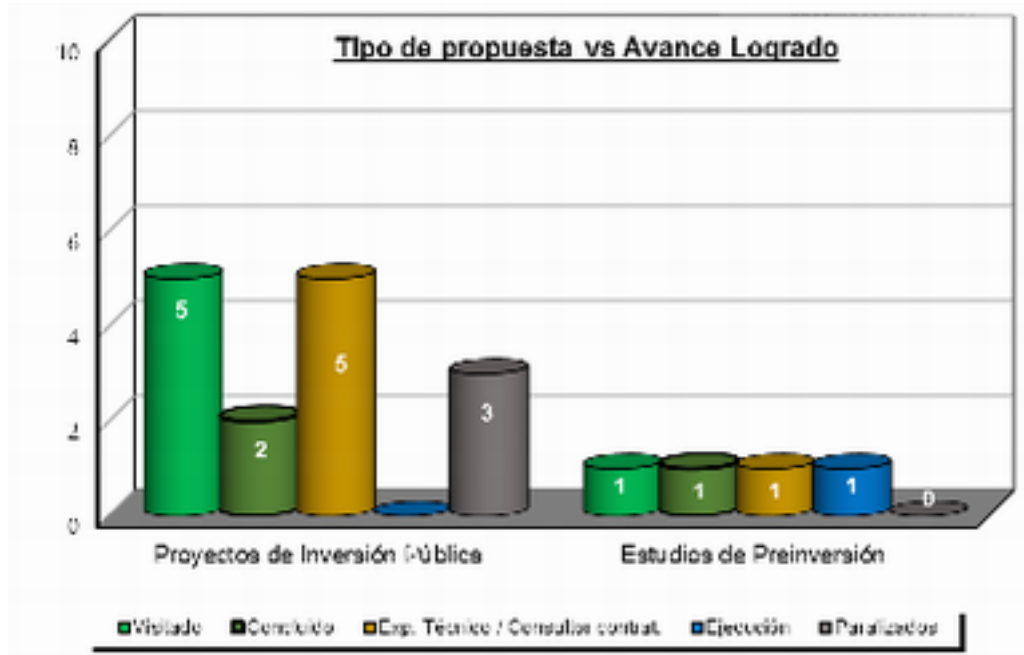

De los 06 Proyectos / Estudios de Inversión Pública visitados 03 han concluido, ninguno de ellos se encuentra en ejecución, y 03 están pendiente de reinicio. Sin embargo, en todos ellos están pendiente los informes de culminación, estando 01 proyecto y 01 estudio con informes de culminación observados.

#### 3.2 Avance físico de cada proyecto visitado

La ejecución física de cada uno de los proyectos / Estudios, visitados, presenta el estado situacional siguiente: 02 Proyectos de Inversión Pública se encuentran culminados y 03 PIP se encuentran paralizados su ejecución. En el siguiente cuadro se puede observar el avance físico por cada PIP.

**Cuadro N° 04**

**AVANCE FÍSICO DE CADA PROYECTOS VISITADOS – AYACUCHO (Norte –Centro)**

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	POR INICIAR	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO SEGÚN ETAPA DE EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)
				EN EXP. TÉCNICO	EN EJECUCIÓN	PARALIZADOS	TERMINADA	



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

1	MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, SAN JUAN PUERTO UBIRIKI - LOS ANGELES - PUEBLO LIBRE - CERRO MONO - SANTA ROSA DE ALTO UBIRIKI	1				1		70%
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALTO YURINAKI - SAN JUAN 71 - ALTO CHINCARMAS - ALTO LA FLORIDA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	2				1		60%
3	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERAS DE INTEGRACION TRAMOS: I CARRETERA CENTRAL HACIA CHINCANA - CURVA SAN JACINTO, II CARRETERA CHINCANA - UNION ASOCIADOS, III CARRETERA UNION ASOCIADOS - SAN PEDRO DE CAÑAVERAL - AMABLE MARIA, DIST. SAN RAMON	2					1	100%
4	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.I. NARANJAL - SAN RAMON - CHANCHAMAYO - JUNIN	2					1	100%
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUARACAYO, PROVINCIA DE TARMA- JUNIN	2					1	100%
6	MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES DE LA CUENCA ANASHIRONA MARGEN IZQUIERDA - PERENÉ, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	4				1		40%
TOTAL					1		7	
AVANCE FISICO PORCENTUAL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)		1						70.00%
		2						80.00%
		4						40.00%

A continuación mencionamos algunos comentarios de lo observado en la visita a los siguientes proyectos:

a) MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, SAN JUAN PUERTO UBIRIKI - LOS ANGELES - PUEBLO LIBRE - CERRO MONO - SANTA ROSA DE ALTO UBIRIKI.

- El Proyecto, de acuerdo al perfil, contempla el mejoramiento de 26.750 km. de carretera a nivel de afirmado, ampliación del ancho de sección de vía a 3.50 m. en tramos críticos, disminución de pendientes máximas, construcción de plazoletas de cruce, ampliación de radios de curvas, colocación de una capa de afirmado en un ancho de 3.50 m. y 25 cm. de espesor, nivelación y compactación de la sub-rasante, construcción de cunetas a lo largo del tramo, construcción de 100 alcantarillas TMC, 4 badenes de concreto, 9 muros seco, 3 pontones y 2 puentes.
- En la visita de Campo se ha verificado que la obras de arte, drenaje y la plataforma de la vía se encuentran totalmente deteriorados, no permitiéndose identificar si hubo intervención con el proyecto, debido a la presencia de vegetación en las cunetas y varios tramos de la calzada, asimismo por la presencia de flujos de escorrentía que vienen ocasionando cárcavas y erosión de la plataforma.
- Se remitirá un oficio solicitando al beneficiario comunicando las recomendaciones formuladas y la presentación de los informes pendientes de entrega.



b) MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALTO YURINAKI - SAN JUAN 71 - ALTO CHINCARMAS - ALTO LA FLORIDA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN.

- El Proyecto de acuerdo al perfil, contempla el mejoramiento de 20.100 km. de carretera a nivel afirmado, ampliación del ancho de sección de la vía a 3.50 m. en los tramos críticos, disminución de pendientes máximas, construcción de plazoletas de cruce, ampliación de radios de curvas, colocación de una capa de afirmado en un ancho de 3.50 m. y 20 cm. de espesor, nivelación y compactación de la sub-rasante, construcción de cunetas a lo largo del tramo, construcción de 60 alcantarillas TMC, 6 badenes de concreto, 2 muros de concreto y 1 pontón de 3 m.
- En la visita de Campo se ha verificado que la obras de arte, drenaje y la plataforma de la vía se encuentran totalmente deteriorados, no permitiéndose identificar si hubo intervención con el proyecto, debido a la presencia de vegetación en las cunetas y varios tramos de la calzada, asimismo por la presencia de flujos de escorrentía que vienen ocasionando cárcavas y erosión de la plataforma.
- Se remitirá un oficio solicitando al beneficiario comunicando las recomendaciones formuladas y la presentación de los informes pendientes de entrega.

d) MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES DE LA CUENCA ANASHIRONA MARGEN IZQUIERDA - PERENÉ, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNÍN.

- El Proyecto de acuerdo al perfil, contempla el Mejoramiento a nivel de afirmado de 7.800 km. de 2 carriles de 5.50 m de ancho de calzada y 0.25 m de espesor de afirmado; y Mejoramiento a nivel de afirmado de 19.750 km de 1 carril de 3.50 m de sección de vía y 0.25 m de espesor de afirmado con plazoletas de cruce cada 500 - 1,000 m; Construcción de 108 Alcantarillas TMC y 21 Badenes de Concreto.
- En la visita de Campo se ha verificado que la obras de arte, drenaje y la plataforma de la vía se encuentran totalmente deteriorados, no permitiéndose identificar si hubo intervención con el proyecto, debido a la presencia de vegetación en las cunetas y varios tramos de la calzada, asimismo por la presencia de flujos de escorrentía que vienen ocasionando cárcavas y erosión de la plataforma.
- El Proyecto tiene suspendidos los recursos asignados por el FONIPREL por incumplimiento en la entrega de informes trimestrales.
- Se remitirá un oficio solicitando al beneficiario comunicando las recomendaciones formuladas y la presentación de los informes pendientes de entrega.



d) MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERAS DE INTEGRACION TRAMOS: I CARRETERA CENTRAL HACIA CHINCANA - CURVA SAN JACINTO, II CARRETERA CHINCANA - UNION ASOCIADOS, III CARRETERA UNION ASOCIADOS - SAN PEDRO DE CAÑAVERAL - AMABLE MARIA, DIST. SAN RAMON.

- El Estudio se encuentra concluido habiendo sido reformulado y modificado conforme se evidencia en el PIP de código SNIP N° 139804.
- Anteriormente con fecha 03/08/2010 se había viabilizado el PIP el cual fue deshabilitado conforme al Oficio N° 012-2014-OPI-MPCH de fecha 28/02/2014, siendo nuevamente viabilizado con fecha 25/03/2014 y comunicándose su viabilidad con fecha 24/04/2014 mediante Oficio N° 017-2014-OPI/MPCH. Por tanto el estudio se encuentra concluido.
- Queda pendiente la presentación del informe de culminación.
- Se remitirá un oficio solicitando al beneficiario comunicando las recomendaciones formuladas y la presentación de los informes pendientes de entrega.

e) SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.I. NARANJAL - SAN RAMON - CHANCHAMAYO - JUNIN.

- El Proyecto de acuerdo al perfil, contempla la sustitución de 05 aulas y la construcción de ambientes complementarios, así como la rehabilitación de 06 aulas con cobertura liviana de calamina; disponibilidad de mobiliario y equipo.
- Al momento de la visita de campo, se encontró que la infraestructura estaba en uso pleno por parte de los alumnos y profesores de la Institución Educativa.
- La obra se encuentra totalmente concluida, sin embargo se encuentra observado el informe de culminación.
- Además, se ha observado deficiencias en los SS.HH alumnos (Varones y Mujeres) debido a la falta de mantenimiento y uso adecuado por parte de los alumnos.
- Se remitirá un oficio solicitando al beneficiario comunicando las recomendaciones formuladas y la presentación de los informes pendientes de entrega.

f) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUARACAYO, PROVINCIA DE TARMA-JUNIN.

- El Proyecto de acuerdo al perfil, contempla para el sistema de agua potable: Mejoramiento de las captaciones existentes, construcción de una nueva



captación en Quiulicocha, mejoramiento de línea de conducción en Buenos Aires instalación y ampliación de líneas de conducción. construcción de reservorio de 10 m3, conexiones domiciliarias, etc. Para el sistema de alcantarillado: Mejoramiento y ampliación de red colectora primaria y secundaria. buzones, planta de tratamiento con tanque IMHOFF, conexiones domiciliarias, letrinas de Hoyo Seco, Capacitación.

- Al momento de la visita de campo, se encontró que la infraestructura estaba en uso pleno verificándose el cumplimiento en la ejecución de los elementos del sistema tanto de agua potable como alcantarillado, haciéndose un recorrido por todo la red y verificándose las conexiones domiciliarias, se tuvo mayor énfasis en la construcción de buzones, reservorio y planta de tratamiento de aguas residuales.
- La obra se encuentra totalmente concluida, quedando pendiente la presentación del informe de culminación.

#### 4. EJECUCIÓN FINANCIERA


El FONIPREL tiene como fuentes de financiamiento, las señaladas en el Artículo 6° de la Ley 29125, Ley que establece su implementación y funcionamiento, habiendo transferido a los GGLL y GGRR, a setiembre de 2014, por efectos de los nueve primeros concursos, la suma de S/. 234 518 002,93; habiéndose efectuado las transferencias conforme a una programación financiera presentada por el beneficiario a la firma del convenio, en el ámbito correspondiente a la Región Junín.

##### 4.1 Ejecución financiera según fuente de financiamiento

Los PIP objeto de las visitas de campo, alcanzan una inversión total de S/. 10 770 816,04 nuevos soles, de los cuales estuvo programado ejecutar hasta la fecha la totalidad. Se ha logrado una ejecución financiera de S/. 9 725 011.75 nuevos soles (90.29%), del monto ejecutado, el 65.6% provienen de la fuente FONIPREL y el 34.4% de la fuente de los beneficiarios. En el gráfico N° 03 se presenta la información señalada.

**Gráfico N° 03**

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

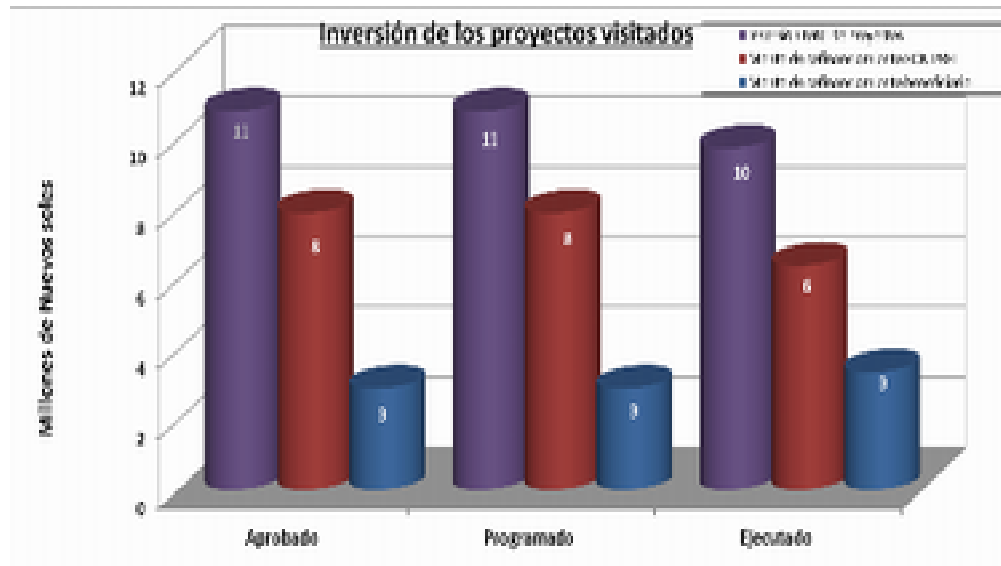

#### 4.2 Avance financiero de cada proyecto visitado.

La ejecución financiera de cada uno de los proyectos visitados, presenta el estado situacional siguiente:

**Cuadro N° 06**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	DEL CONVENIO	DE LA INVERSIÓN		AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)
			INVERSIÓN TOTAL	PROGRAM. A SETIEMBRE 2014	EJECUTADA A SETIEMBRE 2014	
1	MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, SAN JUAN PUERTO UBIRIKI - LOS ANGELES - PUEBLO LIBRE - CERRO MONO - SANTA ROSA DE ALTO UBIRIKI	1	2,547,747.00	2,547,747.00	3,157,820.00	123.95%
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALTO YURINAKI - SAN JUAN 71 - ALTO CHINCARMAS - ALTO LA FLORIDA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	2	1,703,210.00	1,703,210.00	1,805,194.00	105.99%
3	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERAS DE INTEGRACION TRAMOS: I CARRETERA CENTRAL HACIA CHINCANA - CURVA SAN JACINTO, II CARRETERA CHINCANA - UNION ASOCIADOS, III CARRETERA UNION ASOCIADOS - SAN PEDRO DE CAÑAVERAL - AMABLE MARIA, DIST. SAN RAMON	2	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00%
4	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.I. NARANJAL - SAN RAMON - CHANCHAMAYO - JUNIN	2	893,607.04	893,607.04	914,392.00	102.33%
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUARACAYO, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	2	1,750,758.00	1,750,758.00	1,922,506.75	109.81%
6	MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES DE LA CUENCA ANASHIRONA MARGEN IZQUIERDA - PERENÉ, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	4	3,827,494.00	3,827,494.00	1,877,099.00	49.04%
<b>TOTAL</b>			<b>10,770,816.04</b>	<b>10,770,816.04</b>	<b>9,725,011.75</b>	<b>90.29%</b>
AVANCE FINANCIERO PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (S/.)			1		S/. 3,157,820.00	



	2	S/. 1,172,523.19
	4	S/. 1,877,099.00

A continuación mencionamos algunos comentarios del avance financiero observado en la visita a los siguientes proyectos:

- En General todos los proyectos visitados tienen un avance financiero ligeramente por encima de lo programado, que viene a ser 108.42%, con excepción del PIP "Mejoramiento caminos vecinales de la cuenca Anashirona margen izquierda - Perené, provincia de Chanchamayo – Junín que está por debajo del 50% debido a la suspensión temporal de uso de los recursos del FONIPREL.
- Los proyectos visitados tienen un nivel de cumplimiento de su contrapartida superior al programado de haciendo un promedio de cofinanciamiento de 115.94% por parte de los beneficiarios.

## 5. PRINCIPALES LOGROS

- 02 PIP y 01 Estudio visitados se encuentran culminados.
- 05 aulas construidas y 06 aulas mejoradas.
- Salas de cómputo y laboratorios equipados
- 01 reservorio construido
- 01 Plantas de tratamiento de aguas residuales construidos
- conexiones domiciliarias de agua potable
- conexiones domiciliarias de desagüe.

## 6. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS

- Incumplimiento mayoritario de la normatividad del SNIP para la ejecución de proyectos, es así que de 06 proyectos visitados 04 no cuentan con informe de consistencia, pese a estar obligados por la vigencia de la Directiva a partir de febrero del 2009; y 03 proyectos han realizado modificaciones sin informar de ello a la OPI institucional; asimismo 03 de ellos se encuentran paralizados sin preverse la culminación del PIP.
- Escasa información documentada en los municipios visitados, sólo dos tiene sus informes completos.
- Hay siete proyectos concluidos, sin embargo tres convenios no han remitido a la Secretaría Técnica de FONIPREL.
- De los otros cuatro convenios concluidos, los informes de culminación se encuentran observados.

## 7. CONCLUSIONES



Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

- El FONIPREL se encuentra cofinanciando la ejecución / elaboración de 409 PIP/estudios, en la Región Ayacucho seleccionados hasta la novena Convocatoria.
- El importe del cofinanciamiento otorgado por el FONIPREL en las nueve convocatorias asciende a S/. 281,006 millones, de los cuales se han transferido a los GGRR y GGLL, el 86%.
- De los ocho PIPs visitados, siete proyectos, han concluido su ejecución física, sin embargo hasta la fecha se encuentran observados sus informes de culminación de cuatro proyectos y se encuentran omisas de presentación de tres proyectos.
- Los 08 PIP, se ha ejecutado el 145.25% del presupuesto total aprobado, de los cuales, desagregando por fuente de financiamiento, el 98.86% del presupuesto comprometido por FONIPREL está ejecutado y el 145.58% de la contrapartida comprometida ha sido ejecutada hasta la fecha.

## 8. PANEL FOTOGRÁFICO

Ver Anexo 1

Lima, octubre de 2014

---

Vladimir Cacñahuaray Consa  
Analista FONIPREL

pc/jq/EDC

## ANEXO Nº 01

### PANEL FOTOGRÁFICO

<p>1. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL</p> <p>REGIÓN: JUNÍN PROVINCIA: CHANCHAMAYO</p>	
	
<p>Plataforma con ahuellamiento excesivo, pérdida de bombeo de la calzada.</p>	<p>Talud del terraplén es a la vez talud de corte en vía en desarrollo, compuesto con material de relleno suelto propio de las explanaciones, taludes inestables que se deslizan a la calzada ante la presencia de sismos o precipitaciones pluviales.</p>




Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

2. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
REGIÓN: JUNÍN PROVINCIA: CHANCHAMAYO  
OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALTO YU

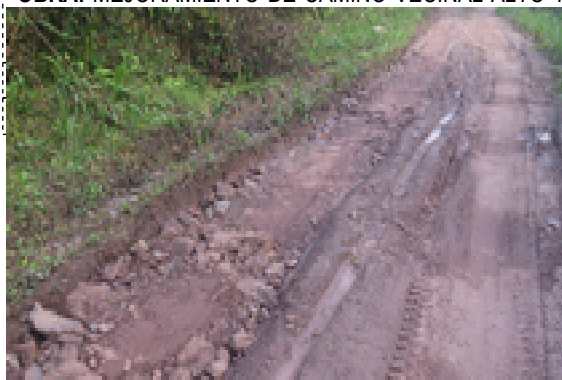



Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

3. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
REGIÓN: JUNÍN PROVINCIA: CHANCHAMAYO



Baches y hundimiento de la plataforma donde requiere implementar estructura de drenaje para su evacuación

Ancho de calzada no cumple con el mínimo solicitado, por el PIP viable, se aprecia baches continuos, ahuellamientos en gran parte de la vía.



Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

4. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
REGIÓN: JUNÍN PROVINCIA: Tarma







Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "

5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
REGIÓN: JUNÍN PROVINCIA: CHANCHAMAYO D  
OBRA: SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS Y AM

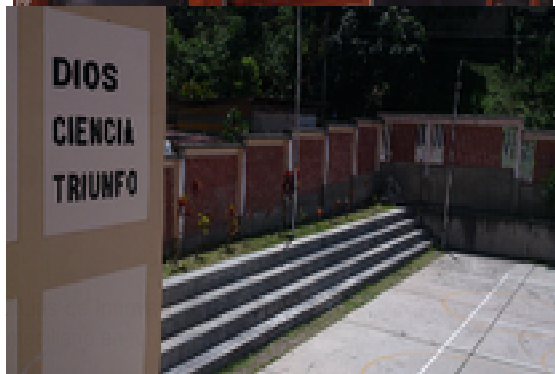



Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "



AL DE SAN RAMON

**DISTRITO:** SAN RAMÓN

**LOCALIDAD:** VARIOS

ARRETERAS DE INTEGRACION TRAMOS: I CARRETERA  
, II CARRETERA CHINCANA - UNION ASOCIADOS, III  
AVERAL - AMABLE MARIA, DIST. SAN RAMON

**COFINANCIAMIENTO FONIPREL:** S/. 31,200.00

Estudio de Preinversión concluido y con registro en Banco de  
Proyectos estando a la fecha en situación de Activo – Viable.



Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO "
