

# **FONIPREL**

**FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
REGIONAL Y LOCAL**

**Secretaria Técnica**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

**PIURA**

**VISITAS DE CAMPO SETIEMBRE 2014**

**(Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Convocatoria)**

**Lima, Octubre de 2014**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

## FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL FONIPREL

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS– VISTAS DE CAMPO – - PIURA  
(Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Convocatoria)

### 1. ANTECEDENTES

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, a octubre de 2014, ha realizado 09 Concursos para el Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública y Estudios de Preinversión.

En el siguiente cuadro se detalla información referida a las propuestas seleccionadas en los nueve concursos

**CUADRO Nº 01**

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE TRANSFERENCIA
1ER. CONCURSO	372	376 779 924,00	375 822 955,00	D.S. Nº 116-2008-EF
				D.S. Nº 062-2009-EF
				D.S. Nº 111-2010-EF
2DO. CONCURSO	265	294 685 998,00	293 843 755,00	D.S. Nº 089-2009-EF
				D.S. Nº 144-2010-EF
3ER. CONCURSO	181	268 895 903 ,00	254 390 739,00	D.S. Nº 068-2010-EF
4TO. CONCURSO	206	273 106 889,00	145 304 526,00	D.S. Nº 205-2010-EF
5TO. CONCURSO	266	462,049,961.96	455,018,676.00	D.S. Nº 211-2011-EF
				D.S. Nº 083-2012-EF
				D.S. Nº 102-2013-EF
6TO. CONCURSO	96	141,568,993.96	141,522,217.00	D.S. Nº 179-2012-EF
				D.S. Nº 124-2013-EF
7MO. CONCURSO	161	193,688,812.67	190,980,151.00	D.S. Nº 250-2013-EF
				D.S. Nº 043-2014-EF
8VO. CONCURSO	386	603,793,235.16	581,537,849.00	D.S. Nº 036-2014-EF
9NO. CONCURSO	454	827,064,730.54	237,690,761.00	D.S. Nº 278-2014-EF
<b>TOTAL</b>	<b>2387</b>	<b>2,228,165,734.29</b>	<b>1,606,749,654.00</b>	



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

Las propuestas seleccionadas en el departamento de Piura, en los nueve concursos, se muestra en el siguiente cuadro:

## CUADRO Nº 2

### PROPUESTAS SELECCIONADAS – PIURA

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)
1ER. CONCURSO	34	47,983,130.55	47,896,999.00
2DO. CONCURSO	21	44,786,784.18	36,709,636.00
3ER. CONCURSO	14	29,692,868.00	29,692,868.00
4TO. CONCURSO	20	28,123,220.00	24,471,109.00
5TO. CONCURSO	19	25,642,723.17	25,642,723.17
6TO. CONCURSO	10	17,177,550.70	17,177,550.70
7MO. CONCURSO	4	6,153,540.20	6,153,540.20
8VO. CONCURSO	15	18,172,916.21	18,093,531.00
9NO. CONCURSO	17	31,405,950.00	14,217,319.00
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>249,138,683.01</b>	<b>220,055,276.07</b>

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

El seguimiento a los proyectos de inversión pública (PIP) y estudios de preinversión seleccionados en las convocatorias realizadas por el FONIPREL, se realiza con el objetivo de conocer su estado situacional, en relación al cumplimiento de las metas establecidas, plazos fijados y recursos asignados, a fin de tomar las acciones necesarias para superar las desviaciones que pudieran haberse producido.

La información que se presenta tiene como fuente: i) los informes trimestrales a setiembre 2014, presentados por las entidades visitadas de la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Convocatoria Concurso FONIPREL; y ii) las visitas in situ y reuniones personalizadas sostenidas con los beneficiarios en la semana del 22 al 26 de setiembre del presente.

En el departamento de Piura se aprobaron hasta el noveno concurso, la elaboración / ejecución de 154 propuestas, de las cuales se han visitado 09 (5 %).



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"


### CUADRO Nº 3 PROYECTOS VISITADOS – PIURA

CONCURSOS	CANTIDAD	MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/.)	MONTO TRANSFERIDO (S/.)
2DO. CONCURSO	1	S/. 2,190,497.40	S/. 2,190,497.40
4TO CONCURSO	2	S/. 4,918,935.00	S/. 4,918,935.00
5TO CONCURSO	1	S/. 3,402,645.00	S/. 3,402,645.00
6TO CONCURSO	4	S/. 14,686,501.00	S/. 14,686,501.00
7MO CONCURSO	1	S/. 2,381,207.00	S/. 2,381,207.00
TOTAL	9	S/. 27,579,785.40	S/. 27,579,785.40

De los 09 proyectos visitados, en lo referido al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de cofinanciamiento que a continuación se enumeran, presentan el nivel que se indica en el Gráfico Nº 1.

1. El expediente técnico, tiene Resolución de aprobación.
2. El estudio definitivo tiene informe de consistencia.
3. Los cronogramas de ejecución física y financiera están actualizados.
4. El beneficiario ha presentado sus informes trimestrales.
5. El proyecto tiene variación de metas adecuadas a las normas SNIP (Para proyectos SNIP) o cuenta con aprobación del Órgano Resolutivo (Para proyectos no SNIP).
6. El beneficiario está registrado como Unidad Ejecutora en el Banco de Proyectos.
7. Tiene Acreditada la supervisión del proyecto en ejecución.
8. El beneficiario aporta su contrapartida de manera adecuada.

### GRAFICO Nº1 NIVEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO EN PROYECTOS VISITADOS – PIURA

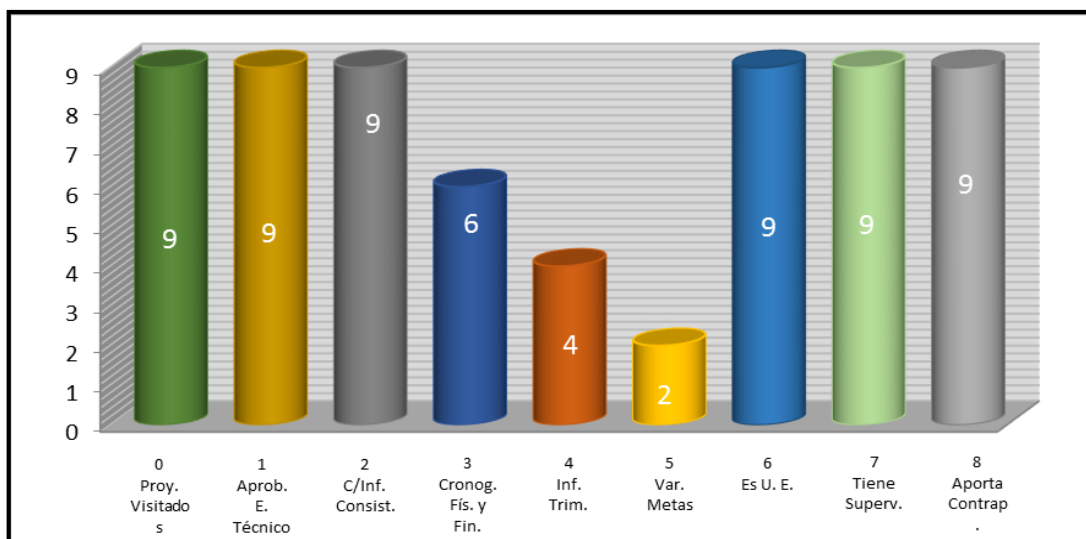


### 3. EJECUCIÓN FÍSICA

#### 3.1 Avance físico, según tipo de propuesta

Los 09 PIP's visitados en la región Piura, presentan el avance físico global, siguiente:

**GRAFICO N° 02**

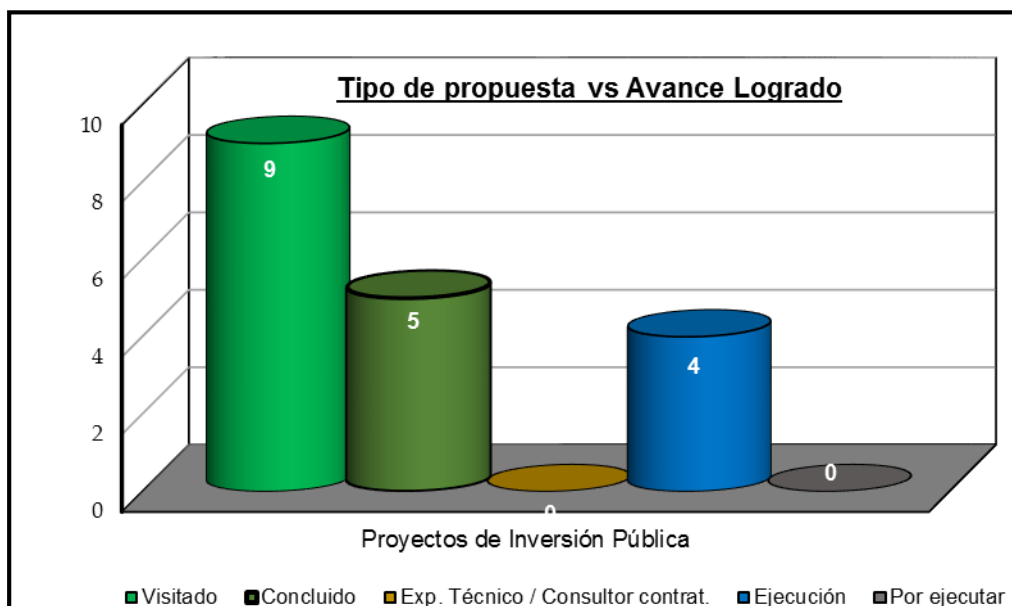

De los PIP visitados 05 han sido concluidos físicamente la ejecución de la infraestructura, 0 están en proceso de elaboración del expediente técnico, 04 en ejecución y 0 por ejecutar. No se ha visitado estudios de preinversión.

#### 3.2 Avance físico de cada proyecto visitado

La ejecución física de cada uno de los proyectos visitados, presenta el estado situacional siguiente: Muestran 04 PIP concluidos, 01 en proceso de elaboración del expediente técnico y 03 en ejecución.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

### CUADRO Nº 04 AVANCE FÍSICO DE CADA PROYECTO VISITADO – PIURA

Nº	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	POR INICIAR	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO SEGÚN SU ETAPA DE EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO PORCENTUAL (%)
				EN EXPEDIENTE TÉCNICO	EN EJECUCIÓN	CONCLUIDA	
1	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 15285 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	4				X	100
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 15029 SANTA TERESA DE JESUS EN EL AAHH SANTA TERESITA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	6			X		70
3	BOCATOMA DE CAPTACIÓN CHAPICA CAMPANAS Y CANAL DE ADUCCIÓN	2			X		70
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICUS EN LA VILLA VICUS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	3			X		95
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	6				X	100
6	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LAS VEGAS - CIENEGUILLO SUR - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	4				X	100
7	REHABILITACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. BUENOS AIRES, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	5				X	100
8	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS DE 1° Y 2° AÑO, EN LA I.E. JOSE CAYETANO HEREDIA, DISTRITO DE CATACAOS – PIURA	6				X	100
9	"INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS PARA EL SISTEMA DE EVACUACION VERTICAL DE LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"	7			X		80
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>AVANCE FÍSICO PORCENTUAL PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)</b>			2				100
			4				100
			5				100
			6				80
			7				80



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

A continuación se detalla el avance físico de cada proyecto de acuerdo a la entidad:

### 3.2.1 Municipalidad Provincial de Sullana

El proyecto “**Ampliación y mejoramiento del servicio educativo en la IE 15285 Maria Auxiliadora del distrito de Sullana, provincia de Sullana - Piura**”, correspondiente al Concurso FONIPREL 2010, de acuerdo al perfil, contempla lo indicado en el Programa Arquitectónico, así como en el Reglamento Nacional de Edificaciones, también tarrajeo frotachado en muros exteriores e interiores, pintado posterior con pintura latex, tarrajeo pulido con impermeabilizante en interior de cisterna, cielorrasos con tartajeo frotachado y pintado con pintura latex, contrazócalos de cerámico de 10 x 30 cm.- Zócalos de cerámica de 20 x 30 cm, pisos de cerámica 30 x30 cm en servicios higiénicos, mamparas de madera caoba, puertas contraplacadas, ventanas de aluminio y portón de ingreso de fierro.

Durante la visita al proyecto se pudo apreciar que se encuentra concluido y operativo quedando pendiente la presentación del informe de culminación completo, además se ha observado deficiencias en los SS.HH alumnos (Varones y Mujeres) que por salvaguardar la integridad de los alumnos no se hace uso. El Director de la I.E. manifiesta que el servicio de agua llega por horas a la I.E.

Se emitirá un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.

El proyecto “**Mejoramiento del servicio educativo en la IE 15029 Santa Teresa de Jesus en el AAHH Santa Teresita distrito de Sullana, provincia de Sullana - Piura**”, correspondiente al Concurso FONIPREL 2010, de acuerdo al perfil, contempla la construcción de Laboratorio (85.88 m<sup>2</sup>) y talleres de Electricidad (85.88 m<sup>2</sup>), 03 depósitos de 27.51 m<sup>2</sup>, construcción de 06 aulas (56.70 m<sup>2</sup>/aula); Construcción de servicios higiénicos, construcción de SUM (85.88 m<sup>2</sup>), OBE (56.70 m<sup>2</sup>) y 03 aulas (56.70 m<sup>2</sup>/aula), construcción de Ambientes administrativos (Dirección 14.34 m<sup>2</sup>, Sub Dirección 14.34 m<sup>2</sup>, Secretaria y sala de espera 26.34 m<sup>2</sup>, sala de profesores 27.59 m<sup>2</sup>), Sala de Computo (85.88 m<sup>2</sup>) y Taller de manualidades (85.88 m<sup>2</sup>), Biblioteca (56.70 m<sup>2</sup>), cocina (12.83 m<sup>2</sup>), tópico (14.44 m<sup>2</sup>), construcción de veredas interiores y exteriores, mejoramiento de SSHH existentes; mejoramiento de aulas existentes; mejoramiento de cerco perimétrico existente mejoramiento del ingreso, mejoramiento de garita de control; mejoramiento de patio escolar, construcción de techado de ingreso, construcción de bancas de concreto, instalaciones eléctricas en patio, construcción de canaleta pluvial, construcción de atrio y mástil de bandera, construcción de gruta, mejoramiento de cisterna y tanque elevado, instalación de 08 papeleras metálicas.

Durante la visita al proyecto se pudo apreciar que se encuentra en ejecución con un avance físico de 70%, se tiene previsto culminar la obra para diciembre 2014. No han presentado los informes trimestrales correspondientes al I, II y III 2014. Se pudo apreciar la presencia del Ingeniero Residente y la Supervisor en la ejecución del proyecto.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

Se emitirá un oficio solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.

### 3.2.2 *Municipalidad Provincial de Morropón*

El proyecto "**Bocatoma de captación Chapica Campanas y Canal de Aducción**" pertenece a la Convocatoria de FONIPREL 2008-II, de acuerdo al perfil, contempla, la construcción de una bocatoma y de sus obras complementarias, las características principales de la bocatoma son las siguientes: Presa de  $f'c=140 \text{ kg/cm}^2 +30\%$ . PG con una longitud de 30 ml, 1.00 ml de ancho y 0.80 m de embalse, poza de amortiguamiento de 30ml x 3.00 m con una profundidad de 0.40 m sobre el nivel del cauce, captación de concreto armado de  $f'c=280\text{kg/cm}^2$  con dimensiones de 2.60m. de ancho para un caudal de captación de aprox. 2.20m<sup>3</sup>/seg, los muros serán de 0.20m. de espesor contando con una hoja de compuerta metálica y un puente de operación de concreto armado, revestimiento de 9940 ml de canal de aducción con concreto  $f'c 175 \text{ kg/cm}^2$  y sus obras complementarias, las características del canal son base mayor 2.50, base menor de 1.00 m, 0.8 m de altura y 0.075 m de espesor.- Construcción de un desarenador aliviadero de concreto armado ubicado en la progresivas 0+010 a 0+025 del canal aductor.- Adicionalmente se ha considerado la construcción de 10 pases peatonales que cumplirán la función de cruce de canal, Puentes carrozables, se construirán 10 puentes vehiculares de concreto armado.-Tomas laterales, Se han proyectado 37 tomas laterales, para conducir el agua hacia los canales laterales, los que sirven a las áreas agrícolas.-Medidas de Mitigación Ambiental.- Como medidas de mitigación de Riesgo de la infraestructura se ha considerado:-Se ha considerado proteger con enrocado seco de 70m. Aguas arriba de la captación en la margen derecha. En la margen izquierda se tiene un suelo rocoso. Aguas abajo también se protegerá con enrocado seco, 80m. en la margen derecha y 100m. en la margen izquierda.- Adicionalmente se construirán estructuras como protección de las quebradas que atraviesan el cauce del canal, además, se contempla llevar a cabo 01 Curso de Capacitación, 03 veces al año, respecto a uso y manejo de agua de riego

Ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP con Código N° 15062 y fue viabilizado con fecha 28/04/2006 con un monto de inversión de S/. 3 650 829.05, bajo la Modalidad de Administración Indirecta - Contrata. Mediante Oficio N° 043-2009-MPM-CH-GM-OPI de fecha: 11/09/2009 se solicita la deshabilitación del proyecto debido a que en esa fecha en proyecto no se encontraba vigente por haber cumplido los 03 años de vigencia que estipula la directiva vigente y considerando que la misma Norma que en ese caso se debe de realizar una nueva evaluación. Según lo informado por la OPI de la Municipalidad Provincial de Morropón, las condiciones topográficas del terreno comparado con el que se tuvo en el tiempo de la viabilidad variaron, principalmente por los 03 periodos lluviosos que el terreno soportó.

Con fecha 08/03/2010, se declaro la nueva viabilidad por un monto de S/. 6 434 491.00. Las metas se han incrementado en: 08 pases de quedrada, 05 puentes peatonales y 01 toma lateral. Igualmente el proyecto cambio de





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

nombre por “Construcción de Bocatoma de Captación y mejoramiento de canal de aducción Chapica Campanas - distrito Chulucanas, provincia de Morropón - Piura”.

Con respecto al cumplimiento del convenio, la Municipalidad viene incumpliendo con la presentación de los informes trimestrales y los informes presentados cuentan con observaciones las cuales fueron notificadas con Oficios N° 1034-2010-EF/68.01. Además, no ha presentado oportunamente la reprogramación física y financiera de la ejecución del proyecto. Se ha remitido el Oficio N° 3397-2010-EF/68.01 de fecha 05/10/10 al Órgano de Control Regional Piura, en el cual se indica el incumplimiento del convenio respectivo.

El proceso para la ejecución del proyecto encuentra paralizado debido a al proceso de arbitraje de la empresa ejecutora a la entidad, debido a la presencia de roca en la base de la bocatoma.

Por lo expuesto, se deberá notificar nuevamente a la Municipalidad con respecto al incumpliendo al convenio.

El proyecto “**Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Vicus en la Villa Vicus, provincia de Morropon - Piura**”, ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP con Código N° 142387, perteneciente a la 6ta Convocatoria FONIPREL 2011-II, y fue viabilizado con fecha 15/12/2011 con un monto de inversión de S/. 4 855 559.00 y bajo la Modalidad de Administración Indirecta - Contrata. Según registro de fecha 26/03/13 del Formato SNIP-15, el monto de inversión determinado durante la elaboración del Expediente Técnico es S/. 5 206 170 .34, apreciándose que el monto de inversión ha aumentado en 7.22% con respecto al monto viabilizado.

Durante la visita, se constató que la obra está concluido y en funcionamiento, se ha realizado la ejecución respetando todos los componentes de Infraestructura y equipamiento respecto del PIP viable

Con respecto al cumplimiento del convenio, la Municipalidad viene incumpliendo con la presentación del informe de culminación.

Por lo expuesto, se deberá notificar nuevamente a la Municipalidad con respecto al incumpliendo al convenio.

### 3.2.3 Municipalidad Distrital de la Matanza

El proyecto “**Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la I.E San Agustín en la localidad de La Matanza, provincia de Morropon - Piura**”, fue registrado en el Banco de Proyectos del SNIP con Código N° 175022 y fue viabilizado con fecha 08/11/2011 con un monto de inversión de S/. 6 871 555.00, bajo la Modalidad de Administración Indirecta – Contrata. El mencionado proyecto perteneciente a la 6ta Convocatoria de FONIPREL 2011-II.

De acuerdo al perfil, el proyecto consiste en: demoler 417.95 m<sup>3</sup>, el techo de concreto armado aligerado del segundo nivel y la escalera del pabellón n 01;



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

además veredas, patio de formación, proscenio gruta, cisterna de concreto armado y 03 ss.hh. también se planteo desmontar construcciones que utilizan para el municipio escolar, y otra que la utilizan para almacén de material deportivo (educación física) e instrumentos de la banda de guerra de la i.e. se construirán: 17 aulas comunes con un área útil de 56.00 m<sup>2</sup> cada una; 02 aulas de innovación pedagógica con un área útil de 112.00 m<sup>2</sup> cada una; 01 centro de recursos educativos con un área útil de 141.00 m<sup>2</sup>; 01 taller de repostería (industrias alimentarias) con un área útil de 106.55 m<sup>2</sup>; 01 local para que funcione el municipio escolar con un área útil de 57.50 m<sup>2</sup>; ss.hh. para docentes y discapacitados con área útil de 8.50 m<sup>2</sup>; 02 ambientes para vestidores con duchas y 01 ambiente para deposito de material deportivo, con área útil de 86.45 m<sup>2</sup>; ambientes para caseta eléctrica, cuarto de bombas, maestranza y limpieza con un área útil de 34.25 m<sup>2</sup>; 01 caseta de guardianía con área útil de 10.60 m<sup>2</sup>; también se planteo construir una cisterna de concreto armado revestida y el tanque elevado se ubicara sobre la estructura del cuarto de bombas; 02 plataformas deportivas con un área de 1,295.00 m<sup>2</sup>; veredas y rampas con un área de 2,664.67 m<sup>2</sup>; patios con un área de 248.16 m<sup>2</sup>; proscenio con área de 51.63 m<sup>2</sup>; sardineles de concreto 787.72 m.l.; 04 bancas circulares y pérgolas circulares: 02 bancas semicirculares y pérgola circular; cerco vivo 90.00 m.l.; huerto con un área de 858.42 m<sup>2</sup>; granja con un área de 125.24 m<sup>2</sup>; block gras con un área de 163.00 m<sup>2</sup>; áreas verdes con un área de 7,800.77 m<sup>2</sup>; sistema de iluminación externa en áreas de recreación, patios, veredas con luminarias sobre 40 postes de fierro.(9 postes con reflectores en zona de plataformas deportivas y 31 postes con 3 farolas); sistema de agua potable con una red de 540.00 m.l.; sistema de desagüe con una red de 303.68 m.l.; sistema de evacuación pluvial con una longitud en canaletas de 338.00 m.l. señalización desde el punto de vista indeci y 13 extintores. se mejorara la infraestructura: del pabellón n 01 de dos niveles y se adecuara para que funcione en el segundo nivel los ambientes administrativos y en el primer nivel ambientes de servicios como son tóxico y psicología, cocina cafetería y sshh, para profesores, administrativos y visitas con un área útil de 307.15 m<sup>2</sup>; 01 sala de usos múltiples (sum) con un área útil de 113.62 m<sup>2</sup>; 01 laboratorio de física, química, biología y anatomía con un área útil de 113.00 m<sup>2</sup>; 01 taller de carpintería/ebanistería con un área útil de 127.80 m<sup>2</sup>; 01 ss.hh. del alumnado (hombres y mujeres) área útil 51.14 m<sup>2</sup>; patio existente (ex losa deportiva) con un área de 677.00 m<sup>2</sup>. esta losa de concreto existente formara parte del patio de formación; cerco perimétrico (tarrajeo de vigas, columnas y contrazocalos de algunos paños + pintura general para todo el cerco) 538.00 m.l.; 03 portones.(01 principal + 02 de emergencia).adquisición de equipo de cómputo, módulos de física y química y anatomía, adquisición de equipos y herramientas de carpintería, equipos del taller de cocina y repostería (industria alimentarias) etc.adquisición de mobiliario escolar; adquisición de mobiliario de otros ambientes.adquisición de bibliografía escolar.

Al momento de la visita de campo, se encontró que la infraestructura estaba en uso pleno por parte de los alumnos y profesores de la Institución Educativa. La obra se encuentra totalmente concluida, se ha realizado la ejecución respetando todos los componentes respecto del PIP viable.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

Respecto al cumplimiento del convenio, la Municipalidad Distrital de La Matanza, no ha presentado el informe de culminación completo, además de tener inconvenientes con la suscripción del acta de transferencia por parte de la Dirección Regional de Educación de Piura.

Por lo expuesto, se remitirá un oficio a la Municipalidad Distrital de la Matanza para completar la información presentada.

### 3.2.4 Municipalidad Provincial de Piura

El proyecto “**Mejoramiento del canal de riego Las Vegas - Cieneguillo Sur - distrito de Piura, provincia de Piura - Piura**”, ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP con Código N° 137744, perteneciente a la 4ta Convocatoria de FONIPREL, y fue viabilizado con fecha 10/03/10 con un monto de inversión de S/. 3 305 282.00 y bajo la Modalidad de Administración directa. A partir del 09/12/2010 se pudo verificar el registro del Formato SNIP-15 en el Banco de Proyectos del SNIP, por un monto de S/. 3 098 638.00, es decir el monto se ha incrementado en un 6.25% del monto viable.

De acuerdo al perfil, el proyecto consiste en Mejoramiento del canal Las Vegas, con revestimiento de concreto y la construcción de obras de arte, capacitación a los agricultores en técnicas de manejo de riego en parcela, capacitación en operación y mantenimiento de la infraestructura, mejorar la infraestructura del canal lateral en una longitud de 6.701 km, revestimiento de concreto de 6,701 m de canal, construcción de 41 tomas laterales, 07 retenciones, 07 cruces vehiculares tipo puente y 01 acueducto.

Durante la visita, se pudo apreciar que el proyecto se encuentra culminada.

Respecto al cumplimiento del convenio, la Municipalidad Provincial de Piura no ha presentado los informes trimestrales a partir del II trimestre 2012 la fecha, ni tampoco ha presentado el informe de culminación.

El proyecto “**Rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el A.H. Buenos Aires, distrito de Piura, provincia de Piura - Piura**”, ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP con Código N° 171487, perteneciente a la 5ta Convocatoria de FONIPREL, y fue viabilizado con fecha 30/12/2010 con un monto de inversión de S/. 4 286 874.00 y bajo la Modalidad de Administración Indirecta. A partir del 21/11/2012 se pudo verificar el registro del Formato SNIP-15 en el Banco de Proyectos del SNIP, por un monto de S/. 3 593 041.24.

De acuerdo al perfil, el proyecto consiste en Mejoramiento del canal Las Vegas, con revestimiento de concreto y la construcción de obras de arte, capacitación a los agricultores en técnicas de manejo de riego en parcela, capacitación en operación y mantenimiento de la infraestructura, mejorar la infraestructura del canal lateral en una longitud de 6.701 km-Revestimiento de concreto de 6,701 m de canal, construcción de 41 tomas laterales, 07 retenciones, 07 cruces vehiculares tipo puente y 01 acueducto.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO

Durante la visita, se pudo apreciar que el proyecto se encuentra culminado.

Respecto al cumplimiento del convenio, la Municipalidad Provincial de Piura no ha presentado los informes trimestrales a partir del II trimestre 2012 la fecha, ni tampoco ha presentado el informe de culminación.

### 3.2.5 Municipalidad Distrital de Catacaos

El proyecto **“Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en aulas de 1° y 2° año, en la I.E. Jose Cayetano Heredia, distrito de Catacaos – Piura”**, ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP con Código N° 67561, perteneciente a la 6ta Convocatoria de FONIPREL, y fue viabilizado con fecha 08/07/2008 con un monto de inversión de S/. 917 497.00 y bajo la Modalidad de Administración Indirecta. El registro del Formato SNIP-15 en el Banco de Proyectos del SNIP, fue el 04/01/2011 por un monto de S/. 982 025.11.

De acuerdo al perfil, el proyecto consiste en la demolición y reconstrucción de 163.95 ml del cerco perimétrico con material noble con cimiento armado, columnas y vigas de amarre y ladrillos, rehabilitación de 115 ml del cerco perimétrico, colocando columnas de reforzamiento y vigas de amarre conservando el muro existente, además de elevar su altura (1 m), construcción de 241.18 m2 de Veredas exteriores, reconstrucción de 354.10 m2 de pisos en aulas y talleres, rehabilitación de 150.59 m2 de Techos, rehabilitación de SS.HH, construcción de dos losas deportivas (600m2 c/u), construcción de laboratorio de cómputo (88.80 m2), instalación de 465 carpetas unipersonales, 22 Escritorios para profesores, incluye silla, 08 Bancas de madera, 40 Computadoras Personales Pentium IV, suministro de bibliografía, equipamiento para laboratorios y talleres, 25 sillas para talleres de electricidad, 01 repostero de madera de 0.80 x 15 ml, 01 Vitrina de 2.15 x 1.50 para laboratorio de Biología, rehabilitación de 02 lavatorios con cerámico para laboratorio de química, rehabilitación de 01 lavatorio con cerámico para talleres de metal mecánico, adquisición de 01 cocina semi industrial de 4 hornillas con horno, 01 refrigeradora de 510 lts de dos puertas para taller de Industria Alimentaria, 22 Sillas para Taller de Vestido instalación de lavador y grifos de duchas del Gimnasio, 40 Módulos personales para computadoras (incluye sillas), 01 Laptop 1.61 Ghz, 992 MB de RAM, 01 cañón multimedia, 01 equipo de aire acondicionado para laboratorio de cómputo, talleres de sensibilización (para profesores y alumnos).

Durante la visita, se pudo apreciar que el proyecto se encuentra culminado, sin embargo la mayólica de los SS.HH. de varones y de mujeres se esta desprendiendo de las paredes. Respecto al cumplimiento del convenio, la Municipalidad Distrital de Catacaos, no ha presentado los informes trimestrales correspondientes al año 2014, ni tampoco ha presentado el informe de culminación.

Por lo expuesto, se remitirá un oficio a la Municipalidad Distrital de la Catacaos solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

### 3.2.6 Municipalidad Provincial de Paita

El proyecto “**Instalación y mejoramiento de accesos para el sistema de evacuación vertical de la parte baja de la ciudad de Paita, distrito de Paita, provincia de Paita - Piura**”, ha sido registrado en el Banco de Proyectos del SNIP con Código N° 225482, perteneciente a la 7ta Convocatoria de FONIPREL, y fue viabilizado con fecha 13/08/2012 con un monto de inversión de S/. 2 976 509.00 y bajo la Modalidad de Administración Indirecta. El registro del Formato SNIP-16 en el Banco de Proyectos del SNIP, fue el 29/10/2013 por un monto de S/. 3 364 394.85.

De acuerdo al perfil, el proyecto consiste en la construcción de escaleras, plataforma de reunión, muros, veredas, pavimentación con bloquetas.

Durante la visita, se pudo apreciar que el proyecto se encuentra en ejecución con un 80% de avance físico, las escaleras del Sector Hospital se encuentran culminadas, faltando un 20% de los muros de contención ejecutados.

Respecto al cumplimiento del convenio, la Municipalidad Provincial de Paita, no ha presentado los informes trimestrales correspondientes al IV trimestre 2013 y del año 2014.

Por lo expuesto, se remitirá un oficio a la Municipalidad Provincial de Paita solicitando al beneficiario la subsanación de las mismas, con la finalidad de culminar con el convenio.

## 4. EJECUCIÓN FINANCIERA

El FONIPREL tiene como fuentes de financiamiento, las señaladas en el Artículo 6° de la Ley 29125, Ley que establece su implementación y funcionamiento, habiendo transferido a los GGLL y GGRR, a setiembre de 2014, por efectos de los nueve concursos, la suma de S/. 1 880 949 000.00; habiéndose efectuado las transferencias conforme a una programación financiera presentada por el beneficiario a la firma del convenio, en el ámbito correspondiente a la Región Piura.

### 4.1 Ejecución financiera según fuente de financiamiento

Los proyectos, objeto de las visitas de campo, alcanzan una inversión total de S/. 33 933 079.11 de los cuales estuvo programado ejecutar la totalidad de los recursos, habiéndose ejecutado S/. 35 243 452.00, lo que constituye una buena ejecución financiera. Del monto ejecutado, el 71.57% provienen de la fuente FONIPREL y el 28.43% de la fuente de los beneficiarios. En el gráfico N° 03 se presenta la información señalada.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas


Viceministerio  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

### GRÁFICO Nº 03

#### EJECUCIÓN FINANCIERA, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

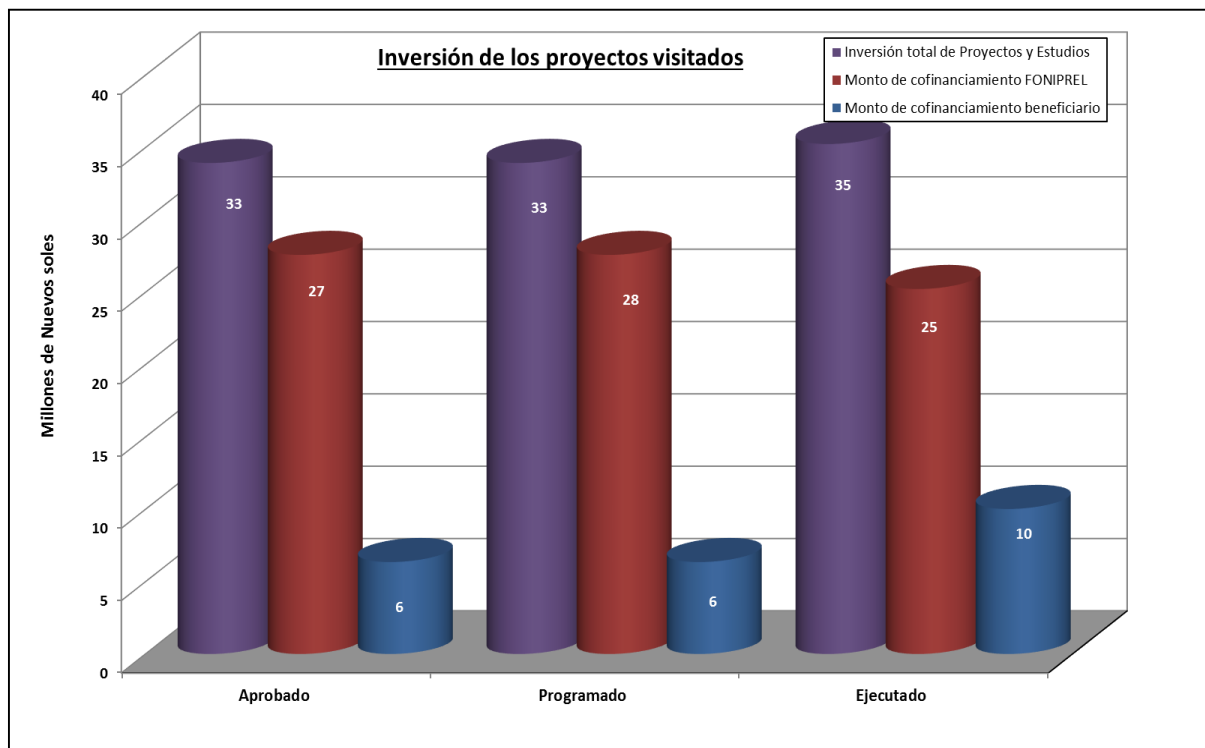

#### 4.2 Avance financiero de cada proyecto visitado.

La ejecución financiera de cada uno de los proyectos y estudios visitados, presenta el estado situacional siguiente:





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministerio  
de EconomíaDirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
 “AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

**CUADRO N° 05**  
**AVANCE FINANCIERO DE CADA PROYECTO VISITADO**  
**– PIURA**

	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	DEL CONVENIO		DE LA INVERSIÓN		AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL (%)
			INVERSIÓN TOTAL S/.	COFINANC. S/.	PROGRAM. A SETIEMBRE 2010 S/.	EJECUTADA A SETIEMBRE 2010 S/.	
1	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 15285 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	4	S/. 2,916,293.00	S/. 2,274,709.00	S/. 2,916,293.00	S/. 2,878,442.00	98.70%
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 15029 SANTA TERESA DE JESUS EN EL AAHH SANTA TERESITA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	6	S/. 4,121,721.00	S/. 3,297,377.00	S/. 4,121,721.00	S/. 3,963,259.00	96.16%
3	BOCATOMA DE CAPTACIÓN CHAPICA CAMPANAS Y CANAL DE ADUCCIÓN	2	S/. 3,650,829.00	S/. 2,190,497.40	S/. 5,971,107.00	S/. 5,971,107.00	100.00%
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICUS EN LA VILLA VICUS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	6	S/. 4,855,559.00	S/. 4,370,004.00	S/. 4,855,559.00	S/. 5,446,716.00	112.17%
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	6	S/. 6,871,555.00	S/. 6,184,399.00	S/. 6,871,555.00	S/. 6,213,425.00	90.42%
6	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LAS VEGAS - CIENEGUILLO SUR - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	4	S/. 3,305,282.00	S/. 2,644,226.00	S/. 3,305,282.00	S/. 3,316,513.00	100.34%
7	REHABILITACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. BUENOS AIRES, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	5	S/. 4,253,306.00	S/. 3,402,645.00	S/. 4,253,306.00	S/. 3,533,240.00	83.07%
8	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS DE 1° Y 2° AÑO, EN LA I.E. JOSE CAYETANO HEREDIA, DISTRITO DE CATACAOS – PIURA	6	S/. 982,025.11	S/. 834,721.00	S/. 982,025.11	S/. 1,426,739.00	145.29%
9	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS PARA EL SISTEMA DE EVACUACION VERTICAL DE LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	7	S/. 2,976,509.00	S/. 2,381,207.00	S/. 2,976,509.00	S/. 2,494,011.00	83.79%
TOTAL S/.			S/. 33,933,079.11	S/. 27,579,785.40	S/. 36,253,357.11	S/. 35,243,452.00	97.21%
<b>AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL, PROMEDIO SEGÚN CONVOCATORIA (%)</b>		2					100.00%
		4					99.52%
		5					83.07%
		6					111.00%
		7					83.79%

En el cuadro N° 05 se observa, que los proyectos visitados cuentan con un avance financiero promedio de 97.21%. El proyecto visitado de la segunda convocatoria, tienen un avance financiero promedio de 100%. Los proyectos visitados de la cuarta



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

convocatoria, tienen un avance financiero promedio de 99.52%. El proyecto visitado de la quinta convocatoria, tiene un avance financiero promedio de 83.075%. Los proyectos visitados de la sexta convocatoria, tienen un avance financiero promedio de 111%. El proyecto visitado de la séptima convocatoria, tiene un avance financiero promedio de 83.79%.

## 5. PRINCIPALES LOGROS

- 04 PIP visitados se encuentran en ejecución.
- De esos 04 el proyecto "Bocatoma de Captación Chapica Campanas y canal de Aducción" se encuentra paralizado por el proceso de arbitraje.
- 03 Instituciones Educativas visitadas se encuentran culminadas y en funcionamiento.
  - 1) AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 15285 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA – PIURA
  - 2) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA.
  - 3) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS DE 1° Y 2° AÑO, EN LA I.E. JOSE CAYETANO HEREDIA, DISTRITO DE CATACAOS – PIURA.
- Revestimiento de concreto de 6,701 m de canal, construcción de 41 tomas laterales, 07 retenciones.

## 6. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS

- Carencia de mano de obra calificada para ejecutar las obras.
- Desconocimiento de la Normativa del SNIP.
- Demoras en los procesos de contratación de consultores, materiales y contratistas para la ejecución de los proyectos.
- Inseguridad en el entorno de los proyectos en ejecución.
- Falta de coordinación de los consultores con la población, para la elaboración de los expedientes técnicos.
- Varios lugares carecen de redes de agua y desagüe, por lo que los proyectos a concluir (centros educativos) no brindarán el servicio completo a la población beneficiaria.
- No atención a los requerimientos solicitados por el FONIPREL.
- Incumplimiento por parte de las entidades del cumplimiento del convenio suscrito con el FONIPREL.

## 7. CONCLUSIONES

- El FONIPREL se encuentra cofinanciando la ejecución / elaboración de 2387 PIP/estudios, seleccionados en las nueve convocatorias.
- El importe del cofinanciamiento otorgado por el FONIPREL asciende a S/. 1 880 949 000.
- En el departamento de Piura, FONIPREL ha cofinanciando la ejecución / elaboración de 154 PIP/estudios, seleccionados en las nueve convocatorias, de las cuales se ha realizado la visita a 09 proyectos, que representan el 5.84%.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

- El monto de cofinanciamiento otorgado por el FONIPREL a la Región Piura de los 09 proyectos visitados asciende a S/. 27,579,785.40 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado a la fecha el S/. 25 222 419.00 nuevos soles, es decir el 91.45%.

## 8. PANEL FOTOGRÁFICO

Ver Anexo 1.

Lima, octubre de 2014.

---

Gherman Malpartida Lozada  
Analista FONIPREL

gml/,jq/EDC



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

## ANEXO N° 01

### PANEL FOTOGRÁFICO DE OBRAS VISITADAS

<b>1. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA</b>			
<b>REGIÓN:</b> PIURA	<b>PROVINCIA:</b> SULLANA	<b>DISTRITO:</b> SULLANA	<b>LOCALIDAD</b> SULLANA
<b>OBRA:</b> : AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 15285 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 2,916,293.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b> S/. 2,274,709.00	
<b>ODIGO SNIP:</b>	106898		



Pabellones construidos



Computadoras adquiridas.

<b>2. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA</b>			
<b>REGIÓN:</b> PIURA	<b>PROVINCIA:</b> SULLANA	<b>DISTRITO:</b> SULLANA	<b>LOCALIDAD</b> AA.HH. SANTA TERESITA
<b>OBRA:</b> : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 15029 SANTA TERESA DE JESUS EN EL AAHH SANTA TERESITA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 5 25 714.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b> S/. 420 571.20	
<b>CODIGO SNIP:</b>	182166		



Construcción de pabellón



Construcción de pabellón



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

<b>3. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON			
<b>REGIÓN:</b> PIURA	<b>PROVINCIA:</b> MORROPON	<b>DISTRITO:</b> MORROPON	<b>LOCALIDAD</b>
<b>OBRA:</b> BOCATOMA DE CAPTACIÓN CHAPICA CAMPANAS Y CANAL DE ADUCCIÓN			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 5 25 714.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b> S/. 2,190,497.40	
<b>CODIGO SNIP:</b>	15062		



Canal terminado



Disipador de energía en cana

<b>4. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON			
<b>REGIÓN:</b> PIURA	<b>PROVINCIA:</b> MORROPON	<b>DISTRITO:</b> MORROPON	<b>LOCALIDAD:</b> VILLA VICUS
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICUS EN LA VILLA VICUS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 4,855,559.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b> S/. 4,370,004.00	
<b>CODIGO SNIP:</b>	142387		



Pabellón culminado



Auditoria y –SUM culminados





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

<b>5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA</b>			
<b>REGIÓN:</b> PIURA	<b>PROVINCIA:</b> MORROPON	<b>DISTRITO:</b> LA MATANZA	<b>LOCALIDAD:</b> LA MATANZA
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 6,871,555.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 6,184,399.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	175022		



Pabellón culminado



Adquisición de computadoras

<b>6. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA</b>			
<b>REGIÓN:</b> PIURA	<b>PROVINCIA:</b> PIURA	<b>DISTRITO:</b> PIURA	<b>LOCALIDAD:</b>
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LAS VEGAS - CIENEGUILLO SUR - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 3,305,282.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 2,644,226.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	137744		



Canal culminado



Puente terminado



PERÚ


Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

<b>7. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA			
<b>REGIÓN:</b> PIURA	<b>PROVINCIA:</b> PIURA	<b>DISTRITO:</b> PIURA	<b>LOCALIDAD:</b> A.H. BUENOS AIRES
<b>OBRA:</b> REHABILITACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. BUENOS AIRES, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 4,253,306.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 3,402,645.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	171487		

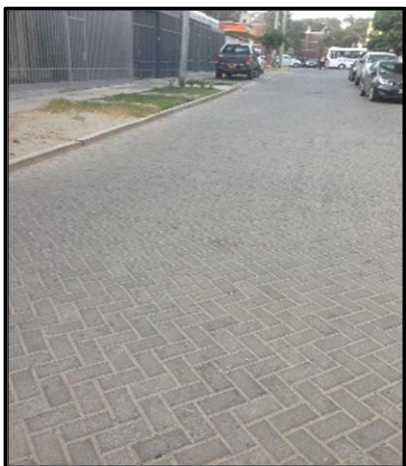

Reposición de pavimento



Instalación de buzones

<b>8. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS			
<b>REGIÓN:</b> PIURA	<b>PROVINCIA:</b> PIURA	<b>DISTRITO:</b> CATACAOS	<b>LOCALIDAD:</b>
<b>OBRA:</b> MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN AULAS DE 1° Y 2° AÑO, EN LA I.E. JOSE CAYETANO HEREDIA, DISTRITO DE CATACAOS – PIURA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 982,025.11	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 834,721.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	67561		



Adquisición de computadoras



Rehabilitación de Pabellon





PERÚ


Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía


Dirección  
General de Inversión Pública

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

<b>9. ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA			
<b>REGIÓN:</b> PIURA	<b>PROVINCIA:</b> PAITA	<b>DISTRITO:</b> PAITA	<b>LOCALIDAD:</b>
<b>OBRA:</b> INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS PARA EL SISTEMA DE EVACUACION VERTICAL DE LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA			
<b>MONTO DE INVERSIÓN:</b>	S/. 2,976,509.00	<b>COFINANCIAMIENTO FONIPREL:</b>	S/. 2,381,207.00
<b>CODIGO SNIP:</b>	225482		

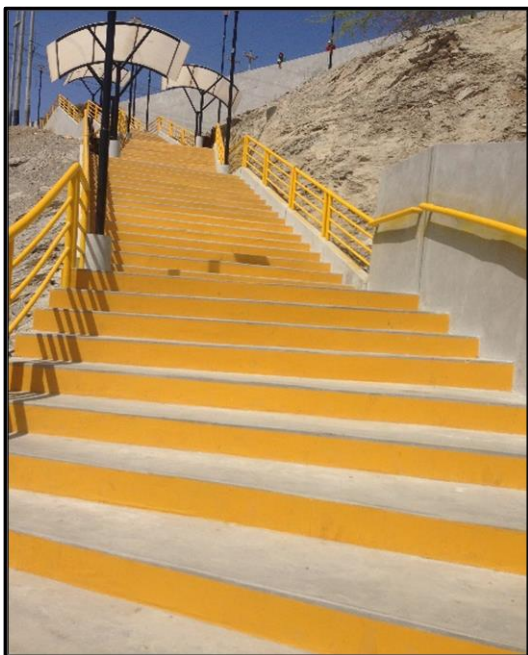

Escaleras culminadas

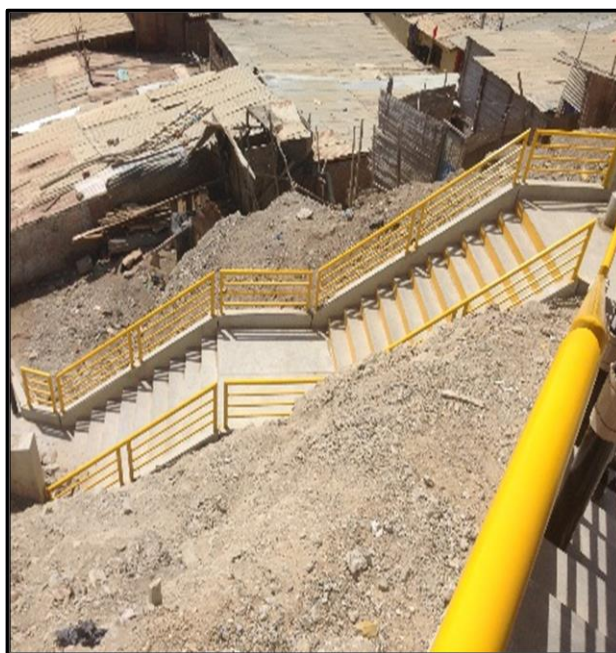

Escaleras culminadas
