



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de EconomíaDirección
General de Programación
Multianual del Sector Público"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS FONIPREL EN LA REGION PIURA¹

I. ANTECEDENTES

1. Como resultado de las convocatorias 2008, el FONIPREL asignó S/. 670 millones para cofinanciar estudios de preinversión y proyectos de inversión pública. El cofinanciamiento destinado al gobierno regional (GR) y gobiernos locales (GLs) de Piura fue de S/. 92.6 millones, monto que representa el 14% del total asignado.
2. Como se observa en el Cuadro 1, el 29% de los recursos está destinado a cofinanciar proyectos de educación básica, seguidos de infraestructura vial (25%) y servicios de saneamiento (20%).

Cuadro 1: Distribución de propuestas ganadoras por prioridad cofinanciada

Nº	PRIORIDAD	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		PROYECTO		TOTAL	
		No	MONTO	No	MONTO	MONTO	%
1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	12,330.00	15	26,994,458.69	27,006,788.69	29%
2	INFRAESTRUCTURA VIAL(*)	1	74,970.00	4	22,801,435.00	22,876,405.00	25%
3	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8	440,463.28	12	17,967,484.00	18,407,947.28	20%
4	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	1	174,825.00	8	16,507,542.79	16,682,367.79	18%
5	ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	0	1	4,024,980.00	4,024,980.00	4%
6	SERVICIOS DE SALUD BÁSICA	0	0.00	3	3,685,294.52	3,685,294.52	4%
TOTAL		11	702,588.28	43	91,981,194.90	92,683,783.18	100%

COFINANCIAMIENTO TOTAL	92'683,783
Nº DE PROPUESTAS GANADORAS	54

(*) Considera la propuesta presentada por la Municipalidad Provincial de Sullana ("Mejoramiento de la carretera Mallares-CP. El Angolo, Marcavelica, Provincia de Sullana, Piura" cuya suscripción del Convenio de Cofinanciamiento se encuentra suspendido temporalmente)

3. A la fecha, se ha incorporado S/. 78.4 millones a los pliegos ganadores, de acuerdo con el siguiente cronograma:

PRIMERA INCORPORACIÓN D.S Nº 116-2008/EF del 30.09.08	SEGUNDA INCORPORACIÓN D.S Nº 062-2009/EF del 12.03.09	TERCERA INCORPORACIÓN D.S Nº 089-2008/EF del 21.04.09	TOTAL INCORPORADO
12,786,442.00	35,110,557.00	30,520,842.18	78,417,841.18

¹ Información a julio de 2009.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

4. La Secretaría Técnica del FONIPREL realizó, entre el 16 y el 17 de julio del 2009, talleres de seguimiento del avance físico y financiero de la elaboración de los estudios y ejecución de los proyectos ganadores de los Concursos - FONIPREL en la Región Piura, con la participación del Gobierno Regional y 26 GLs ganadores de cofinanciamiento².

II. AVANCE FÍSICO

5. Como se observa en el Gráfico 1, de un total de 11 estudios ganadores, 5 (46%) han sido concluidos y representan el 36% de la inversión en estudios y 2 (18%) se encuentran en proceso de formulación.


Gráfico 1: Distribución del avance físico de los estudios

ESTADO SITUACIONAL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SEGÚN N° DE PROPUESTAS



Total de Propuestas = 11

ESTADO SITUACIONAL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SEGÚN EL IMPORTE DE COFINANCIAMIENTO

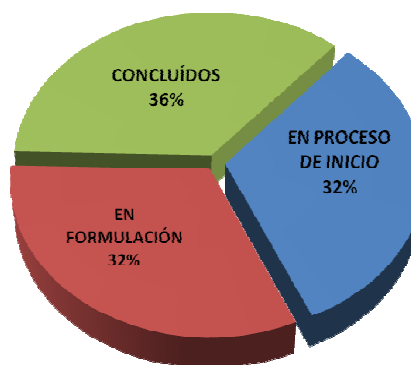

Total de Cofinanciamiento=S/. 702,588.28

Fuente: Secretaría Técnica FONIPREL

² La información de los 5 GLs ausentes en el taller fue obtenida del SIAF.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas


Viceministro de Economía

Dirección General de Programación Multianual del Sector Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA ”

6. En el caso de la ejecución de proyectos, de un total de 43 proyectos ganadores, 19 (44%) se encuentran en ejecución y representan el 26% de la inversión, y 4 (9%) se encuentran concluidos en proceso de liquidación, representando el 5% de la inversión.

Gráfico 2: Distribución del avance físico de los proyectos

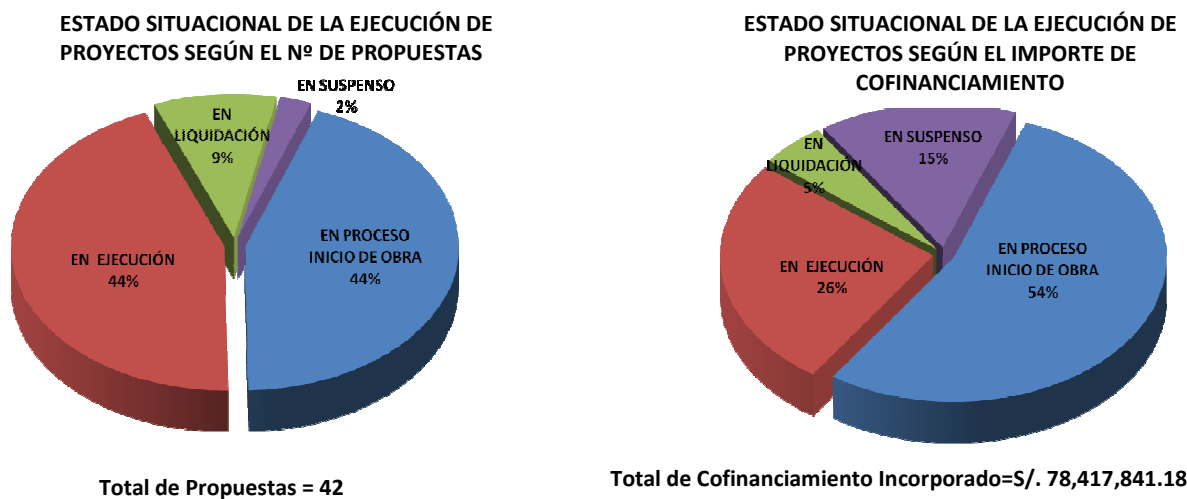


Fuente: Secretaría Técnica FONIPREL

III. AVANCE FINANCIERO

7. De un total de S/. 78.4 millones incorporados a junio de 2009, han sido ejecutados S/. 14.5 millones, es decir 19% del monto total incorporado en los pliegos del GR de Piura y de los GLs ganadores del cofinanciamiento FONIPREL.

Gráfico 3: Ejecución de los recursos incorporados a los pliegos ganadores por convocatoria

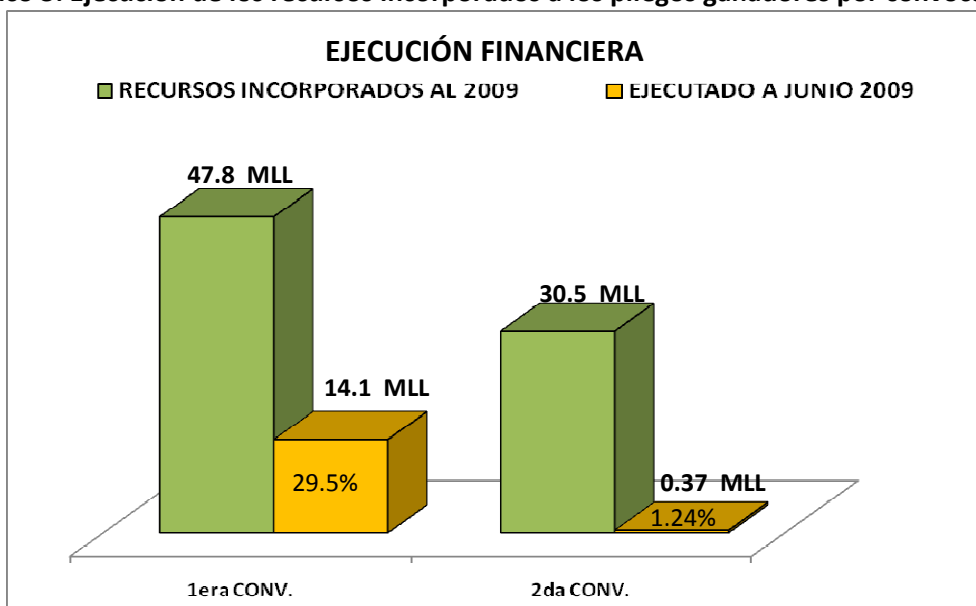

Fuente: SIAF-MEF



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía


Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA ”

IV. CAUSAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS

8. Con el propósito de evaluar los factores que están afectando el avance de la ejecución de los proyectos cofinanciados por el Fondo, durante el taller se realizó una encuesta a las 27 entidades participantes.
9. Para cada factor, se solicitó que el representante de la entidad determinara en qué medida estaba afectando la ejecución de la propuesta de acuerdo con la siguiente escala: i) no se presentó, ii) se presentó parcialmente o iii) se presentó en gran medida.
10. El 48% de las entidades manifestó que los problemas climatológicos/físicos-geográficos están afectando de manera importante la ejecución, seguido por el bajo desempeño de los consultores/contratistas (37%) y por ausencia de personal para gestionar/supervisar la ejecución.
11. Más de la mitad de las entidades no ha experimentando problemas relacionados a la disponibilidad de consultores o contratistas ni a la baja participación de la población.

Gráfico 4: Resultados de las encuestas que precisa los aspectos que afectan el avance de proyectos

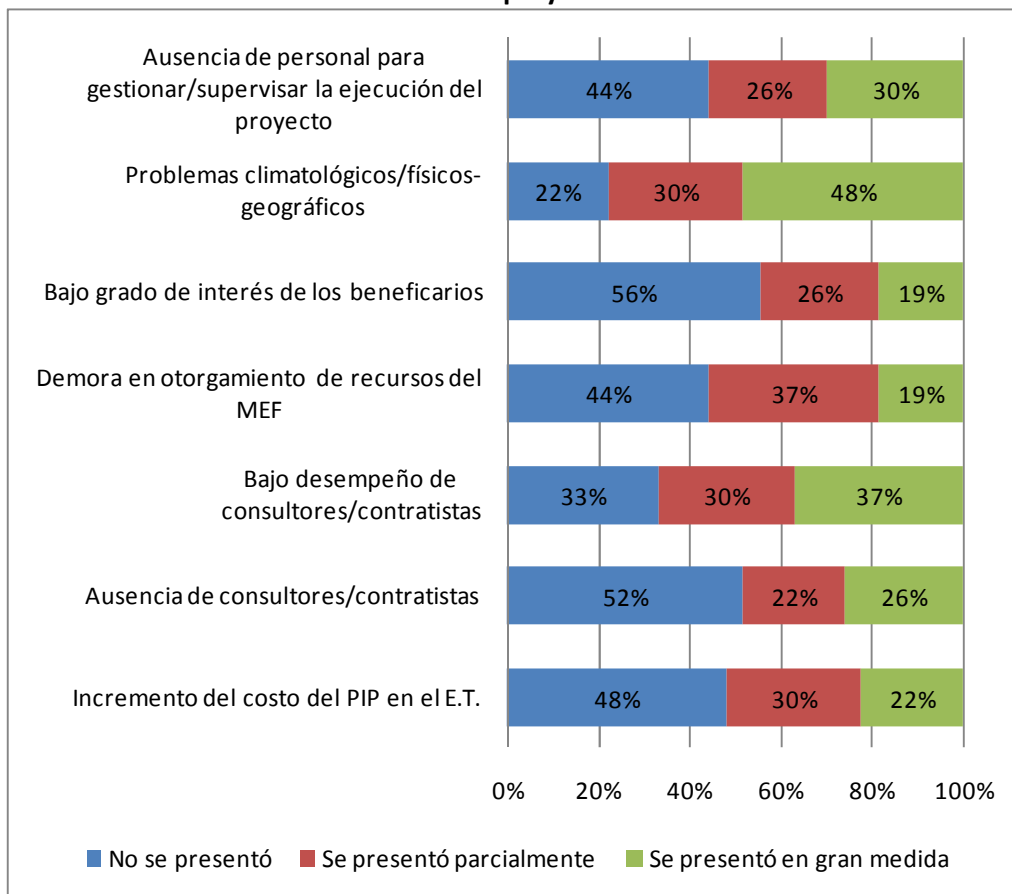

Fuente: Secretaría Técnica del FONIPREL



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

V. CONCLUSIONES

12. FONIPREL incorporó S/. 78.4 millones al Gobierno Regional y GGLL de la región Piura para el cofinanciamiento de estudios y proyectos, como resultado de la primera y segunda convocatoria. A la fecha, se ha ejecutado el 19% del monto total de recursos transferidos.
13. Las principales causas del retraso en la ejecución de los proyectos y estudios son:
 - a. Condiciones climatológicas adversas (el inicio de las obras coincidió con el periodo de lluvias).
 - b. Bajo desempeño de los consultores/contratistas que formulan los estudios y ejecutan las obras.
 - c. Limitado personal técnico capacitado para formular términos de referencia y para conducir con efectividad los procesos de selección para la contratación de consultorías, adquirir materiales y ejecución de obras.
 - d. Falta de supervisión técnica durante la elaboración de los estudios y expedientes técnicos, generando demoras en su revisión una vez terminados.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA ”

PANEL FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRAS EN LA REGIÓN PIURA

1. **ENTIDAD BENEFICIARIA:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PROVINCIA: PIURA **DISTRITO:** TAMBOGRANDE **LOCALIDAD:** CP LLOQUE YUPANQUI
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 14321 DEL CENTRO POBLADO LLOQUE YUPANQUI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 483,920.00 **COFINANCIAMIENTO FONIPREL:** S/. 414,900.00
CODIGO SNIP: 79940 **AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009:** 100.00%



Situación en que se encontraba la I.E. N° 14321



Centro Educativo concluido (aulas, cerco perimétrico y equipamiento)

2. **ENTIDAD BENEFICIARIA:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
PROVINCIA: PIURA **DISTRITO:** CATACAOS **LOCALIDAD:** CP LLOQUE YUPANQUI
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISIÓN DE REGANTES PUYUNTALA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA-PIURA
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1'085,910.00 **COFINANCIAMIENTO FONIPREL:** S/. 814,432.00
CÓDIGO SNIP: 83408 **AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009:** 100.00%



Canal sin proyecto



Canal concluido



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

3. **ENTIDAD BENEFICIARIA:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

PROVINCIA: PIURA

DISTRITO: CATACAOS

LOCALIDAD: CATACAOS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 CATACAOS

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 3'396,487.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 2'717,190.00

CÓDIGO SNIP: 78638

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 46.40%



Situación de ambientes sin proyecto



Avance en la construcción de ambientes en el centro de salud

4. **ENTIDAD BENEFICIARIA:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN

PROVINCIA: PIURA

DISTRITO: LA UNIÓN

LOCALIDAD: MONTERREDONDO, LA UNIÓN

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA UNIÓN VILLA MONTERREDONDO, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 2'145,180.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 1'608,885.00

CÓDIGO SNIP: 54549

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 72.90%



Conformación de subrasante



Carpeta asfáltica en caliente



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA ”

5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

PROVINCIA: PIURA

DISTRITO: LA ARENA

LOCALIDAD: LA BANDERA, SINCHAO, CASARANA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LA ARENA

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1'813,572.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 1'449,951.00

CÓDIGO SNIP: S/N

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 100.00%



Canal sin proyecto



Canal concluido

6. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

PROVINCIA: PIURA

DISTRITO: CASTILLA

LOCALIDAD: CASTILLA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA AV. GRAU CUADRAS 8, 9, 19 Y 11 ENTRE AV. AREQUIPA Y AV. JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CASTILLA, PIURA

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1'108,256.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 554,128.00

CÓDIGO SNIP: 62775

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 22.00%



Instalación de conexiones domiciliarias
de desagüe



Vaciado de concreto para buzón



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

7. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL TALLÁN

PROVINCIA: PIURA

DISTRITO: EL TALLÁN

LOCALIDAD: TALLÁN

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL SEMINARIO TRAMO I KM:0+000 AL KM:1+310, TRAMO II KM:0+000 AL KM:1+002.5 Y LATERAL KM:0+552.83 DEL DISTRITO EL TALLÁN

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 2'060,732.56

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 1'854,659.00

CÓDIGO SNIP: S/N

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 49.00%



Excavación del canal



Proceso de compactación

8. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI

PROVINCIA: PIURA

DISTRITO: CURA MORI

LOCALIDAD: CURA MORI

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO LA BRUJA CURA MORI

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1'417,391.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 1'133,913.00

CÓDIGO SNIP: S/N

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 10.20%



Humedecimiento del canal y compactación



Acopio de agregado en obra



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

9. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN

PROVINCIA: MORROPÓN

DISTRITO: CHULUCANAS

LOCALIDAD: SAUSAL, EL MOGOTE, ALTO
SAN MIGUEL

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, CASERÍOS
SAUSAL, EL MOGOTE Y ALTO SAN MIGUEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 714,890.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 428,934.00

CÓDIGO SNIP: 40853

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 98.00%



Construcción Reservorio elevado



Construcción de caseta de equipo
de bombeo

10. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

PROVINCIA: MORROPÓN

DISTRITO: LA MATANZA

LOCALIDAD: LA MATANZA

OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 14988 "MARIA PARADO DE BELLIDO", DISTRITO DE LA MATANZA,
PROVINCIA DE MORROPÓN

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 900,614.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 720,491.00

CÓDIGO SNIP: S/N

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 68.80%



Módulo para biblioteca de la I.E. N° 14988



Encofrado de vigas del Aula de Usos Múltiples



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

11. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA

PROVINCIA: AYABACA

DISTRITO: SAPILLICA

LOCALIDAD:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. CENTRO BASE N° 14396 - SAPILLICA

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 569,025.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 512,123.00

CÓDIGO SNIP: S/N

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 95.00%



Acabado de uno de los pabellones de la I.E.



Proceso de acabado en aulas de la I.E.

12. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALAQUIZ

PROVINCIA: MORROPÓN

DISTRITO: LALAQUIZ

LOCALIDAD: LALAQUIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL E.S. I-1 MAYLAND MICRORRED SALITRAL, RED SALUD MORROPÓN - CHULUCANAS

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 614,068.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 552,661.00

CÓDIGO SNIP: 46297

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 8.30%



Construcción de ambientes en el
establecimiento de salud



Izamiento de columnas

13. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

PROVINCIA: SULLANA

DISTRITO: SULLANA

LOCALIDAD: ALTO CHIRA, MONTENEGRO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTIGUA EL ALTO CHIRA DESDE MONTENEGRO HASTA CHILACO PELADOS, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 8'544,766.00


COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 5'044,766.00

CÓDIGO SNIP: 72671

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 73.80%



Nivelación de terreno

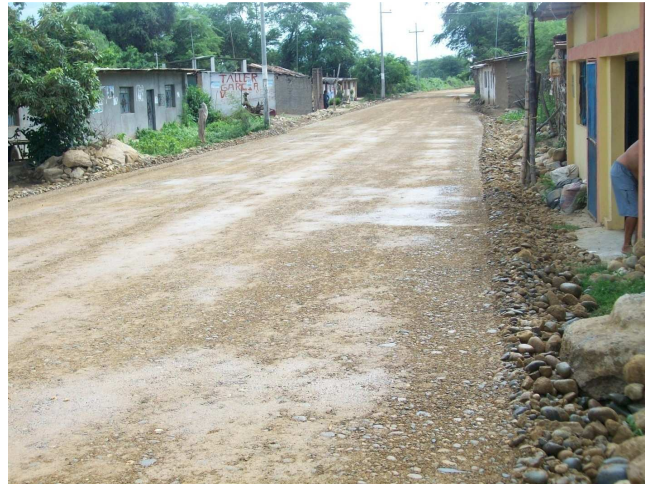

Carretera a nivel se sub capa

14. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO

PROVINCIA: SULLANA

DISTRITO: QUERECOTILLO

LOCALIDAD: MARGARITA, HUALTACAL


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE MARGARITA Y HUALTACAL DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, PIURA

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1'532,186.00

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 1'302,358.00

CÓDIGO SNIP: 84744

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 40.50%

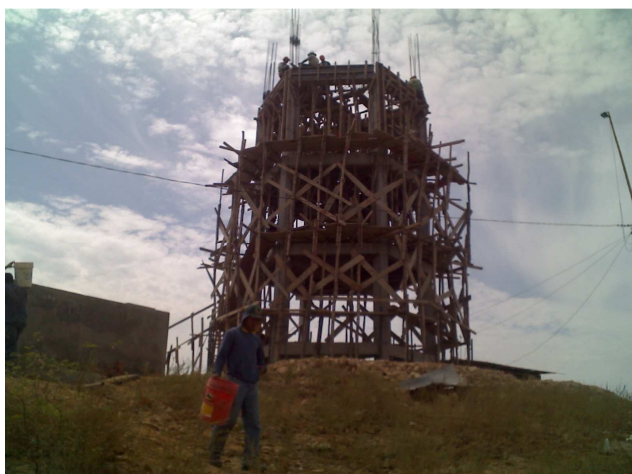

Base para la construcción del reservorio
elevado



Suministro e instalación de tuberías para
agua potable

15. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO

PROVINCIA: SULLANA

DISTRITO: IGNACIO ESCUDERO

LOCALIDAD: SANTA SOFIA



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Economía

Dirección
General de Programación
Multianual del Sector Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. COMPLEJO EDUCATIVO SANTA SOFÍA, VILLA SANTA SOFÍA-IGNACIO ESCUDERO,
PROVINCIA DE SULLANA-PIURA

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 2'459,847.00

CÓDIGO SNIP: 84399

COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 2'090,070.00

AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 54.40%



Pabellón y batería de baños en
construcción



Construcción de pabellones
