



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA**

# Informe de Seguimiento y Gestión a la Inversión Pública

---

## **GOBIERNOS LOCALES**

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | AL 31 DE MARZO DEL 2017





## ÍNDICE DE CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO .....	3
II. EJECUCIÓN.....	5
III. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS .....	6
IV. PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL DU 004.....	7
V. PROBLEMAS QUE AFECTA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA .....	8
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	8
VII. ANEXO.....	9

## I. RESUMEN EJECUTIVO


### Comparativo de ejecución mensual año 2017 versus año 2016

Al 31 de marzo del 2017, los gobiernos locales registraron un PIM de S/ 12,221 millones, el cual representa el 34% del presupuesto de inversiones del país. Respecto a la ejecución, ejecuto S/ 1,732 millones que representa el 46% del total ejecutado en el país.

En el I Trimestre 2017 respecto del I Trimestre 2016, los gobiernos locales se mantuvieron en la ejecución mensual (0%) e incrementó en la ejecución acumulada por 4%, como se puede apreciar en el gráfico N° 1.1, sin embargo se perciben algunos problemas:

- Demoras en revisión de expedientes técnicos
- Estudios de preinversión de mala calidad
- Retrasos en transferencias de recursos

**Gráfico N° 1.1: Comparativo de ejecución mensual y acumulada 2017 vs 2016**

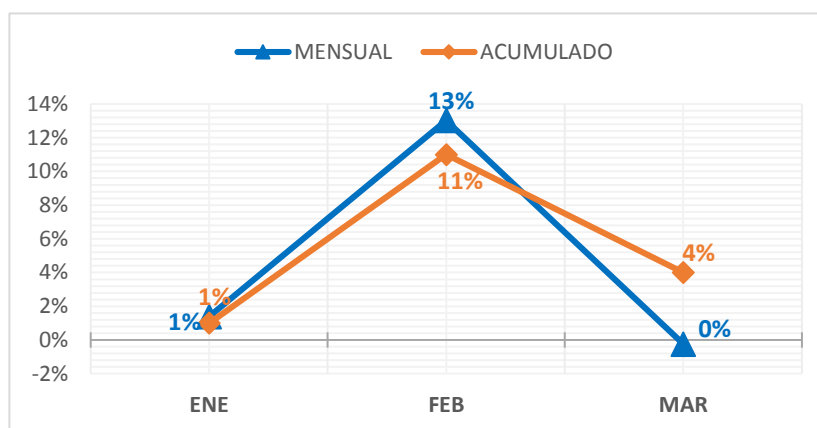


### Comparativo de ejecución total versus ejecución cartera priorizada

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública de la Dirección General de Inversión Pública, en conjunto con los 25 gobiernos locales, ha definido una cartera priorizada de 133 proyectos.

Al 31 de marzo del 2017, los gobiernos locales han ejecutado el 10.1% de la cartera priorizada (S/ 1,611.71 millones), siendo su porcentaje de ejecución total de 14.2% (S/ 12,189.62 millones)


**Gráfico N° 1.2: Comparativo de ejecución total versus cartera priorizada 2017**

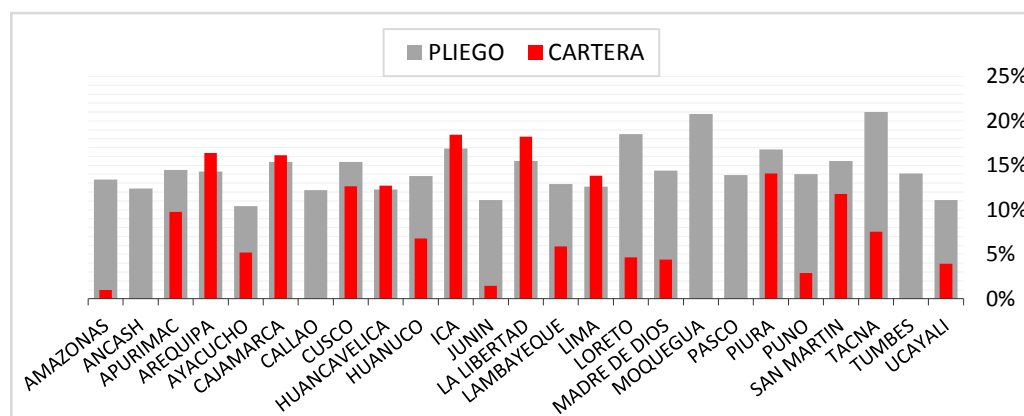

### Cumplimiento de compromisos asumidos en Comités de Inversiones

En todas las sesiones de comités de inversiones llevados a cabo en los Gobiernos Locales, se estipulan compromisos por cada uno de los involucrados en la gestión de los proyectos, pudiendo observar que en el I Trimestre aún se tienen compromisos pendientes de los meses de enero, febrero y marzo.

**Gráfico N° 1.3: Cumplimiento de compromisos 2017**

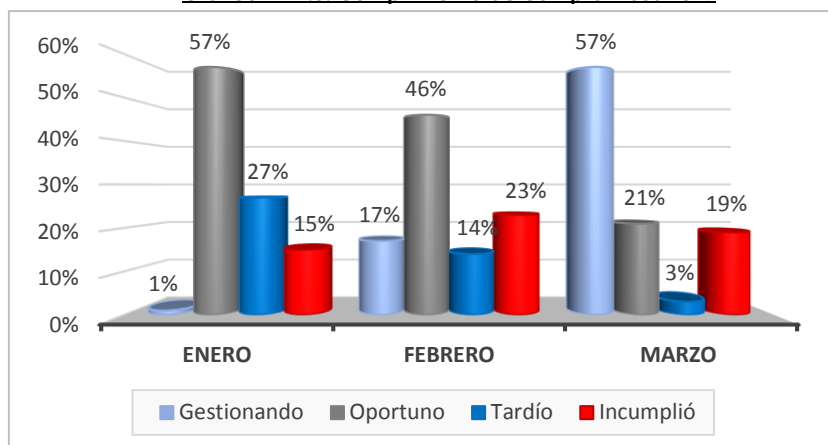


### Seguimiento a los proyectos priorizados en el DU 004-2017

Mediante Decreto de Urgencia publicado el 17 de marzo de 2017, se ha transferido a los gobiernos locales S/ 543.62 millones para la ejecución de 128 proyectos.

Al I Trimestre no se han ejecutado recursos, habiendo sido incorporados el 99.6% de los recursos en sus respectivos presupuestos.

**Gráfico N° 1.4: Mapa de distribución de recursos por Departamento**

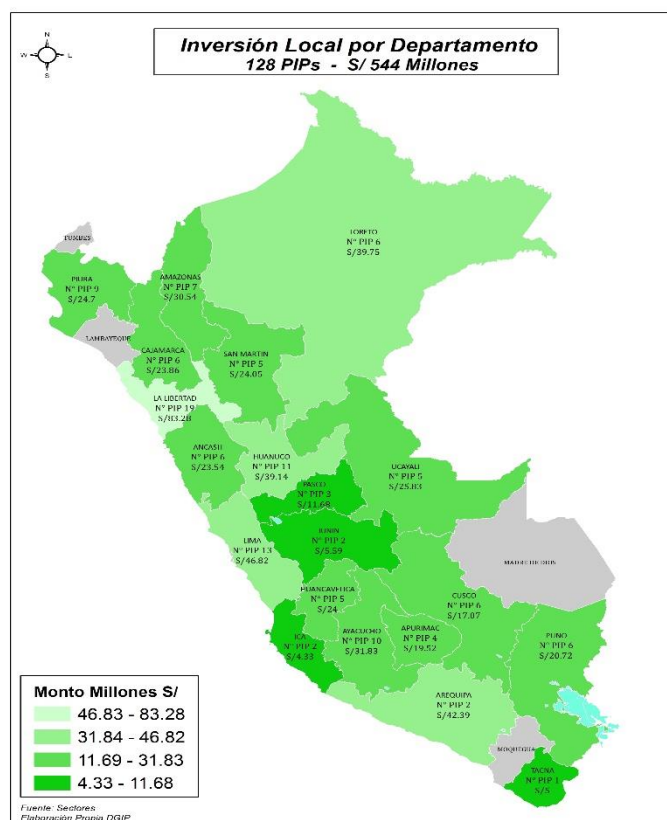

## II. EJECUCIÓN

El estado situacional de la inversión pública en los gobiernos locales, al 31 de marzo del 2017, se resume en el siguiente cuadro:


**Cuadro N° 2.1 Ranking De Ejecución Presupuestal**

Departamento	2017*			2016			%Δ Ejec
	PIM	DEV	Avan.	PIM	DEV	Avan.	
TACNA	208	44	21%	138	22	16%	98%
MOQUEGUA	157	33	21%	401	54	13%	-39%
LORETO	308	57	18%	262	42	16%	35%
ICA	262	44	17%	1,112	214	19%	-79%
PIURA	625	105	17%	68	7	11%	1304%
LA LIBERTAD	723	112	16%	575	102	18%	10%
SAN MARTIN	436	67	15%	34	5	14%	1323%
CUSCO	1,150	177	15%	560	88	16%	102%
CAJAMARCA	925	142	15%	345	52	15%	173%
APURIMAC	603	87	14%	1,116	244	22%	-64%
MADRE DE DIOS	42	6	14%	496	84	17%	-93%
AREQUIPA	696	99	14%	460	107	23%	-7%
TUMBES	115	16	14%	272	46	17%	-65%
PUNO	655	92	14%	85	15	17%	523%
PASCO	169	24	14%	335	62	18%	-62%
HUANUCO	516	71	14%	564	77	14%	-7%
AMAZONAS	241	32	13%	124	32	26%	1%
LAMBAYEQUE	316	41	13%	174	50	29%	-18%
LIMA	1,478	187	13%	124	23	18%	719%
ANCASH	658	82	12%	100	22	22%	273%
HUANCAVELICA	426	52	12%	262	40	15%	30%
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	109	13	12%	203	49	24%	-73%
JUNIN	527	59	11%	482	90	19%	-35%
UCAYALI	222	25	11%	240	45	19%	-45%
AYACUCHO	621	65	10%	547	92	17%	-30%
<b>TOTAL</b>	<b>12,221</b>	<b>1,732</b>	<b>14%</b>	<b>9,080</b>	<b>1,664</b>	<b>18%</b>	<b>4%</b>


Fuente: SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017 y 2016.

\*Elaboración Propia. En millones de Soles (S/)

Las carteras priorizadas en 25 gobiernos locales suman 133 proyectos con un presupuesto asignado de S/ 1,612 millones, estos proyectos representan el 13% del total de la cartera de proyectos que tienen las inversiones locales.

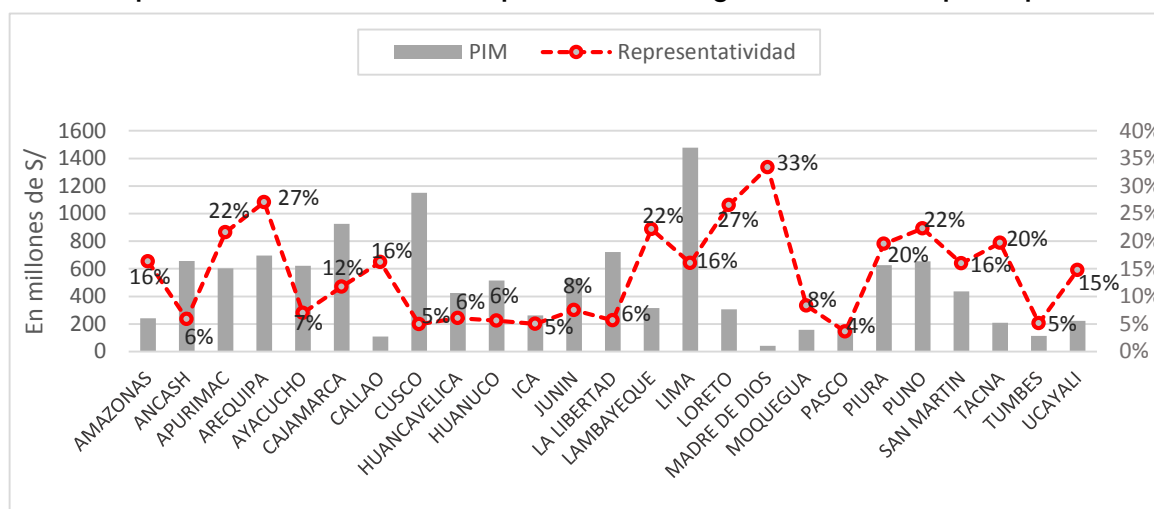**Gráfico 2.1 Representatividad de la cartera priorizada de los gobiernos Locales por Departamento**


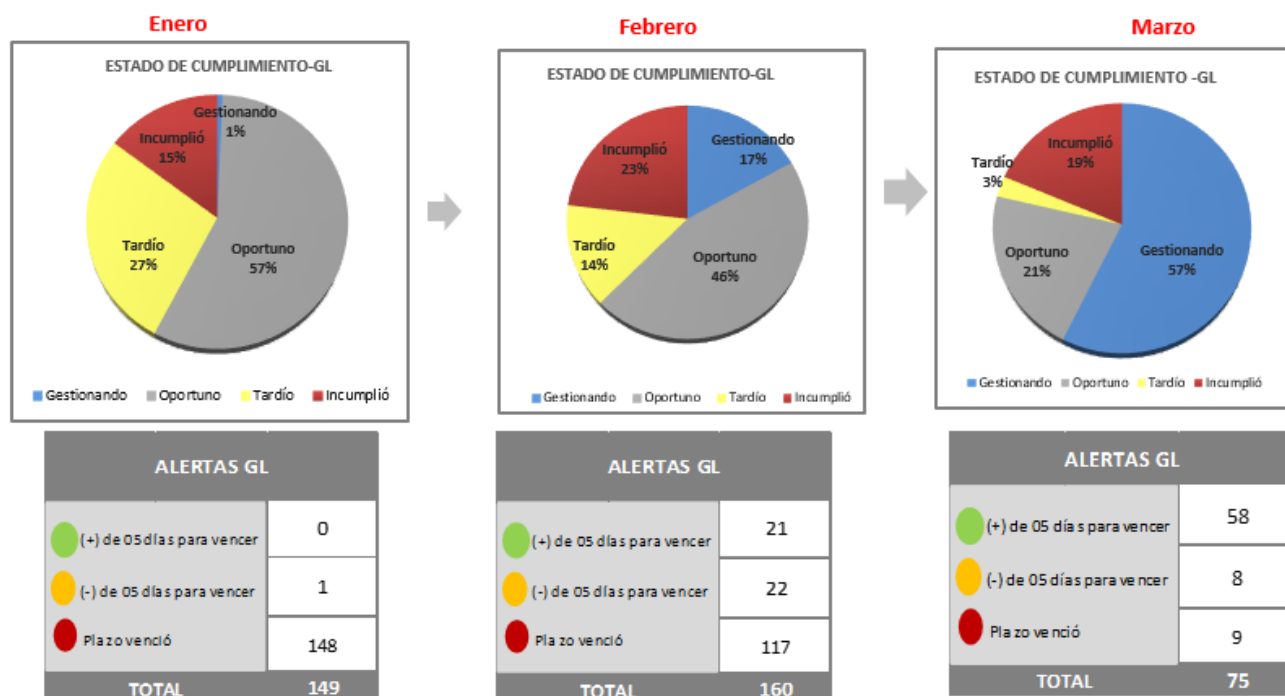
Si bien los gobiernos locales ejecutaron en promedio el 10.1% de la cartera priorizada, el total de las inversiones locales tiene un porcentaje de avance mayor de 14.2%.

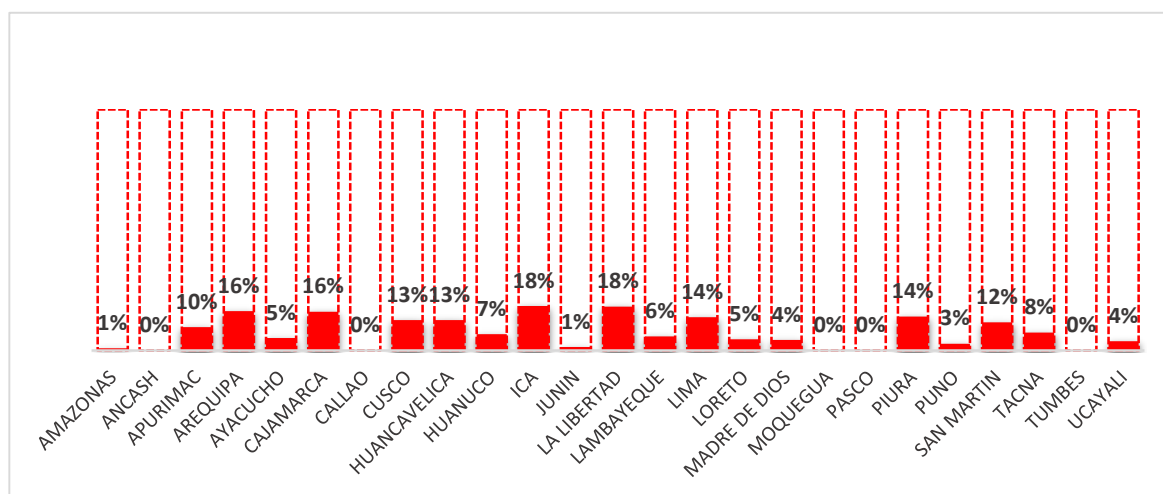**Gráfico 2.2 Avance de ejecución de la cartera priorizada de los gobiernos Locales por Departamento**


### III. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

En 33 Gobiernos locales, se han llevado a cabo durante el I Trimestre sesiones mensuales del Comité de Inversiones, en la cual han participado las áreas involucradas en la gestión de las inversiones como: planeamiento, presupuesto, logística, administración, unidades ejecutoras, programación multianual de inversiones, unidades formuladoras.

En cada una de las sesiones se establecen compromisos que asumen por cada proyecto que presenten cuellos de botella a destrabar, con la finalidad de acelerar la ejecución de las inversiones que ya cuentan con presupuesto asignado en el presente año; estos compromisos, son plasmados en matrices, las cuales tienen permanente seguimiento por parte del equipo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones Sectorial y el equipo de la Dirección de Seguimiento del MEF.



### Evolución de cumplimiento de compromisos de los Gobiernos Locales

## IV. PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL DU 004

Mediante DU N° 004-2017-EF, publicado el 18 de marzo de 2017, se han transferido a 20 departamentos para inversiones locales, la suma de S/ 543.62 millones, siendo asignados de la siguiente manera:

**Cuadro 4.1 Número de PIP y monto transferido por Departamento**

DEPARTAMENTO	N° PIP	MONTO TRANSFERIDO
AMAZONAS	7	30.54
ANCASH	6	23.54
APURIMAC	4	19.52
AREQUIPA	2	42.39
AYACUCHO	10	31.83
CAJAMARCA	6	23.86
CUSCO	6	17.07
HUANCAVELICA	5	24.00
HUANUCO	11	39.14
ICA	2	4.33
JUNIN	2	5.59
LA LIBERTAD	19	83.28
LIMA	13	46.82
LORETO	6	39.75
PASCO	3	11.68
PIURA	9	24.70
PUNO	6	20.72
SAN MARTIN	5	24.05
TACNA	1	5.00
UCAYALI	5	25.83
<b>Total general</b>	<b>128</b>	<b>543.62</b>

## V. PROBLEMAS QUE AFECTA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA

- ❖ Demoras en revisión de expedientes técnicos
- ❖ Retrasos en transferencias de recursos
- ❖ Estudios de preinversión de mala calidad

## VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones

- ❖ La ejecución de la inversión pública a nivel de los Gobiernos Locales, registró un monto de inversión acumulado de S/ 1,732 millones, monto que representa un avance del 14% respecto a su PIM al cierre del mes de marzo, observándose una tendencia creciente en 4% con respecto al mismo período del año 2016.
- ❖ Lima lidera el mayor monto ejecutado con S/ 187 millones, con un avance de ejecución del 13% seguido por Cusco con S/ 177 millones (15%), Cajamarca con S/ 142 millones (15%) y La Libertad con S/ 112 millones (16%), al mes de marzo del 2017.
- ❖ En el I Trimestre, la ejecución de la cartera priorizada fue inferior a la ejecución de la cartera total en los gobiernos locales.
- ❖ En el I Trimestre, en promedio el 41% de compromisos asumidos fueron cumplidos de manera oportuna en los plazos establecidos.

### Recomendaciones

- ❖ Mejorar la programación mensual de ejecución de los recursos destinados a inversiones.
- ❖ Mejorar coordinación entre las Direcciones involucradas en la gestión de los proyectos, con la finalidad de solucionar los cuellos de botella y el porcentaje de compromisos asumidos en los comités de inversiones.



**VII. ANEXO**

En este apartado, se describe la ejecución financiera y el estado situacional de los principales Proyectos de Inversión Pública de las provincias y distritos del país, analizados a nivel de Gobiernos Locales tal como se muestra a continuación:

**3.1. AMAZONAS**

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Amazonas ascienden a S/ 241 millones. Este Departamento ha ejecutado S/ 32 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.1**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**


Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD	20	3	17%	16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE	16	2	12%	14
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA	15	4	24%	12
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	20	4	20%	16
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>70</b>	<b>13</b>	<b>18%</b>	<b>58</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	18	2	9%	16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCAMAR	12	0	0%	12
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	141	18	13%	123
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>171</b>	<b>19</b>	<b>11%</b>	<b>151</b>
<b>DEPARTAMENTO DE AMAZONAS</b>	<b>241</b>	<b>32</b>	<b>13%</b>	<b>209</b>

**Fuente:** Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Condorcanqui – Nieva presenta el mayor monto de ejecución con S/ 4 millones, a nivel de municipalidades provinciales. La Municipalidad Distrital de Jamalca cuenta con la mayor asignación de recursos de inversión a nivel de Municipalidades Distritales (S/ 18 millones).

Asimismo, para la Municipalidad Provincial de Luya, que cuenta con mayores recursos de inversión, resaltan los siguientes proyectos: “Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Inicial en los Distritos de Camporredondo, Providencia, Ocumal y Ocalli”, obra se inició el 05-11-2016, con un avance del 42% al 31.03 y; “Mejoramiento del camino Vecinal El Puente Santo Tomas - Santo Tomas – San Francisco de Tintin, Distrito de Santo Tomas, Provincia de Luya – Amazonas” en procedimiento de selección, la buena pro se otorgará el 17.05.

**Gráfico N° 3.1**

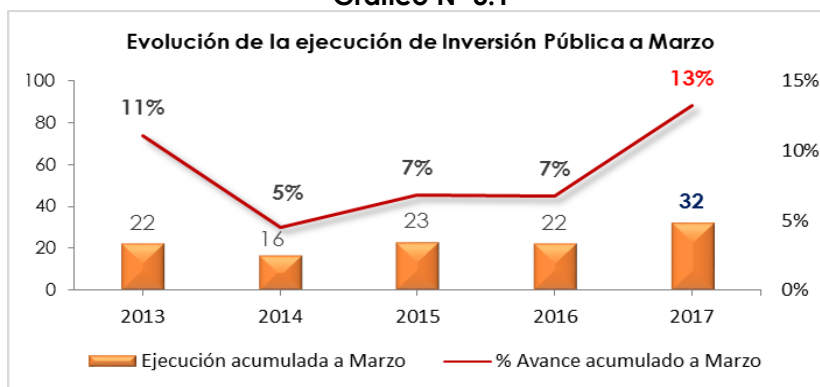

**Fuente:** Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.2. ÁNCASH

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Áncash ascienden a S/ 658 millones. El Departamento Áncash ha ejecutado S/ 82 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.2**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	27	7	24%	21
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ	19	2	8%	17
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI	15	1	10%	14
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	80	10	12%	71
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>142</b>	<b>19</b>	<b>14%</b>	<b>122</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	103	3	3%	100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA	17	1	8%	16
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	396	58	15%	338
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>516</b>	<b>63</b>	<b>12%</b>	<b>454</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ÁNCASH</b>	<b>658</b>	<b>82</b>	<b>12%</b>	<b>576</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Santa - Chimbote muestra el mayor monto de asignación de recursos de inversión a nivel de municipalidades provinciales con S/ 27 millones. La Municipalidad Distrital de San Marcos presente el mayor monto ejecutado a nivel de municipalidades distritales, con un monto que asciende a los S/ 3 millones.

En la Municipalidad Provincial de Huaylas, la cual cuenta con un alto nivel de gasto (S/ 19 millones), destaca el PIP "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Casco Urbano Caraz", obra paralizada y en arbitraje por resolución de contrato de obra; el MVCS recomendó contratar un peritaje para evaluar las acciones implementadas en mérito a su seguimiento.

En la Municipalidad Distrital de San Marcos, que presenta el mayor nivel de gasto (S/ 103 millones), destaca el PIP "I.E. Teófilo Maguñá" con un PIM S/ 3.08 millones, actualmente en ejecución (obra reiniciada por paralización), pero con un pago pendiente por reconocimiento de deuda al Contratista correspondiente a la liquidación de la I Etapa.

**Gráfico N° 3.2**

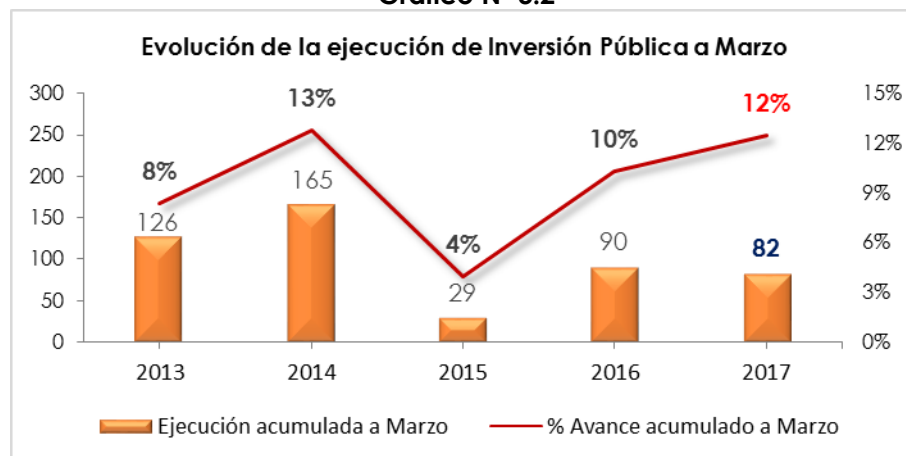

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.3. APURÍMAC

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Apurímac, ascienden a S/ 603 millones. Este Departamento ha ejecutado S/ 87 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.3**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS	65	12	18%	53
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS	57	2	4%	55
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBA - TAMBOBAMBA	28	4	13%	25
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	30	5	17%	25
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>180</b>	<b>23</b>	<b>13%</b>	<b>157</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	52	13	25%	39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI	29	3	11%	25
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	343	49	14%	294
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>423</b>	<b>65</b>	<b>15%</b>	<b>358</b>
<b>DEPARTAMENTO DE APURÍMAC</b>	<b>603</b>	<b>87</b>	<b>14%</b>	<b>515</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas presenta el mayor monto de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con S/ 12 millones. La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho cuenta con la mayor asignación de recursos de inversión a nivel de municipalidades distritales (S/ 52 millones).

Asimismo, a nivel provincial, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, con mayor monto ejecutado, resaltan los siguientes proyectos: PIP "Saneamiento de Andahuaylas y Talavera", en ejecución por Contrata desde 2016, con un avance físico de 30.28 % y financiero de S/ 13.6 millones, el cual reiniciará ejecución en abril; PIP "Dos Instituciones Educativas Secundarias", culminado en enero del 2017 y en proceso de liquidación.

En cuanto a Distritos, la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho es la que cuenta con un mayor PIM (S/ 54 millones) y un avance de ejecución de 27%. Dentro de sus principales dificultades se considera la existencia de conflictos con la población que exige a las autoridades que los proyectos se ejecuten por Administración Directa, así como paralizaciones de obra por conflictos sociales.

**Gráfico N° 3.3**

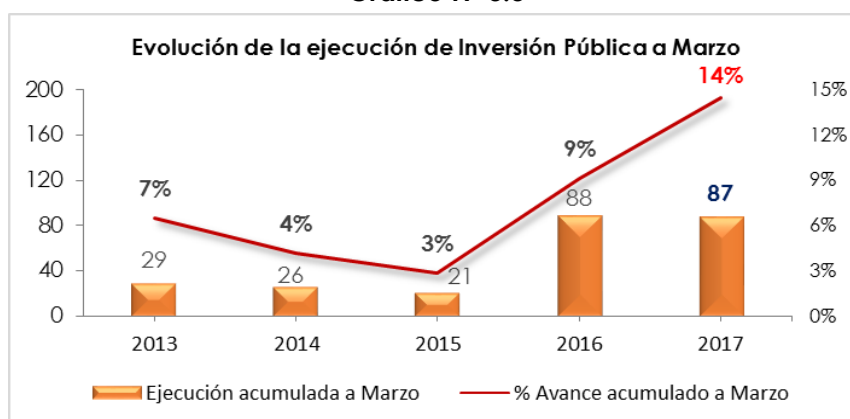

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.4. AREQUIPA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Arequipa ascienden a S/ 696 millones. Este Departamento ha ejecutado S/ 99 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.4**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	74	8	11%	66
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA	29	1	2%	28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA	19	3	17%	16
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	43	4	9%	39
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>165</b>	<b>16</b>	<b>10%</b>	<b>149</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	52	3	7%	49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA	36	4	11%	32
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	443	76	17%	367
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>531</b>	<b>83</b>	<b>16%</b>	<b>448</b>
<b>DEPARTAMENTO DE AREQUIPA</b>	<b>696</b>	<b>99</b>	<b>14%</b>	<b>597</b>


**Fuente:** Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Arequipa presenta el mayor monto ejecutado a nivel de municipalidades provinciales con S/ 8 millones. La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado cuenta con la mayor asignación de recursos de inversión a nivel de municipalidades distritales (S/52 millones).

Asimismo, para la Municipalidad Provincial de Arequipa, presenta la mayor asignación de recursos a nivel de todas las municipalidades aunque con un menor nivel de ejecución, en ella resaltan 02 proyectos de infraestructura vial: "Mejoramiento del intercambio vial entre las Av. La Salud/ Av. Los Incas-Av. Dolores", que tiene un nivel de avance financiero de 55.01%; y "Mejoramiento integral y sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa", para el cual se viene preparando el expediente de contratación para ejecución.

En la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con mayores recursos entre las municipalidades distritales, resaltan los siguientes proyectos: "Mejoramiento del servicio educativo de la IE N° 40035", con un nivel de ejecución de 98%, y el PIP "Infraestructura peatonal y ornato público de vías" con avance de ejecución de 54.31%, actualmente paralizado por modificación de expediente

**Gráfico N° 3.4**

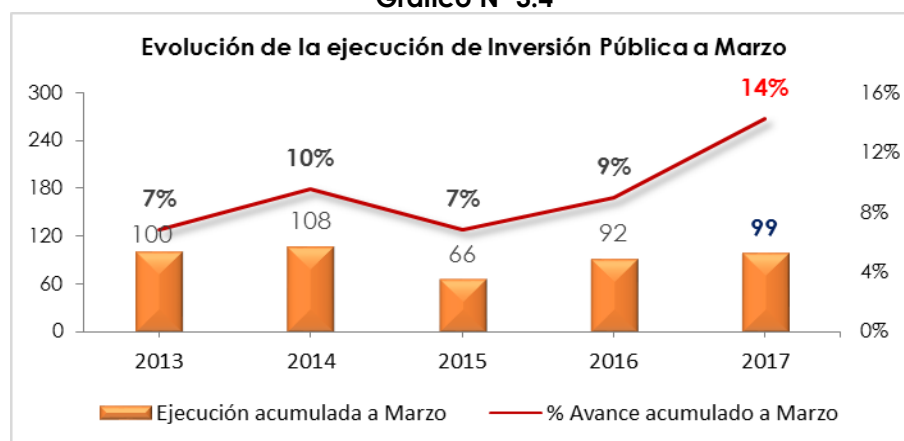

**Fuente:** Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.5. AYACUCHO

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Ayacucho ascienden a S/ 621 millones. Este Departamento ha ejecutado S/ 65 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.5**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	38	3	8%	35
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN	30	1	3%	29
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL	23	1	5%	22
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	61	6	10%	55
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>153</b>	<b>11</b>	<b>7%</b>	<b>141</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	31	4	14%	27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS	27	0	2%	27
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	410	48	12%	362
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>469</b>	<b>53</b>	<b>11%</b>	<b>415</b>
<b>DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</b>	<b>621</b>	<b>65</b>	<b>10%</b>	<b>557</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Huamanga presenta el mayor porcentaje de ejecución con 8% de avance, a nivel de las municipalidades provinciales con mayor presupuesto. La Municipalidad Distrital de Vinchos cuenta con el mayor nivel de asignación de recursos de inversión (S/ 31 millones), a nivel de municipalidades distritales.

En la Municipalidad Provincial de Huamanga, con el mayor nivel de gasto (S/ 38 millones), resalta el PIP "Drenaje Pluvial Margen Izquierda del Río Alameda y Centro Histórico", financiado por el MVCS para la ejecución de obras correspondientes a las etapas V y VI, que representan una inversión de S/ 20.27 millones, la etapa V programa su ejecución durante los meses de marzo y abril.

En la Municipalidad Distrital de Acocro, con un alto nivel de gasto (S/ 19 millones), resalta el PIP "Servicio Educativo en 5 I.E. Localidades de Andaraccay, Matara, Parcco, Tallana y Yanahuanco", financiando por FONIPREL, que representa una inversión de S/ 7.52 millones, obra cuyo avance físico real es de 4.99% al mes de febrero.

**Gráfico N° 3.5**

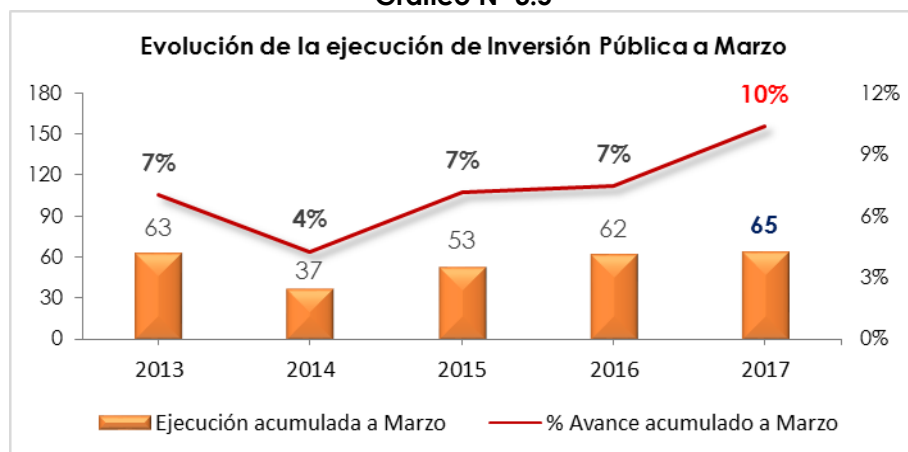

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.6. CAJAMARCA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Cajamarca ascienden a S/ 925 millones en ciento veintisiete (127) entidades de las cuales ciento catorce (114) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Cajamarca ha ejecutado S/ 142 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.6**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	76	7	9%	69
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	39	2	5%	37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	31	4	12%	27
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	158	23	14%	136
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>305</b>	<b>35</b>	<b>12%</b>	<b>269</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAÑADA	31	10	31%	21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA	27	1	5%	25
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	563	96	17%	467
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>620</b>	<b>107</b>	<b>17%</b>	<b>514</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</b>	<b>925</b>	<b>142</b>	<b>15%</b>	<b>783</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Cajamarca presenta el mayor monto de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con S/ 7 millones. La Municipalidad Distrital de Encañada cuenta con la mayor asignación de recursos a nivel de Municipalidades Distritales (S/ 31 millones).

Asimismo, en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, resalta el proyecto “Servicios Educativos de la I.E 82668 San Juan de Lacamaca”; con inicio de ejecución el 05.08.2016 y avance físico del 90%, esperando presentación de valorización.

La Municipalidad Distrital de La Asunción viene ejecutando el proyecto “Servicio Educativo de nivel primario de las Instituciones Educativas N° 821201 - Pampas de Chamani, N° 821146 - Shirac, N° 82128 - Catulla, N° 82129 - Huayllagual, N° 821492 - Sausalito, N° 821405 - Conga Cruz y N° 821537 - Cruz de Huatun”, financiando por FONIPREL, que representa una inversión de S/9.2 millones, con avance físico de 97% a la fecha.

**Gráfico N° 3.6**

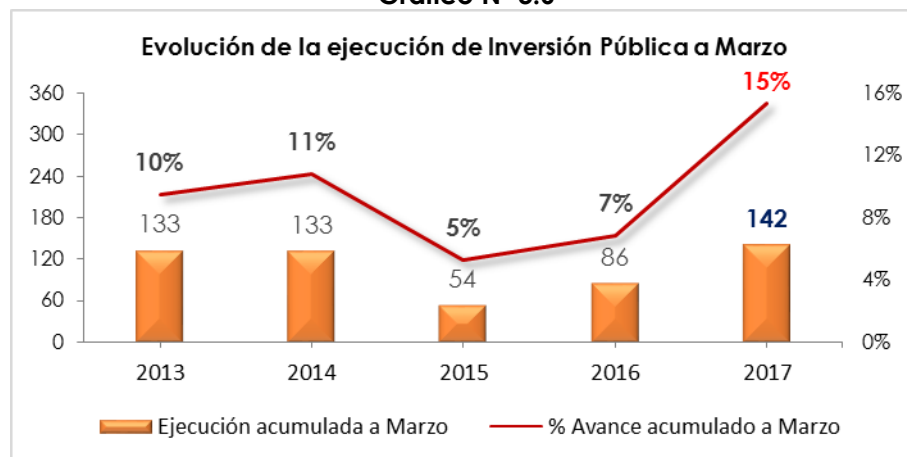

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.



### 3.7. PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en la Provincia Constitucional del Callao ascienden a S/ 109 millones distribuidos en siete (7) entidades. La Provincia Constitucional del Callao ha ejecutado S/ 13 millones. El avance financiero de las entidades de la provincia se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.7**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	23	5	21%	18
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>21%</b>	<b>18</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	27	1	3%	26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	22	3	13%	19
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	37	5	68%	32
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>86</b>	<b>8</b>	<b>10%</b>	<b>78</b>
<b>PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO</b>	<b>109</b>	<b>13</b>	<b>12%</b>	<b>96</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que los recursos de inversión asignados a las municipalidades distritales en conjunto ascienden a S/ 86 millones. La Municipalidad Provincial del Callao presenta un 21% de ejecución financiera. A nivel de municipalidades distritales, la Municipalidad Distrital de Ventanilla cuenta con la mayor asignación de recursos de inversión, con un monto que asciende a los S/ 27 millones.

En la Municipalidad Provincial del Callao, con un nivel de gasto de S/ 23 millones, cabe resaltar los siguientes proyectos: PIP "Sistema de Riego por Cisterna", por convocar procedimiento para adquisición de vehículos y PIP "Pistas Veredas Cercado Zona 15", obra a ejecutar por contrata y cuyo procedimiento de selección está a cargo de la empresa municipal FINVER Callao.

En la Municipalidad Distrital de Bellavista, con un alto nivel de gasto (S/ 22 millones), cabe resaltar el PIP "Pistas y Rampas Peatonales San José", con un PIM de S/ 17.70 mill., cuyo procedimiento para ejecución, convocado en febrero, se dilata por reprogramación reiterada del calendario (plazo de registro de participantes).

**Gráfico N° 3.7**

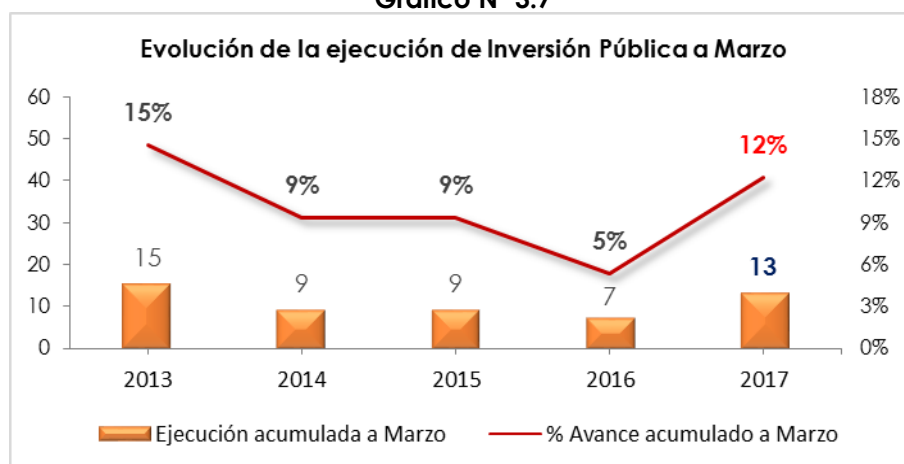

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.8. CUSCO

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Cusco ascienden a S/ 1,150 millones en ciento once (111) entidades, de las cuales noventa y ocho (98) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Cusco ha ejecutado S/ 177 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.8**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO	55	6	11%	49
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR	52	19	36%	34
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA	28	3	10%	25
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	90	22	24%	68
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>226</b>	<b>50</b>	<b>22%</b>	<b>176</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI	182	11	6%	171
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	54	1	3%	53
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	688	115	17%	573
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>924</b>	<b>128</b>	<b>14%</b>	<b>796</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CUSCO</b>	<b>1,150</b>	<b>177</b>	<b>15%</b>	<b>973</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Espinar presenta el mayor monto de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con S/ 19 millones. En cuanto a municipalidades distritales, la Municipalidad Distrital de Echarati cuenta con la mayor asignación de recursos de inversión (S/ 182 millones), monto que representa el 20% de recursos asignados al total de municipalidades distritales.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Espinar, tiene el mayor nivel de ejecución y resaltan los proyectos: "I.E. Sagrado Corazón de Jesús y I.E. Ladislao Espinar", que tienen avance financiero de 19% y 11% respectivamente, ambos se ejecutan por Contrata y presentan un avance físico de 21.12% y 12.70% respectivamente.

En cuanto a Distritos, la Municipalidad Distrital de San Sebastián, es la que presenta el mayor porcentaje de ejecución, alcanzando el 19.4% de avance. El proyecto: "Saneamiento Alto Qosqo", que tiene el mayor PIM S/ 16.17 millones, tiene un nivel de avance financiero de 24% y en físico 35.31%, el proyecto se ejecuta por administración directa.

**Gráfico N° 3.8**

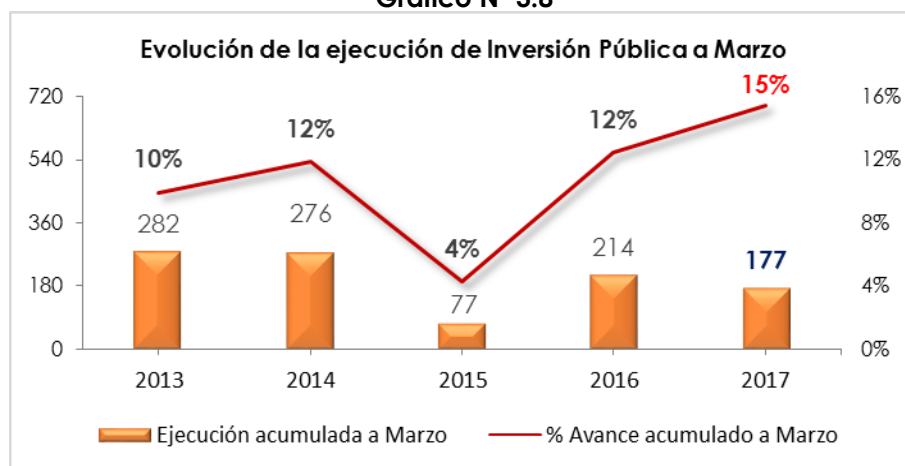

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.



### 3.9. HUANCAMELICA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Huancavelica ascienden a S/ 426 millones distribuidos en noventa y ocho (98) entidades, de las cuales noventa y uno (91) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Huancavelica ha ejecutado S/ 52 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.9**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY	18	1	6%	17
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	15	2	11%	13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS	12	2	13%	11
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	22	3	12%	19
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>10%</b>	<b>60</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	28	2	6%	26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	22	4	16%	19
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	308	40	13%	268
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>359</b>	<b>45</b>	<b>13%</b>	<b>313</b>
<b>DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA</b>	<b>426</b>	<b>52</b>	<b>12%</b>	<b>373</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Tayacaja - Pampas presenta el mayor porcentaje de ejecución, entre las provincias con mayor presupuesto, con un 13% de avance. A nivel de municipalidades distritales con mayores recursos de inversión, la Municipalidad Distrital de Huaribamba muestra el mayor monto de ejecución con S/ 4 millones.

Asimismo, en la Municipalidad Distrital de Huaribamba, se destaca el proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en las Localidades de Anta y Churampi, que tiene asignado S/ 5.1 millones de PIM y al mes de marzo tiene un avance financiero del 17%; el proyecto de Saneamiento en la Localidad de Huaribamba (PIM 3.7 mill) con una ejecución del 34.9% con respecto a lo asignado en el presente año.

Los proyectos de la MD Acoria, registran un menor nivel de ejecución (5.6%), debido a que en el mes de marzo la municipalidad recibió transferencias por la suma de S/ 12 millones para dos proyectos de Saneamiento y S/ 3.1 millones para el proyecto Carretera Vecinal Lirio – Chunca, los cuales se encuentran en procesos para las convocatorias respectivas.

**Gráfico N° 3.9**

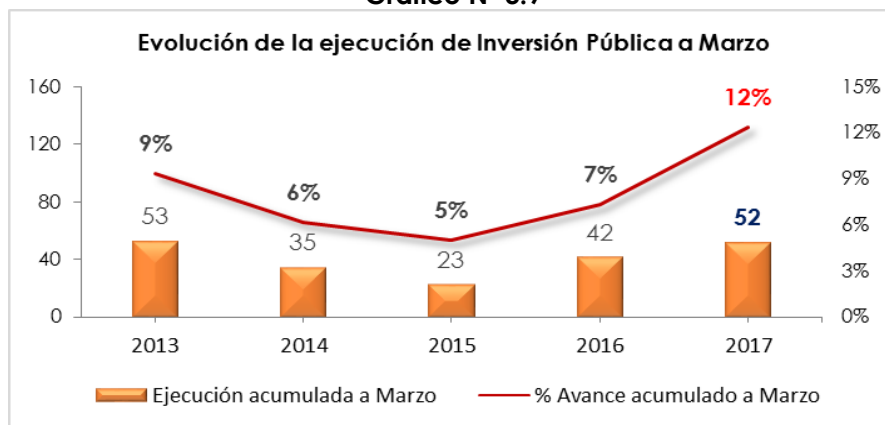

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.10. HUÁNUCO

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Huánuco ascienden a S/ 516 millones distribuidos en setenta y ocho (78) entidades, de las cuales sesenta y siete (67) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Huánuco ha ejecutado S/ 71 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.10**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO	31	1	3%	30
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - CHAVINILLO	29	2	7%	27
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	24	3	14%	21
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	85	13	16%	71
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>12%</b>	<b>150</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE	25	7	27%	19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO	24	3	10%	22
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	297	42	14%	255
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>347</b>	<b>52</b>	<b>15%</b>	<b>295</b>
<b>DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO</b>	<b>516</b>	<b>71</b>	<b>14%</b>	<b>445</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Puerto Inca presenta el mayor porcentaje de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con mayores recursos con un 14% de avance financiero. La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle cuenta con la mayor asignación de recursos de inversión a nivel distrital (S/ 25 millones).

Asimismo, para la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, que cuenta con el mayor porcentaje de ejecución, resalta el proyecto: "Creación del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Puerto Inca, Distrito de Puerto Inca, Provincia de Puerto Inca - Huánuco", en elaboración de los Términos de Referencia para la convocatoria de ejecución de obra.

Para la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, que cuenta con un mayor nivel de ejecución del total de municipalidades distritales, resalta el proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad de los tramos: Huánuco Pte. Conchumayo - C.P. Mercenario - C.P. Mitoquera, distrito de Santa María del Valle - Huánuco", en ejecución y con un avance físico 3.10%.

**Gráfico N° 3.10**

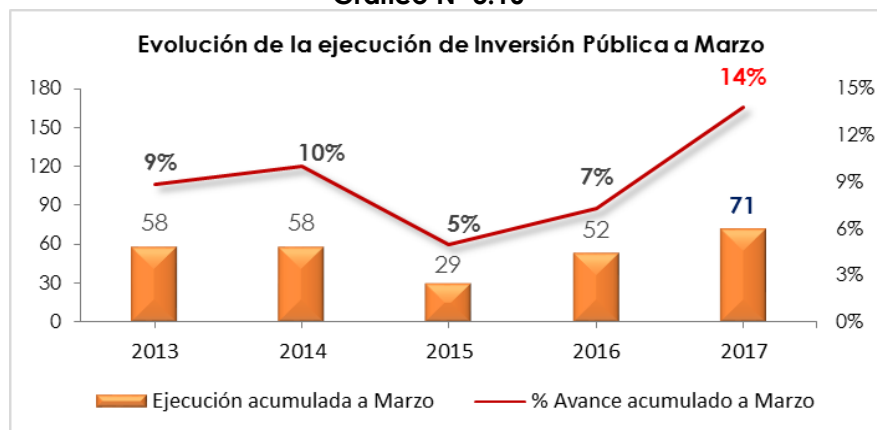

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.11. ICA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Ica ascienden a S/ 262 millones. Este Departamento ha ejecutado S/ 44 millones. El avance financiero de las entidades del sector se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.11**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	38	3	7%	36
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA - CHINCHA ALTA	21	2	9%	19
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	17	1	4%	16
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	12	2	14%	10
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>88</b>	<b>7</b>	<b>8%</b>	<b>81</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGUIÑA	27	11	40%	16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA	16	6	35%	10
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	132	21	16%	111
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>174</b>	<b>38</b>	<b>22%</b>	<b>137</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ICA</b>	<b>262</b>	<b>44</b>	<b>17%</b>	<b>218</b>


**Fuente:** Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Chincha presenta el mayor porcentaje de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con un 9% de avance, considerando las provincias con mayores recursos. La Municipalidad Distrital de Tinguña muestra la mayor asignación de recursos de inversión a nivel de municipalidades distritales en el departamento con un monto que asciende a los S/ 27 millones, con un avance del 40%.

Asimismo, a nivel provincial, la Municipalidad Provincial de Ica, firmó contrato en enero del presente año para la ejecución del PIP Mejoramiento del servicio de Agua Potable en los sectores de Abastecimiento S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-08, S-13, S-15 Y S-16 del distrito de Ica, el cual ha ejecutado S/ 0.81 millones.

En cuanto a Distritos, la Municipalidad Distrital de Rio Grande, es la que cuenta con un mayor porcentaje de ejecución, alcanzando el 58.7% de avance, seguido de la MD de Tate 53%. Asimismo, la MD de Changuillo y La Tinguña, se encuentran ejecutando PIP's por S/9.86 mill y 6.02 mill respectivamente con un avance en su ejecución del 8.10% y el 39.43%, en el primer caso la obra se encuentra paralizada por las lluvias intensas que hicieron colapsar las vías de acceso y en la MD de La Tinguña la obra se encuentra adelantada.

**Gráfico N° 3.11**

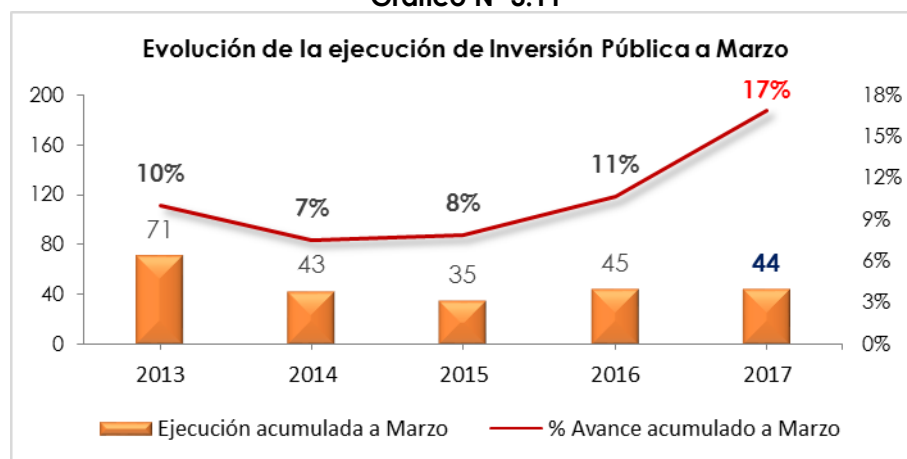

**Fuente:** Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

**3.12. JUNÍN**

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Junín ascienden a S/ 527 millones distribuidos en ciento veintidós (122) entidades, de las cuales ciento trece (113) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Junín ha ejecutado S/ 59 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.12**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	47	8	18%	39
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	41	2	5%	39
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO	13	1	8%	12
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	46	5	11%	41
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>147</b>	<b>16</b>	<b>11%</b>	<b>131</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI	31	2	5%	29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA	20	1	5%	19
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	330	40	12%	290
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>380</b>	<b>42</b>	<b>11%</b>	<b>338</b>
<b>DEPARTAMENTO DE JUNÍN</b>	<b>527</b>	<b>59</b>	<b>11%</b>	<b>469</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Huancayo presenta el mayor monto de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con un monto que asciende a los S/ 8 millones. La Municipalidad Distrital de Mazamari cuenta con la mayor asignación de recursos de inversión a nivel de municipalidades distritales (S/31 millones).

Asimismo, se puede observar que en la Municipalidad provincial de Huancayo, se encuentra el proyecto Del Puente Colón, con un PIM de S/ 5.27 millones, con un avance financiero del 12% por pago de 1ra valorización por S/ 0.6 millones y el pago de la Valorizaciones 5 y 6 del PIP de Seguridad Ciudadana por S/ 1.14 millones.

Las Municipalidades Distritales de Andamarca y Mazamari, presentan menores niveles de ejecución (5%); en el primer caso debido a que la ejecución del PIP de Saneamiento con un PIM de S/. 9,68 millones inició su ejecución el 20.03 y el PIP de Carretera con un PIM S/ 8,91 se encuentra paralizado por causas climatológicas; en el caso de la MD Mazamari se explica por el retraso en la elaboración de TdR para la ejecución de los PIPs de Saneamiento de San Isidro y Ciudad Satélite cofinanciados por FONIPREL que en suma hacen un PIM de S/ 14.7 millones.

**Gráfico N° 3.12**

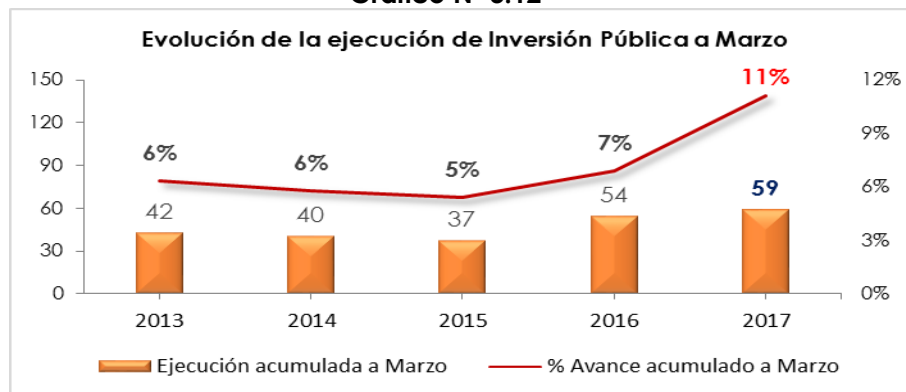

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.13. LA LIBERTAD

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados para la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento La Libertad ascienden a S/ 723 millones. Este Departamento ha ejecutado S/ 112 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.13**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	30	2	8%	28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	29	3	9%	26
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	28	5	16%	23
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	90	11	13%	78
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>176</b>	<b>21</b>	<b>12%</b>	<b>155</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	40	12	30%	28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN	33	8	24%	25
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	473	71	15%	402
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>546</b>	<b>91</b>	<b>17%</b>	<b>455</b>
<b>DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD</b>	<b>723</b>	<b>112</b>	<b>16%</b>	<b>611</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco muestra el mayor porcentaje de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con un 16% de avance. En cuanto a las municipalidades distritales con mayores recursos de inversión, la Municipalidad Distrital de Chugay presenta el mayor monto ejecutado con S/ 12 millones.

En la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, que presenta un alto nivel de gasto (S/28 millones), destaca el PIP "Servicio Agua Potable y Disposición de Excretas Caserío Huaran Uningambal", obra cuya ejecución muestra un avance físico real de 29.79% a marzo.

En la Municipalidad Distrital de Chugay, que presenta el mayor nivel de gasto (S/ 40 millones), destaca el PIP "Sistema Agua Potable y Alcantarillado Localidad de Chugay", obra que registra un avance físico real de 15.54%, retrasada dadas las condiciones climatológicas.

**Gráfico N° 3.13**

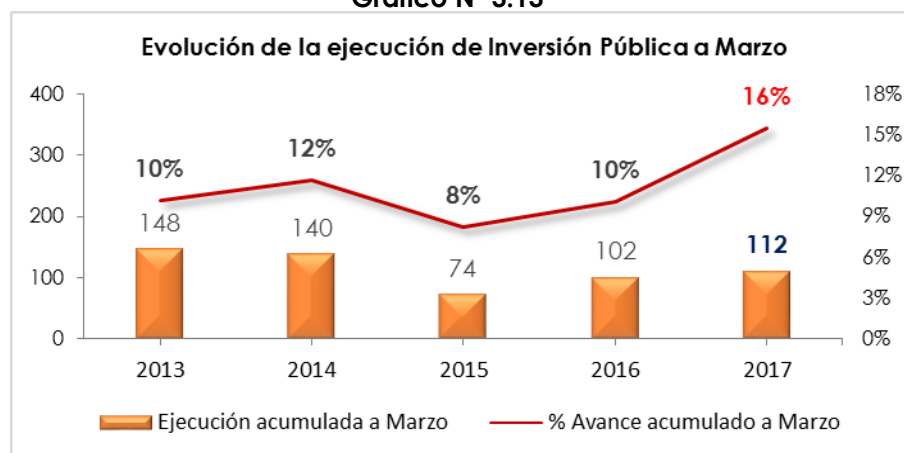

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.14. LAMBAYEQUE

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Lambayeque ascienden a S/ 316 millones. Este Departamento ha ejecutado S/ 41 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.14**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	26	2	8%	24
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE	17	2	10%	16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	3	1	20%	2
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>10%</b>	<b>41</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU	35	0	1%	34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	31	3	10%	28
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	205	33	16%	172
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>271</b>	<b>36</b>	<b>13%</b>	<b>234</b>
<b>DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE</b>	<b>316</b>	<b>41</b>	<b>13%</b>	<b>276</b>


**Fuente:** Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Ferreñafe presenta el mayor porcentaje de avance a nivel de municipalidades provinciales con 20% de avance. La Municipalidad Distrital de Monsefú cuenta con la mayor asignación de recursos a nivel de municipalidades distritales (S/ 35 millones).

Asimismo, para la Municipalidad Provincial de Chiclayo, capital del Departamento, que cuenta con una mayor asignación de presupuesto, resalta el proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal entre la Av. El Ejercito, Av. 9 de octubre, Av. Pedro Cieza de Leon, Av. El Carmen y la Av. Pacifico del Pueblo Joven 9 de octubre-Distrito de Chiclayo" el cual se encuentra en actos preparatorios para el procedimiento de selección.

Para la Municipalidad Distrital de Monsefú, que presenta una mayor asignación de recursos, es necesario resaltar que su principal proyecto es "Mejoramiento del plan maestro de saneamiento agua potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales del distrito de Monsefu - Chiclayo" el mismo que empezó a ejecutarse desde el 17 de Marzo del presente.

**Gráfico N° 3.14**

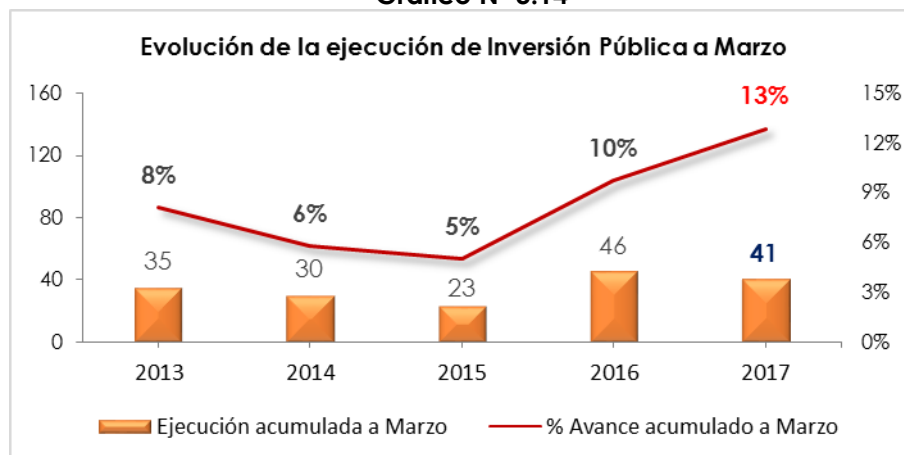

**Fuente:** Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.



### 3.15. LIMA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Lima ascienden a S/ 1,478 millones. Este Departamento ha ejecutado S/ 187 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.15**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	418	55	13%	363
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE	23	2	11%	21
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	17	2	11%	15
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	37	4	10%	34
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>495</b>	<b>62</b>	<b>13%</b>	<b>433</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE	67	11	16%	56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	60	8	13%	52
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	857	106	12%	751
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>983</b>	<b>124</b>	<b>13%</b>	<b>859</b>
<b>DEPARTAMENTO DE LIMA</b>	<b>1,478</b>	<b>187</b>	<b>13%</b>	<b>1291</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Metropolitana de Lima presenta el mayor monto de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con S/ 55 millones. La Municipalidad Distrital de Ate muestra un porcentaje de avance de 16% a nivel de las municipalidades distritales con mayores recursos de inversión asignados.

En la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, con un nivel de gasto de S/ 418 millones, resalta el PIP "Servicio de Fiscalización de Transporte Urbano", con un PIM de S/ 77.95 millones, ejecutado a través de una APP, a cargo de Protransporte, cuyo plazo para la 1ra y 2da Etapa ha sido reprogramado hacia diciembre 2017.

En la Municipalidad Distrital de Ate-Vitarte, con el mayor nivel de gasto (S/ 67 millones), resalta el PIP "Creación Complejo Ollantaytambo", con un PIM S/ 26.40 millones, obra cuyo avance físico real es de 2.13 % a febrero; se solicitó pago de Adelanto de Materiales, por S/ 11.60 millones, cuya subsanación de observaciones está pendiente de opinión por la Supervisión.

**Gráfico N° 3.15**

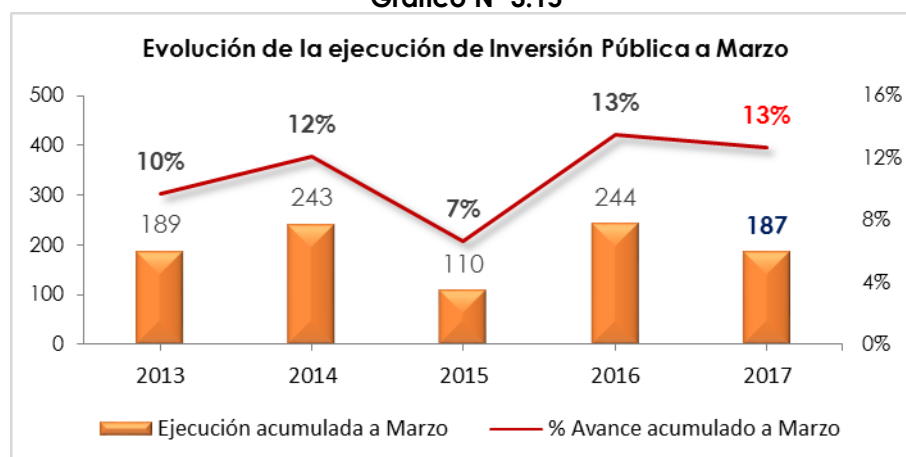

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.16. LORETO

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Loreto ascienden a S/ 308 millones. Este Departamento ha ejecutado S/ 57 millones de Soles. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.16**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS	53	5	9%	48
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	22	2	10%	19
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON	15	1	8%	14
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	30	7	23%	23
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>119</b>	<b>15</b>	<b>12%</b>	<b>104</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIGRE	14	2	14%	12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN	14	1	9%	13
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	160	39	24%	122
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>189</b>	<b>42</b>	<b>22%</b>	<b>147</b>
<b>DEPARTAMENTO DE LORETO</b>	<b>308</b>	<b>57</b>	<b>18%</b>	<b>251</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial del Alto Amazonas – Yurimaguas presenta el mayor porcentaje de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con un 10% de avance. Las Municipalidades Distritales de Tigre y Belén cuentan con la mayor asignación de recursos a nivel de municipalidades distritales (S/ 42 millones cada una).

Para la Municipalidad Provincial de Maynas, que cuenta con mayor PIM, resaltan los siguientes proyectos: “Mejoramiento de las calles en la Jurisdicción de los AA.HH. 1ro. de enero, Cesar I. Silva, Rony Valera y Juan Isern Córdova, distrito de Iquitos”, que se encuentra en actuaciones preparatorias para convocar el procedimiento de selección para contratar la ejecución y “Mejoramiento de las vías del Jr. Moore (jr. Yavari av. Mariscal Caceres), Jr. Sgto. Lores (Jr. Arica Jr. Alzamora), Jr. Morona (Jr. Castilla Malecón Tarapacá), Jr. Fanning y Jr. Bolognesi (call. Yavari Av. Mariscal Caceres), distrito de Iquitos”, con buena pro adjudicada, se proyecta la firma de contrato para el 21.04.2017.

Asimismo, para la Municipalidad Distrital de Belén, que cuenta con un menor nivel de ejecución, resalta el siguiente proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de la IE PSM N 60014 PP.JJ. Santo Cristo de Bagazán”, que se encuentra en ejecución con avance físico de 43.83% al 31.03.17.

**Gráfico N° 3.16**

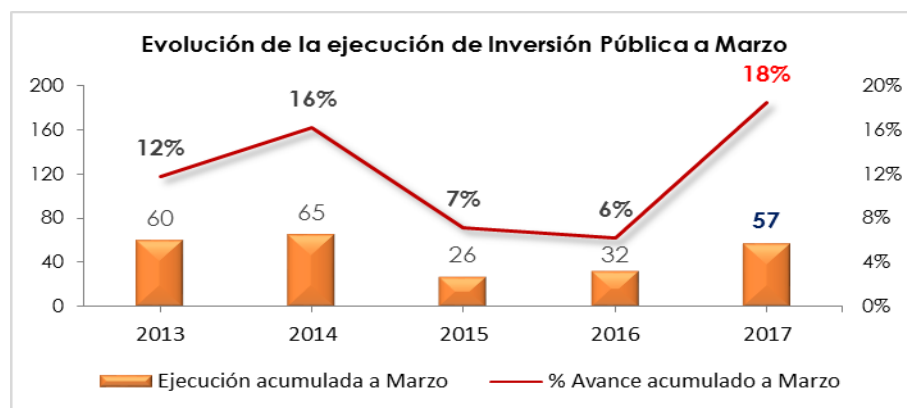

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.



### 3.17. MADRE DE DIOS

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Madre de Dios ascienden a S/ 42 millones distribuidos en once (11) entidades, de las cuales ocho (8) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Madre de Dios ha ejecutado S/ 6 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.17**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA	13	2	16%	11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU - IÑAPARI	2	0.3	14%	2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU	1	0.1	12%	1
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>15%</b>	<b>14</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	14	2	12%	12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO	4	0	11%	4
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	8	1	18%	6
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>14%</b>	<b>22</b>
<b>DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>14%</b>	<b>36</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Tambopata presenta el mayor monto de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con S/ 2 millones. La Municipalidad Distrital de Madre de Dios cuenta con el mayor monto de recursos asignados, a nivel de municipalidades distritales, con un monto que asciende a los S/ 14 millones.

Asimismo, para la Municipalidad Provincial de Tambopata, que cuenta con un mayor nivel de ejecución, resalta el proyecto: PIP "Vía Jr. San Martín", con un PIM de S/ 3,2 millones, que se ejecutará por administración directa, teniendo previsto iniciar la ejecución física en el mes de mayo, debido a factores climáticos.

También, en la Municipalidad Distrital de Madre de Dios, resalta el siguiente proyecto: "Saneamiento en la localidad de Boca Colorada", con un PIM de S/ 6,45 millones, y es cofinanciado por FONIPREL. Se encuentra en proceso de convocatoria y se prevé otorgar la buena pro para la ejecución, en el mes de abril 2017.

**Gráfico N° 3.17**

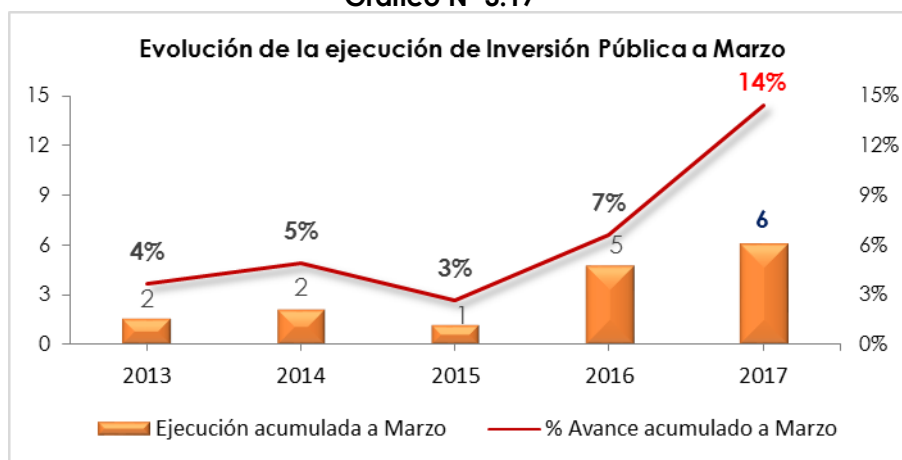

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.18. MOQUEGUA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Moquegua ascienden a S/ 157 millones distribuidos en veinte (20) entidades, de las cuales diecisiete (17) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Moquegua ha ejecutado S/ 33 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.18**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**


Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	54	18	34%	36
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO	28	3	10%	25
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE	6	2	27%	4
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>88</b>	<b>23</b>	<b>26%</b>	<b>65</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA	18	4	23%	14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS	8	1	10%	7
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	43	5	12%	38
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>69</b>	<b>10</b>	<b>15%</b>	<b>59</b>
<b>DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA</b>	<b>157</b>	<b>33</b>	<b>21%</b>	<b>124</b>

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto presenta el mayor monto de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con S/ 18 millones. La Municipalidad Distrital de Torata muestra el mayor monto ejecutado a nivel de municipalidades distritales con S/ 4 millones.

Para la Municipalidad Distrital de Samegua, que cuenta con un menor nivel de ejecución, su principal dificultad radica en desfinanciamiento de obras que se iniciaron en la administración anterior y presentan deficiencias en la construcción; la Municipalidad Distrital de Samegua supera paulatinamente las dificultades de saneamiento físico legal y variaciones en la fase de inversión; como consecuencia, para algunos proyectos se viene elaborando reprogramaciones aceleradas de ejecución obra, y otros se encuentran en proceso de liquidación para efectuar el cierre del proyecto. Esta municipalidad prepara documentación complementaria para ser remitida al Ministerio de Vivienda y Saneamiento, como parte del compromiso asumido para la transferencia de recursos.

**Gráfico N° 3.18**

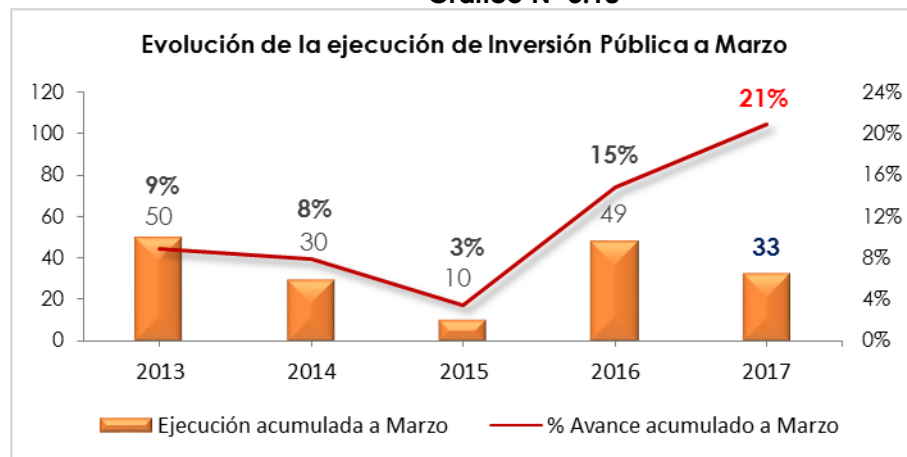

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

**3.19. PASCO**

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Pasco ascienden a S/ 169 millones, distribuidos en veintinueve (29) entidades, de las cuales veintiséis (26) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Pasco ha ejecutado S/ 24 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.19**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA	16	1	5%	16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	15	1	8%	14
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION - YANAHUANCA	7	1	17%	6
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>9%</b>	<b>35</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	32	5	15%	27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	13	0	1%	13
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	85	15	18%	70
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>131</b>	<b>20</b>	<b>15%</b>	<b>110</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PASCO</b>	<b>169</b>	<b>24</b>	<b>14%</b>	<b>146</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Daniel A. Carrión, presenta el mayor porcentaje de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con un 17% de avance. A nivel de municipalidades distritales con mayores recursos de inversión, la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar presenta un monto de ejecución que asciende a S/ 5 millones, el mayor monto ejecutado a nivel distrital.

Asimismo, para la Municipalidad Provincial de Daniel A. Carrión, que cuenta con un mayor nivel de ejecución, resalta el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Chinche Tingo, Distrito de Yanahuanca, Provincia de Daniel Alcides Carrión - Pasco", en elaboración de Expediente Técnico de Obra.

Para la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, la cual presenta un mayor nivel de ejecución del total de municipalidades distritales, resalta el proyecto: "Mejoramiento de la Prestación de Servicio Educativo en el Nivel Inicial y Primario en la I.E.34033 Progreso en el Centro Poblado de Paragsha, Distrito de Simón Bolívar – Pasco", con expediente técnico aprobado, para iniciar con la convocatoria de ejecución de obra.

**Gráfico N° 3.19**

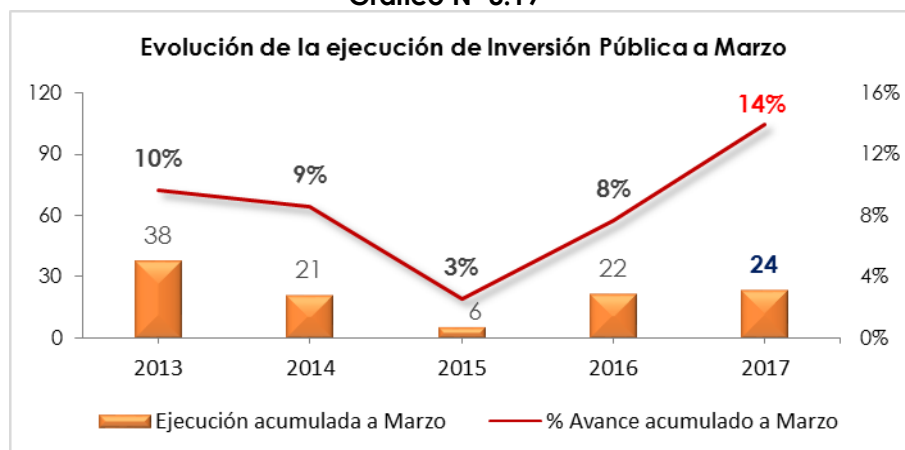

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.20. PIURA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Piura ascienden a S/ 625 millones, distribuidos en sesenta y cuatro (64) entidades, de las cuales cincuenta y seis (56) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Piura ha ejecutado S/ 105 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.20**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	PASCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	79	17	21%	63
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	38	5	14%	33
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS	38	5	13%	33
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	97	16	17%	81
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>252</b>	<b>43</b>	<b>17%</b>	<b>210</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	43	7	16%	36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	26	5	18%	22
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	304	50	17%	253
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>373</b>	<b>62</b>	<b>17%</b>	<b>311</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PIURA</b>	<b>625</b>	<b>105</b>	<b>17%</b>	<b>521</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Sullana presenta el mayor porcentaje de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con un 21% de avance. La Municipalidad Distrital de Catacaos cuenta con la mayor asignación de recursos a nivel de municipalidades distritales, con un monto que asciende a los S/ 43 millones.

Así mismo la Municipalidad Provincial de Sullana, viene ejecutando el Proyecto Mejoramiento de La Carretera Vecinal desde El Boquerón de Nuñez en Bellavista Hasta Chilaco en Lancones con un monto de inversión de S/ 70 millones financiado con transferencia del MTC teniendo un avance de ejecución física de 48.97%.

En lo que respecta a la Municipalidad Distrital de Catacaos, ha suscrito un contrato por S/ 53 mill., para la ejecución de la Obra del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Caseríos La Legua con un plazo de ejecución de 540 dc. Se espera que inicie obra en el mes de abril.

**Gráfico N° 3.20**

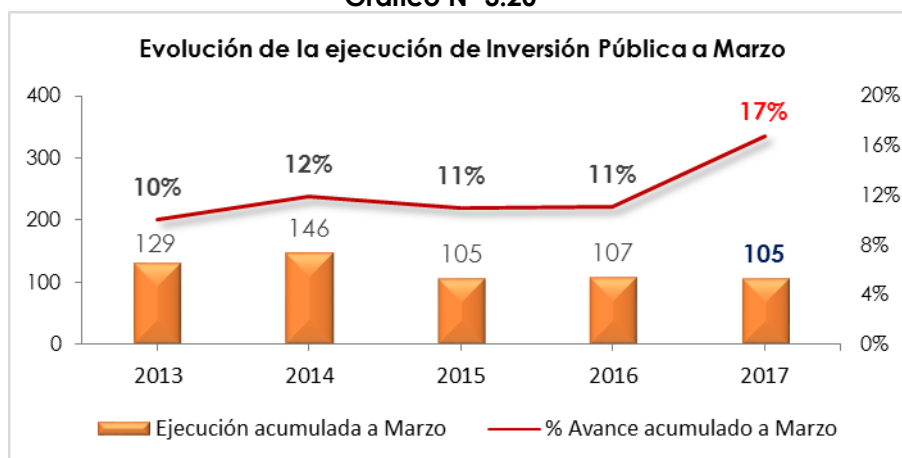

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

**3.21. PUNO**

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Puno ascienden a S/ 655 millones, distribuidos en ciento ocho (108) entidades, de las cuales noventa y cinco (95) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Puno ha ejecutado S/ 92 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.21**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA	135	6	5%	128
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	33	3	11%	29
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA	20	2	8%	18
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	110	18	17%	91
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>297</b>	<b>30</b>	<b>10%</b>	<b>268</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI	23	1	6%	21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA	19	1	6%	17
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	317	59	19%	257
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>358</b>	<b>62</b>	<b>17%</b>	<b>296</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PUNO</b>	<b>655</b>	<b>92</b>	<b>14%</b>	<b>564</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que las Municipalidades Provinciales de San Román y Puno presentan los mayores montos de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con S/ 6 y 3 millones, respectivamente. La Municipalidad Distrital de Muñani cuenta con la mayor asignación de recursos a nivel de municipalidades distritales, con un monto que asciende a los S/ 23 millones.

Asimismo, a nivel provincial, la Municipalidad Provincial de San Roman - Juliaca, que cuenta con un mayor monto de ejecución, resalta el siguiente proyecto "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Huancané tramo (Jr. Miraflores - Puente Independencia)" devengo S/ 1.49 millones, valorización mes enero y febrero, modalidad administración indirecta inicio 01/10/2016, avance físico acumulado de 50.43% a enero 2017.

A nivel de distritos, la Municipalidad Distrital de Muñani, resalta por dos proyectos en ejecución modalidad administración indirecta, denominados "Mejoramiento y ampliación integral del servicio agua potable, alcantarillado en el Pueblo de Muñani" devengo S/ 0.61 millones, valorización mes enero, inicio 05/01/2017; "Instalación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en las comunidades de Inkapucara, Condoriri" devengo S/ 0.52 millones, valorización mes enero, febrero, inició ejecución el 10/01/2017

**Gráfico N° 3.21**

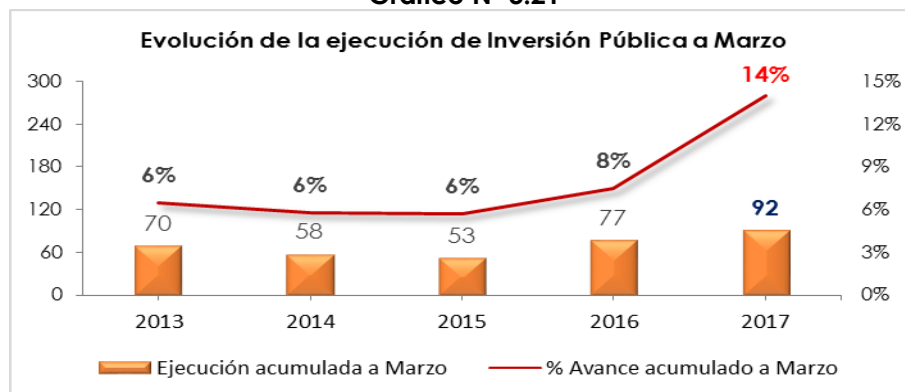

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.22. SAN MARTÍN

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento San Martín ascienden a S/ 436 millones, distribuidos en setenta y siete (77) entidades, de las cuales sesenta y siete (67) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento San Martín ha ejecutado S/ 67 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.22**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	30	5	17%	25
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA	28	3	12%	24
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	16	4	25%	12
RESTO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	55	5	10%	50
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>129</b>	<b>18</b>	<b>14%</b>	<b>111</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR	22	5	21%	18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES	20	3	17%	17
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	264	42	16%	222
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>306</b>	<b>50</b>	<b>16%</b>	<b>257</b>
<b>DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</b>	<b>436</b>	<b>67</b>	<b>15%</b>	<b>368</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Moyobamba presenta el mayor porcentaje de ejecución a nivel de municipalidades provinciales, con un 25% de avance. La Municipalidad Distrital de Soritor muestra el mayor monto ejecutado a nivel de municipalidades distritales con S/ 5 millones.

Asimismo, para la Municipalidad Provincial de San Martín, que muestra una ejecución del 17%, se debe a que en el mes de enero se dio inicio a la ejecución del proyecto con mayor presupuesto (S/ 5.95 millones) "Mejoramiento de las Principales Calles del Sector 09 de abril" el cual a la fecha presenta un avance físico del 11.11%. "Mejoramiento de las Principales vías de acceso al Mercado N° 03 del Barrio Huayco" (S/ 5.79 millones), se encuentra en procedimiento de selección.

Para la Municipalidad Distrital de Soritor, que cuenta con un 21% de avance de ejecución, su principal proyecto es "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las zonas periféricas de Soritor" su ejecución se dio inicio en el presente mes y se viene ejecutando por administración indirecta de forma normal.

**Gráfico N° 3.22**

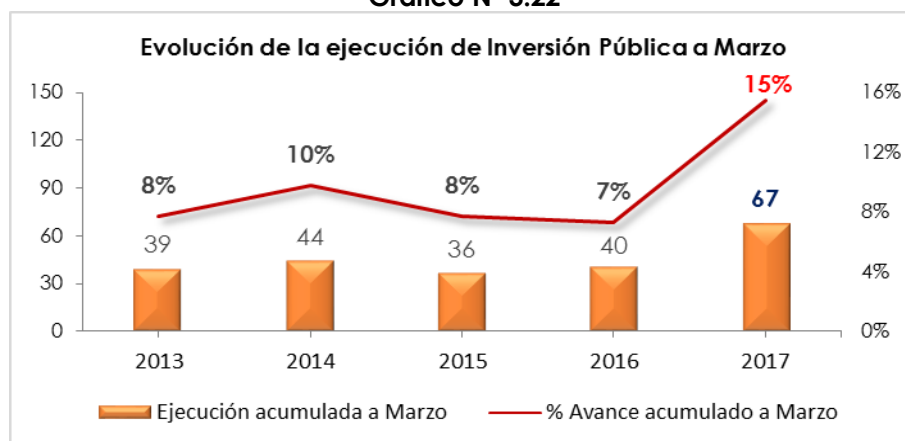

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.



### 3.23. TACNA

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Tacna ascienden a S/ 208 millones de, distribuidos en veintiocho (28) entidades, de las cuales veinticuatro (24) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Tacna ha logrado ejecutar S/ 44 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.23**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA	37	3	8%	34
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	8	2	19%	7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE	1	0	14%	1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA	1	0	10%	1
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>10%</b>	<b>42</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	39	12	31%	27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA	23	4	17%	19
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	100	23	23%	77
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>162</b>	<b>39</b>	<b>24%</b>	<b>123</b>
<b>DEPARTAMENTO DE TACNA</b>	<b>208</b>	<b>44</b>	<b>21%</b>	<b>165</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017. En Millones de Soles.

En la tabla anterior se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Tacna presenta el mayor porcentaje de ejecución a nivel de municipalidades provinciales con un 19% de avance. La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa muestra el mayor porcentaje de ejecución, con un 31% de avance, asimismo cuenta con el mayor monto de ejecución (S/ 39 millones), a nivel de municipalidades distritales.

La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta con el mayor nivel de ejecución entre todas las municipalidades (31%), dentro de sus principales dificultades se considera la elevación a OSCE y anulación de sus procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, a la fecha entidad en proceso de implementación de recomendaciones.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Calana, que presenta un nivel de ejecución de 17%, a la fecha ejecuta en modalidad de administración indirecta el PIP "Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Sector Urbano, Distrito de Calana - Tacna - Tacna", con una ejecución física del 1.53%.

**Gráfico N° 3.23**

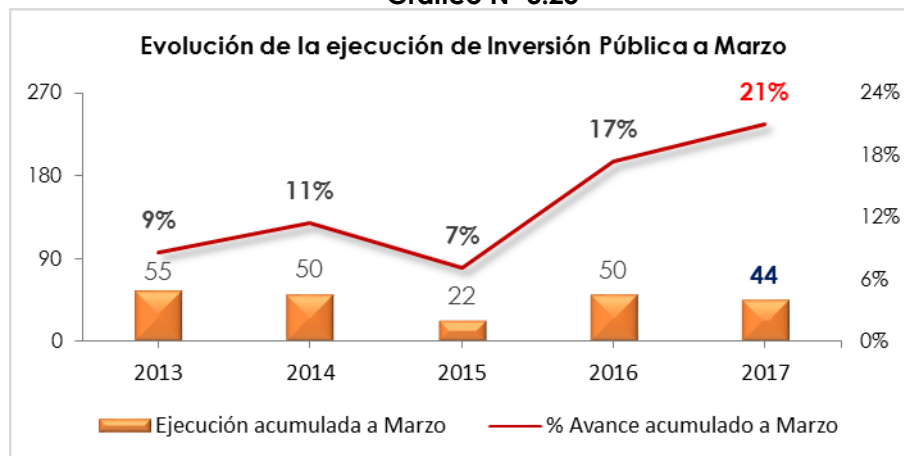

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.

### 3.24. TUMBES

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Tumbes ascienden a S/ 115 millones, distribuidos en trece (13) entidades, de las cuales diez (10) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Tumbes ha ejecutado S/ 16 millones de Soles. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.24**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	29	2	7%	27
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	22	4	20%	17
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR	21	1	6%	20
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>71</b>	<b>8</b>	<b>11%</b>	<b>64</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES	11	2	20%	9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS	7	1	19%	5
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	26	5	20%	21
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>19%</b>	<b>35</b>
<b>DEPARTAMENTO DE TUMBES</b>	<b>115</b>	<b>16</b>	<b>14%</b>	<b>99</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que las Municipalidades Provinciales de Zarumilla y Tumbes presentan el mayor porcentaje de ejecución a nivel de Municipalidades Provinciales con un 20 y 7% de avance, respectivamente. La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes muestra el mayor monto de ejecución a nivel de municipalidades distritales, con un monto que haciende a los S/ 2 millones.

Asimismo, la Municipalidad provincial de Zarumilla, resalta su mayor porcentaje de ejecución al avance en la ejecución de 32 proyectos. Debiendo señalar a su vez que la Municipalidad Provincial de Tumbes, cuenta con el mayor presupuesto con S/ 54.96 millones, producto de transferencias del MVCS.

Por su parte, en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, que cuenta con la mayor asignación de recursos y mayor porcentaje de ejecución, resalta el proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Aguas Verdes y AA.HH." el cual se encuentra culminado, con un avance físico de 100%.

**Gráfico N° 3.24**

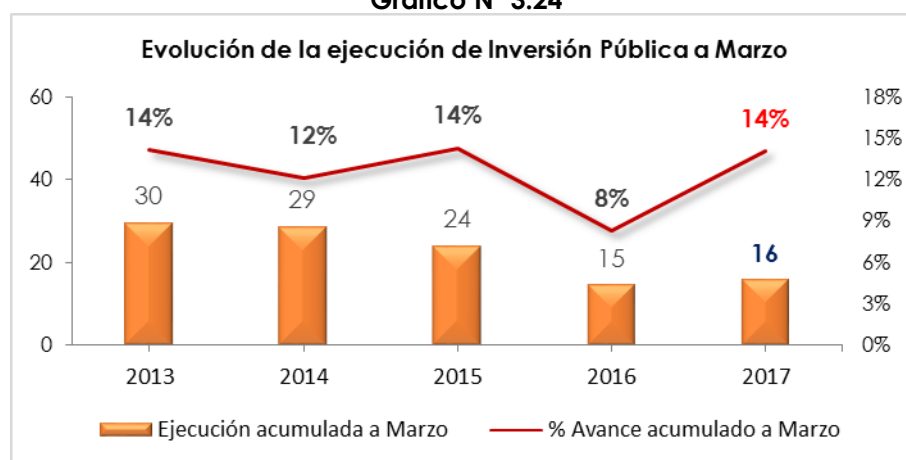

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.



### 3.25. UCAYALI

Al 31 de marzo del 2017, los recursos de inversión destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el Departamento Ucayali ascienden a S/ 222 millones, distribuidos en diecisiete (17) entidades, de las cuales trece (13) corresponden a Municipalidades Distritales. El Departamento Ucayali ha ejecutado S/ 25 millones. El avance financiero de las entidades del departamento se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 3.25**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR ENTIDADES**

Entidad	PIM	DEV	AVAN	SALDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	54	7	12%	47
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI	52	3	6%	49
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA	18	2	11%	16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS	3	0	9%	2
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIALES</b>	<b>126</b>	<b>12</b>	<b>9%</b>	<b>114</b>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOA	26	5	18%	22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY	20	1	7%	19
RESTO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES	49	7	14%	42
<b>TOTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES</b>	<b>96</b>	<b>13</b>	<b>13%</b>	<b>83</b>
<b>DEPARTAMENTO DE UCAYALI</b>	<b>222</b>	<b>25</b>	<b>11%</b>	<b>198</b>


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017, En Millones de Soles

En la tabla anterior, se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo presenta el mayor monto ejecutado a nivel de municipalidades provinciales con S/ 7 millones. A nivel de municipalidades distritales, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha cuenta con el mayor monto de recursos de inversión asignados (S/ 26 millones).

Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo que cuenta con el mayor presupuesto (S/ 54 millones), sus principales proyectos son: "Mejoramiento de las vías Transversales", se viene ejecutando con normalidad por administración indirecta y presenta un avance físico del 11.99%, en el presente mes devengó S/ 1.29 millones por pago de obligaciones; y "Mejoramiento de la Av. Miraflores" del cual se viene ejecutando la II Etapa de forma normal, la obra inició el 14.03.2017.

Para la Municipalidad Provincial de Atalaya, que presenta un bajo nivel de avance financiero de 6%, se debe a que sus principales proyectos como son: "Mejoramiento del Jr. Mananquari" y "Mejoramiento del Jr. Mariano Denis Pezo" mostraron demoras en la culminación de los actos preparatorios para iniciar los procedimientos de selección.

**Gráfico N° 3.25**

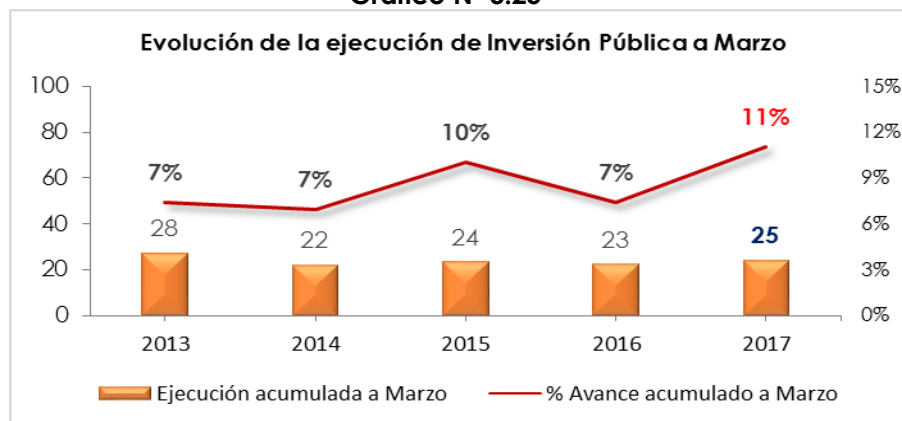

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2013 - 2017.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección General  
de Inversión Pública

Lima, 15 de abril del 2017.

**Unidad de Gestión de la Información**  
**Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública**  
Dirección General de Inversión Pública  
Ministerio de Economía y Finanzas
