



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA**

# **Informe de Seguimiento y Gestión a la Inversión Pública**

---

## **GOBIERNOS REGIONALES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | AL 31 DE MARZO DEL 2017**





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección General  
de Inversión Pública

## ÍNDICE DEL CONTENIDO

<b><u>1</u></b>	<b><u>RESUMEN EJECUTIVO .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>EJECUCIÓN .....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS .....</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL DU 004.....</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>PROBLEMAS QUE AFECTA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA .....</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b><u>6</u></b>	<b><u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>ANEXO.....</u></b>	<b><u>10</u></b>

## 1 RESUMEN EJECUTIVO


### Comparativo de ejecución mensual año 2017 versus año 2016

Al 31 de marzo del 2017, los gobiernos regionales registraron un PIM de S/ 6,993 millones, el cual representa el 19% del presupuesto de inversiones del país. Respecto a la ejecución de la inversión pública, se registró una ejecución de S/ 751 millones que representa el 20% del total ejecutado.

En el I Trimestre 2017 respecto del I Trimestre 2016, los gobiernos regionales han sufrido una variación en la ejecución mensual y en la ejecución acumulada de 19% y -2% respectivamente, como se puede apreciar en el gráfico N° 1.1, siendo los principales problemas:

- Demoras en revisión de expedientes técnicos
- Retrasos en transferencias de recursos a unidades ejecutoras
- Casos de corrupción que dificultan/demoran/paralizan la ejecución de las obras.

**Gráfico N° 1.1: Comparativo de ejecución mensual y acumulada 2017 vs 2016**

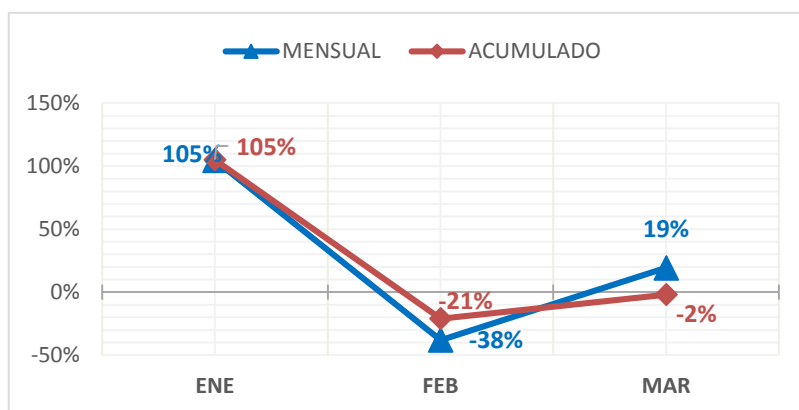


### Comparativo de ejecución total versus ejecución cartera priorizada

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública de la Dirección General de Inversión Pública, en conjunto con 26 Gobiernos Regionales, ha definido una cartera priorizada de 191 proyectos.

Al 31 de marzo del 2017, el gobierno regional ha ejecutado el 9.1% de la cartera priorizada (S/ 3,923 millones), siendo su porcentaje de ejecución total de 10.7% (S/ 6,993 millones).


**Gráfico N° 1.2: Comparativo de ejecución total versus cartera priorizada 2017**

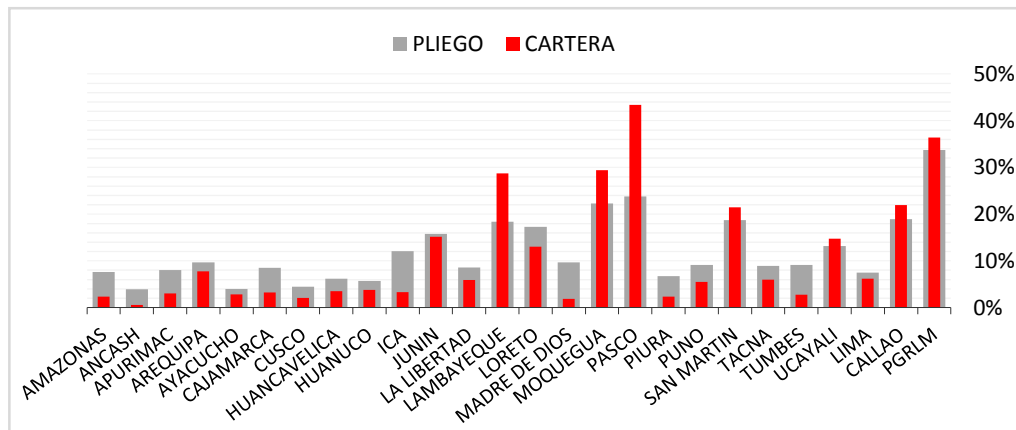

### Cumplimiento de compromisos asumidos en Comités de Inversiones

En todas las sesiones de comités de inversiones llevados a cabo en los Gobiernos Regionales, se estipulan compromisos por cada uno de los involucrados en la gestión de los proyectos, pudiendo observar que en el I Trimestre aún se tienen compromisos pendientes de los meses de enero, febrero y marzo.

**Gráfico N° 1.3: Cumplimiento de compromisos 2017**

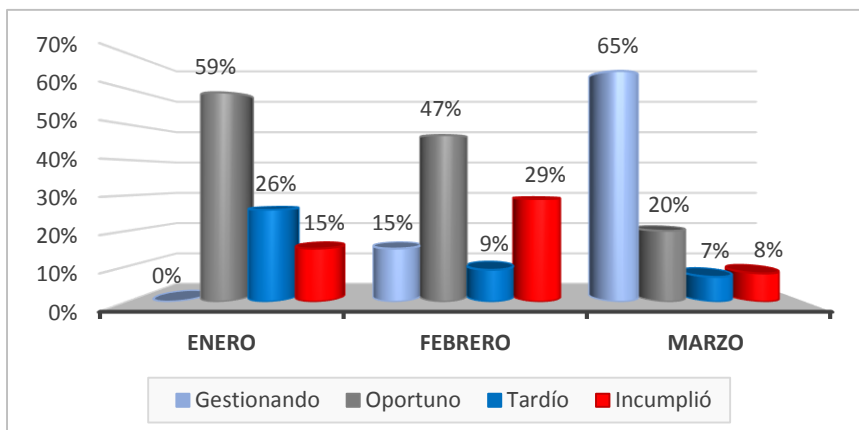


### Seguimiento a los proyectos priorizados en el DU 004-2017

Mediante Decreto de Urgencia publicado el 17 de marzo de 2017, se ha transferido al gobierno Regional S/ 1,065 millones para la ejecución de 141 proyectos.

Al I Trimestre no se han ejecutado recursos, habiendo sido incorporados el 97.5% de los recursos en sus respectivos presupuestos.

**Gráfico N° 1.4: Mapa de distribución de recursos por Departamento**

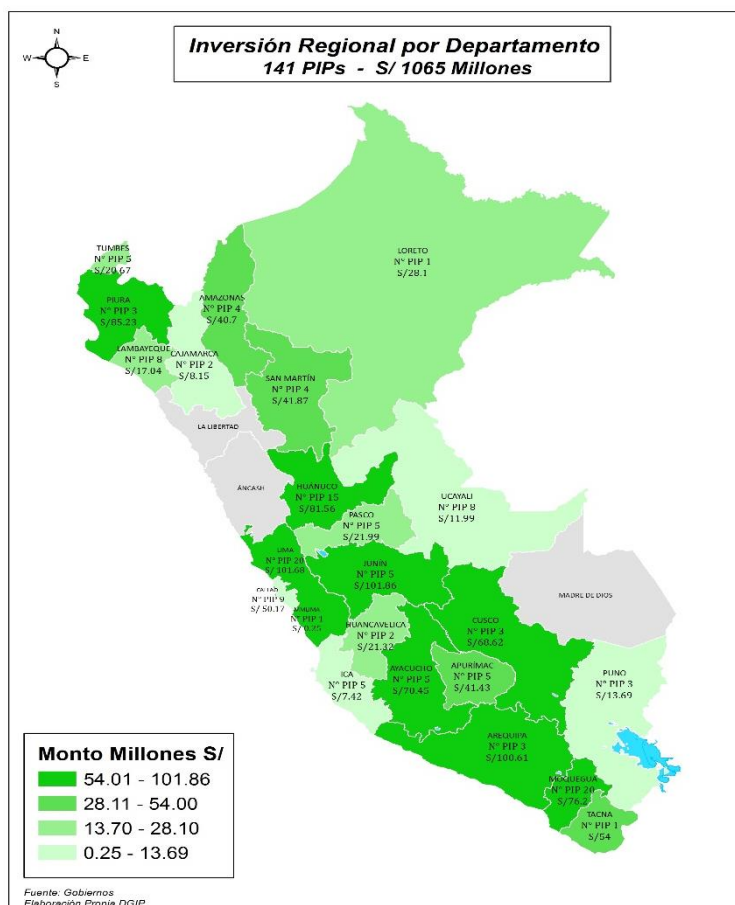

## 2 EJECUCIÓN

El estado situacional de la inversión pública en los pliegos del Gobierno Regional, al 31 de marzo del 2017, se resume en el siguiente cuadro:


**Cuadro N° 1.1 Ranking De Ejecución Presupuestal**

DEPARTAMENTO	2017*			2016			%Δ Ejec
	PIM	DEV	AVANCE	PIM	DEV	AVANCE	
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	40	13	34%	21	0	0%	100%
GOBIERNO REGIONAL PASCO	188	45	24%	114	8	7%	437%
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	250	56	22%	123	15	12%	278%
GOBIERNO REGIONAL CALLAO	184	35	19%	223	30	13%	18%
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	348	65	19%	262	44	17%	50%
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	205	38	18%	300	38	13%	1%
GOBIERNO REGIONAL LORETO	245	42	17%	106	27	25%	58%
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	410	65	16%	122	17	14%	287%
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	202	27	13%	101	15	15%	81%
GOBIERNO REGIONAL ICA	114	14	12%	79	29	36%	-52%
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	120	12	10%	103	14	13%	-15%
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	730	71	10%	348	28	8%	151%
GOBIERNO REGIONAL TUMBES	86	8	9%	95	12	13%	-36%
GOBIERNO REGIONAL PUNO	191	17	9%	146	17	12%	3%
GOBIERNO REGIONAL TACNA	181	16	9%	67	7	10%	145%
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	529	45	9%	362	192	53%	-76%
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	230	20	9%	150	24	16%	-19%
GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	211	17	8%	181	26	14%	-35%
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	315	24	8%	168	15	9%	65%
GOBIERNO REGIONAL LIMA	235	18	7%	128	39	30%	-55%
GOBIERNO REGIONAL PIURA	428	28	6%	220	34	15%	-18%
GOBIERNO REGIONAL HUANCANELICA	192	12	6%	182	22	12%	-45%
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	258	15	6%	140	19	14%	-24%
GOBIERNO REGIONAL CUSCO	592	29	5%	486	58	12%	-50%
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	320	13	4%	218	34	16%	-63%
GOBIERNO REGIONAL ANCASH	189	7	4%	135	5	4%	45%
<b>TOTAL</b>	<b>6,993</b>	<b>751</b>	<b>11%</b>	<b>4,584</b>	<b>768</b>	<b>17%</b>	<b>-2%</b>

Fuente: SIAF-MEF. \*Al 31 de marzo del 2017 y 2016. En millones de Soles (S/.)


Las carteras priorizadas en los gobiernos regionales suman 191 proyectos con un presupuesto asignado de S/ 3,923 millones, estos proyectos representan el 56.1% del total de la cartera de proyectos que tienen las regiones.

**Gráfico 2.1 Representatividad de la cartera priorizada por Gobierno Regional**

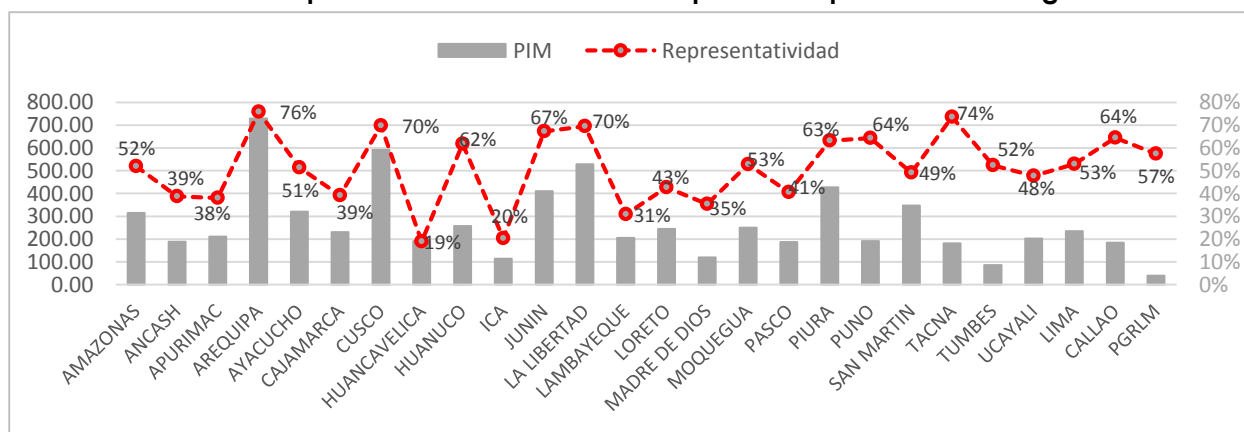

Si bien los gobiernos regionales han ejecutado en promedio el 9.1% de la cartera priorizada, el total de las regiones tiene un porcentaje de avance mayor al de la cartera, 11%.

**Gráfico 2.2 Avance de ejecución de la cartera priorizada por Gobierno Regional**

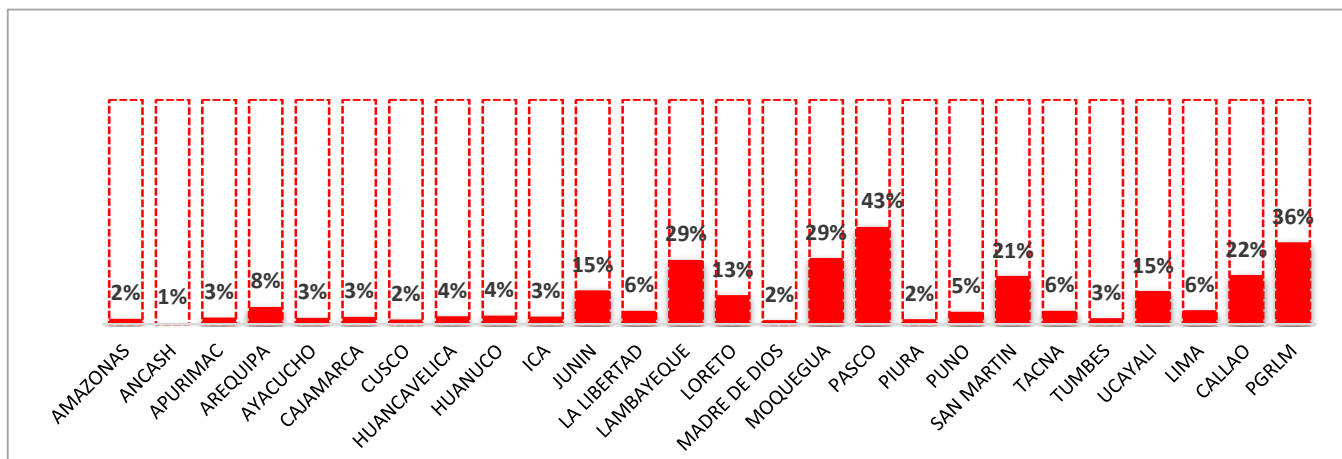




### 3 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

En los gobiernos regionales, se han llevado a cabo durante el I Trimestre sesiones mensuales del Comité de Inversiones, en la cual han participado las áreas involucradas en la gestión de las inversiones como: planeamiento, presupuesto, logística, administración, unidades ejecutoras, programación multianual de inversiones, unidades formuladoras.

En cada una de las sesiones se establecen compromisos que asumen por cada proyecto que presenten cuellos de botella a destrabar, con la finalidad de acelerar la ejecución de las inversiones que ya cuentan con presupuesto asignado en el presente año; estos compromisos, son plasmados en matrices, las cuales tienen permanente seguimiento por parte del equipo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones Sectorial y el equipo de la Dirección de Seguimiento del MEF.

**Gráfico 3.1 Evolución de cumplimiento de compromisos de enero**

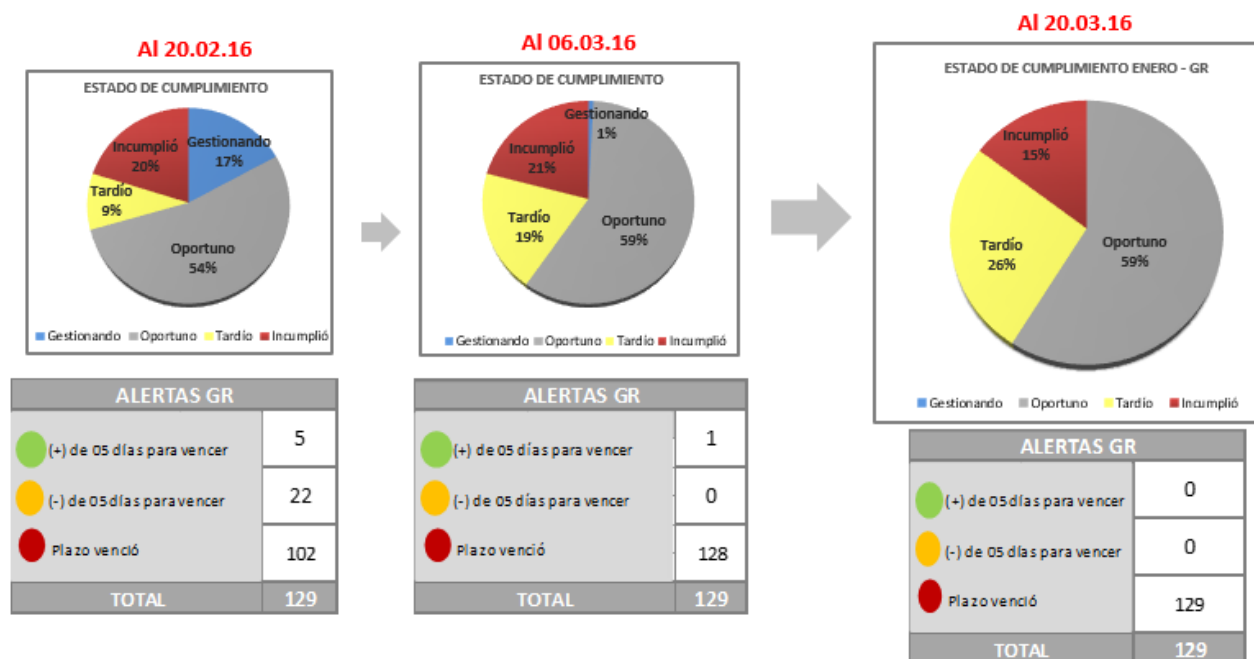

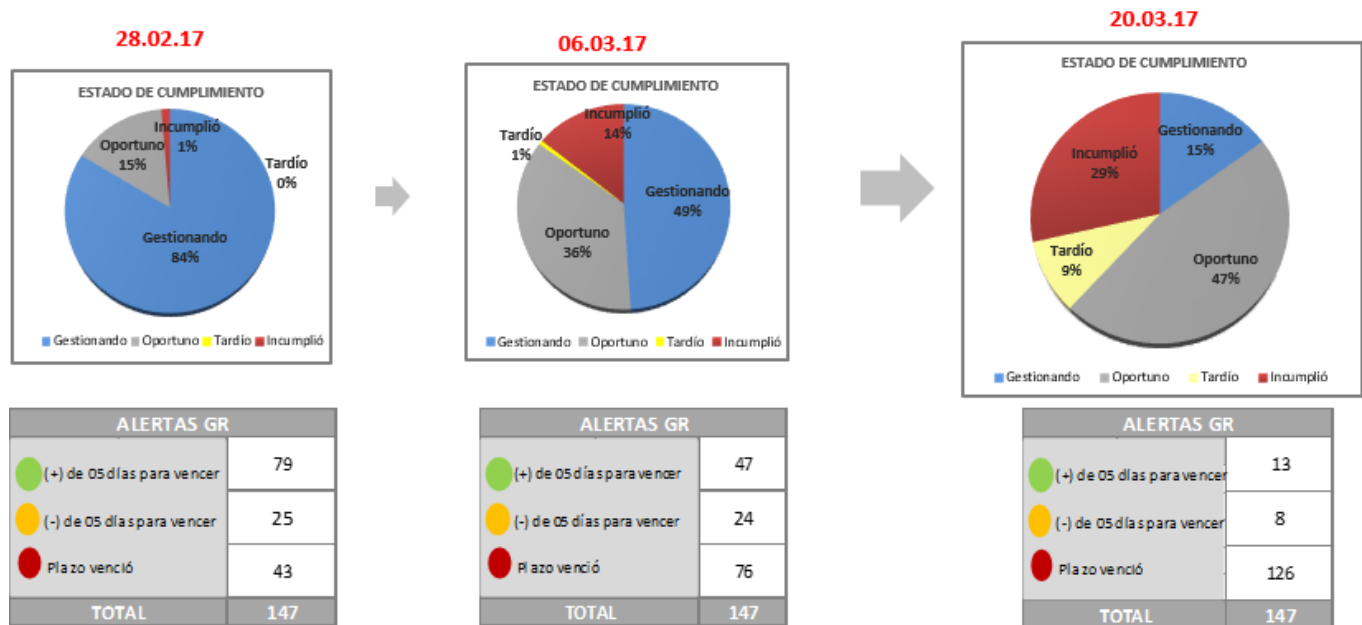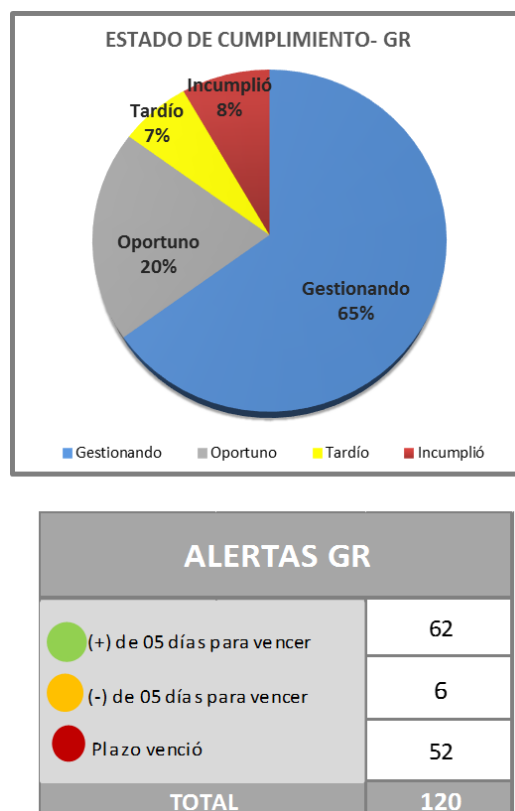**Gráfico 3.2 Evolución de cumplimiento de compromisos de febrero**

**Gráfico 3.3 Cumplimiento de compromisos de marzo**


#### 4 PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL DU 004

Mediante DU N° 004-2017-EF, publicado el 18 de marzo de 2017, se han transferido a 23 gobiernos regionales la suma de S/ 1,065 millones, siendo asignados de la siguiente manera:

**Cuadro 4.1 Número de PIP y monto transferido por Gobierno Regional**

GOBIERNO REGIONAL	N° PIP	MONTO TRANSFERIDO
GR AMAZONAS	4	40.70
GR APURIMAC	5	41.43
GR AREQUIPA	3	100.61
GR AYACUCHO	5	70.45
GR CAJAMARCA	2	8.15
GR CALLAO	9	50.17
GR CUSCO	3	68.62
GR HUANCANELICA	2	21.32
GR HUÁNUCO	15	81.56
GR ICA	5	7.42
GR JUNÍN	5	101.86
GR LAMBAYEQUE	8	17.04
GR LIMA	24	101.68
GR LORETO	1	28.10
GR MOQUEGUA	20	76.20
GR PASCO	5	21.99
GR PIURA	3	85.23
GR PUNO	3	13.69
GR SAN MARTIN	4	41.87
GR TACNA	1	54.00
GR TUMBES	5	20.67
GR UCAYALI	8	11.99
PGR LIMA METROPOLITANA	1	0.25
<b>Total general</b>	<b>141</b>	<b>1,065.00</b>

#### 5 PROBLEMAS QUE AFECTA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA

- ❖ Demoras en revisión de expedientes técnicos, en presentación de facturas por parte de contratistas.
- ❖ Retrasos en transferencias de recursos a unidades ejecutoras
- ❖ Firma de adendas
- ❖ Casos de corrupción que dificultan/demoran/paralizan la ejecución de las obras.



## 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones

- ❖ La ejecución de la inversiones regionales, registró un monto de inversión acumulado de S/ 751 millones, monto que representa un avance del 11% respecto a su PIM al cierre del mes de marzo. observándose una tendencia decreciente en 2% a la mostrada en el mismo período del año 2016.
- ❖ El Gobierno Regional de Arequipa lidera el mayor monto ejecutado con S/ 71 millones, con un avance de 10% seguido por la región San Martín con S/ 65 millones (19%), Junín con S/65 millones (16%) y Moquegua con S/ 56 millones (22%), representado estas cuatro regiones el 34% de la ejecución al mes de marzo del 2017.
- ❖ En el I Trimestre, la ejecución de la cartera priorizada fue menor a la ejecución de la cartera total en los gobiernos regionales.
- ❖ En el I Trimestre, en promedio el 42% de compromisos asumidos fueron cumplidos de manera oportuna en los plazos establecidos.

### Recomendaciones

- ❖ Mejorar la programación mensual de ejecución de los recursos destinados a inversiones.
- ❖ Mejorar coordinación entre las Gerencias involucradas en la gestión de los proyectos, con la finalidad de solucionar los cuellos de botella y el porcentaje de compromisos asumidos en los comités de inversiones.

## 7 ANEXO

En el siguiente apartado, se describe principalmente la ejecución financiera de los Gobiernos Regionales desagregados por Unidades Ejecutoras, tal como sigue en los numerales:

### 7.1 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Amazonas asciende a S/ 315 millones, de los cuales se han devengado S/ 24 millones, alcanzando un 8% de avance y el monto por ejecutar es S/ 291 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.1**

#### DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL	212	13	6%	199
GOB.REG.DPTO. DE AMAZONAS- PROAMAZONAS	48	1	2%	48
GOB.REG.AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA	22	2	10%	20
OTROS	33	9	26%	24
<b>GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS</b>	<b>315</b>	<b>24</b>	<b>8%</b>	<b>291</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Amazonas se concentra principalmente en la UE Región Amazonas - Sede Central, representando el 67% del total de presupuesto del pliego.

Entre los principales proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional de Amazonas resalta “Eje vial II”, la cual presenta un avance del 15.65% al 31.03.2017. El proyecto se encuentra retrasado por inconvenientes en disponibilidad de terrenos, en dos tramos de la vía y también por la presencia de abundante lluvia en las zonas.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 24 millones, reflejándose un incremento de S/ 9 millones respecto al mismo período del año 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional aumentó de 6% en el año 2016 a 8% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.1**

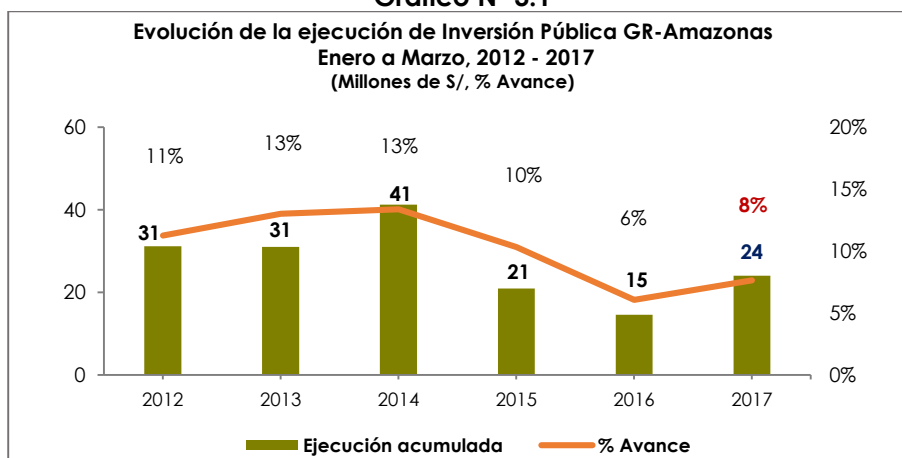

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.2 GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ancash asciende a S/ 189 millones, de los cuales se ha ejecutado el 4% (S/ 7 millones) de lo programado, siendo la última posición en el ranking de ejecución acumulada y el monto por ejecutar es S/182 millones. A continuación, se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.2**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN ANCASH**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVANCE	SALDO
REGION ANCASH SEDE CENTRAL	158	2	1%	156
REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS	19	3	15%	16
REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO	12	3	23%	9
REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH	0	0	0%	0
<b>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH</b>	<b>189</b>	<b>7</b>	<b>4%</b>	<b>182</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Ancash se concentra principalmente en la UE Región Ancash - Sede Central. La UE Sede Central, de un total asignado de S/ 158 millones, hacia fines de marzo sólo alcanzaron un grado de avance de 1%.

Entre otros, destaca el PIP “Electrificación rural-distrito de Pomabamba”, en procedimiento de selección para ejecución de obra (VR de S/ 17.98 mill). Se tuvo un pronunciamiento del OSCE por lo que el procedimiento se retrotrajo hacia integración de bases, por lo que se deberá acoger pronunciamiento al integrar bases y reprogramar el calendario.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 7 millones, reflejándose un incremento de S/ 2 millones al mismo período del 2016. Respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Ancash mejoró de 2% en el año 2016 a 4% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.2**

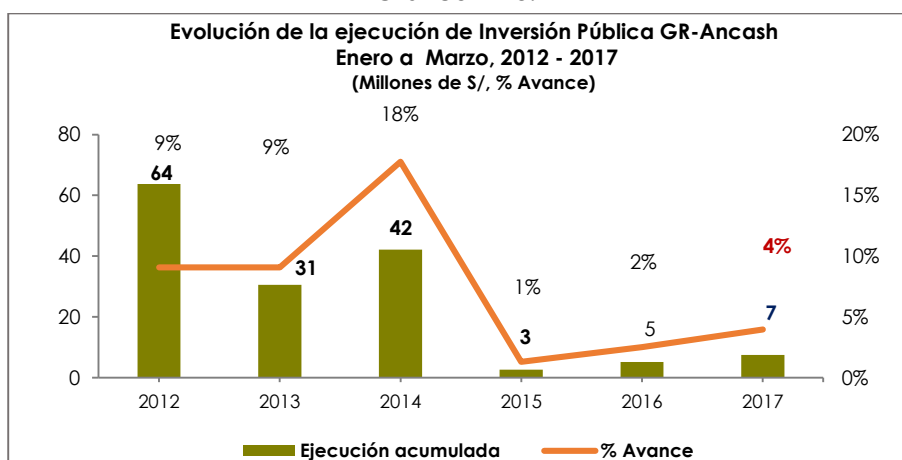

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

### 7.3 GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Apurímac asciende a S/ 211 millones, de los cuales se ha ejecutado el 8% (S/ 17 millones) y el monto por ejecutar es S/ 194 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.3**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN APURÍMAC**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL	152	10	7%	142
REGION APURIMAC- SEDE CHANKA	31	2	7%	29
GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS	11	2	18%	9
GOB. REG. DE APURIMAC- PRO DESARROLLO APURIMAC	5	1	14%	4
OTROS	11	2	16%	10
<b>GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC</b>	<b>211</b>	<b>17</b>	<b>8%</b>	<b>194</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Apurímac se concentra principalmente en la UE - Región Apurímac Sede Central que tiene el 72% del presupuesto. Las UE que tienen el mayor grado de avance en la ejecución son: las Sub Región Chincheros con 18% y Pro Desarrollo Apurímac con 14%.

La Región Apurímac – Sede Central tiene entre sus principales proyectos el PIP “Nuevo Hospital de Andahuaylas” que se viene ejecutando desde el 2013, el mismo que prevé reiniciar ejecución en abril y con el que se busca mejorar el servicio de salud para 210,355 personas. El PIP “Saneamiento de la ciudad de Abancay”, que beneficiará a 63,036 personas, tiene un avance físico de 72%, se encuentra actualmente paralizado y tiene previsto su reinicio en abril, una vez que se haya llevado a cabo la conciliación con la Empresa Contratista.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una Ejecución de S/ 17 millones, reflejándose una disminución de S/ 9 millones en relación al período 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Apurímac disminuyó de 11% en el año 2016 a 8% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.3**

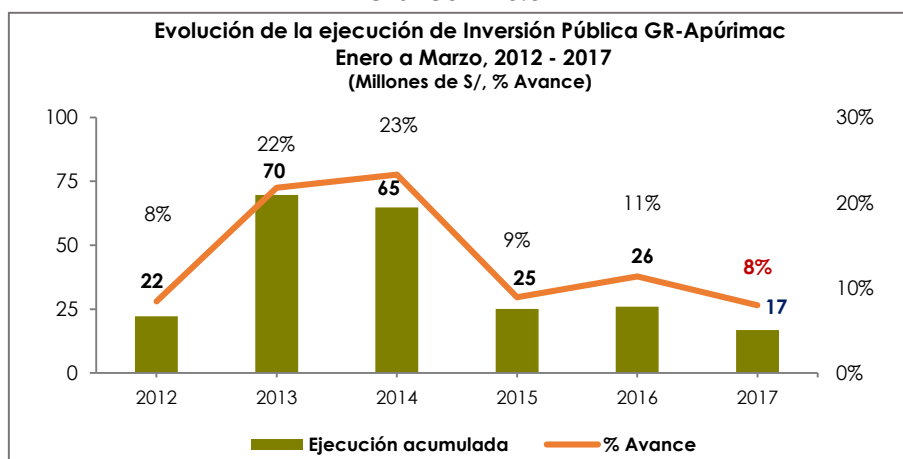

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.4 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Arequipa asciende a S/ 730 millones, habiendo devengado S/ 71 millones de soles (10% de avance) y el monto por ejecutar es S/ 659 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.4**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN AREQUIPA**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	456	57	12%	399
REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	272	14	5%	259
REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	1	0	28%	1
OTROS	1	0	21%	1
<b>GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA</b>	<b>730</b>	<b>71</b>	<b>10%</b>	<b>659</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Arequipa se concentra principalmente en la Unidad Ejecutora Sede Central, que tiene el 62% del presupuesto y presenta avance financiero acumulado de 12% del mismo PIM, y la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Majes Siguan con el 37% del presupuesto y un avance de 5%.

Así entonces, se considera entre los principales proyectos al PIP Majes Siguan II Etapa con S/ 236 millones de PIM y un avance financiero de 6.4%, se efectuó el tercer desembolso del primer trimestre 2017 de acuerdo a TUO aprobado, el expediente de contratación 1AB fue aprobado y se encuentra en revisión el expediente 1B. De igual forma se cuenta con el PIP Carretera Variante de Uchumayo, con S/ 144.4 millones de PIM y ejecución financiera de 11.3% al primer trimestre 2017, con gestiones en curso para pago de lucro cesante a expropietarios.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 71 millones, reflejándose un incremento de S/ 42 millones en relación al período 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Arequipa aumentó de 5% en el año 2016 a 10% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.4**

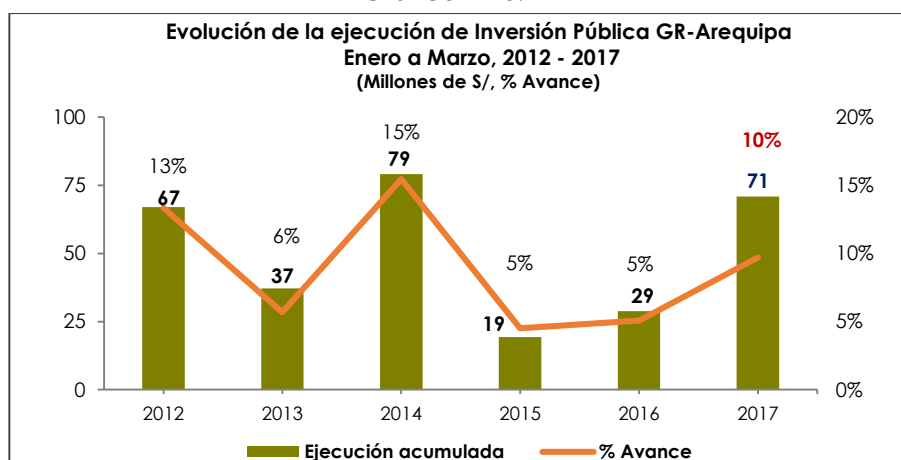

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.5 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho asciende a S/ 320 millones, de los cuales se ha ejecutado el 4% (S/ 13 millones) y el monto por ejecutar es S/ 307 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.5**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN AYACUCHO**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL	204	8	4%	196
REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y DES. RURAL INTEGRADON-PRIDER	89	2	2%	87
REGION AYACUCHO-AGRICULTURA	11	0	4%	11
OTROS	15	2	13%	13
<b>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO</b>	<b>320</b>	<b>13</b>	<b>4%</b>	<b>307</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Ayacucho se concentra principalmente en la UE Región Ayacucho - Sede Central. La UE Sede Central, de un total asignado de S/ 204 millones, hacia fines de marzo, alcanzaron un grado de avance de 4%.

Entre otros, destaca el PIP “Presa Ancascocha”, con un PIM S/ 63.18 millones, proyecto verificado al 28.03.17. Asimismo, el PIP “Carretera Vilcas Huamán”, con un de PIM S/ 29.32 millones, cuya obra registra un avance físico real de 57.91% al mes de febrero.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una Ejecución de S/ 13 millones, reflejándose una disminución de S/ 21 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Ayacucho disminuyó de 9% en el año 2016 a 4% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.5**

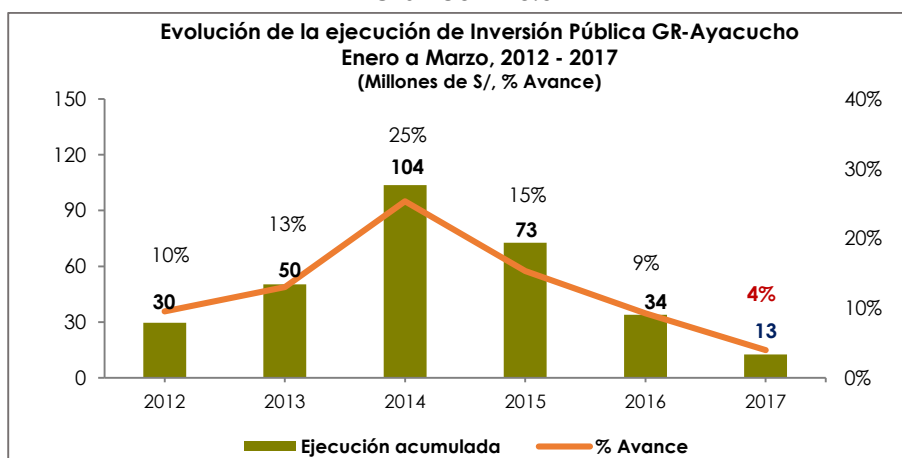

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.6 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Cajamarca asciende a S/ 230 millones, de los cuales se ha ejecutado el 9% (S/ 20 millones) y el monto por ejecutar es S/ 211 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.6**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN CAJAMARCA**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	97	4	4%	93
REGION CAJAMARCA-CUTERVO	47	5	10%	42
REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION	29	8	26%	22
REGION CAJAMARCA-JAEN	21	1	7%	20
OTROS	36	2	5%	34
<b>GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA</b>	<b>230</b>	<b>20</b>	<b>9%</b>	<b>211</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Cajamarca se concentra principalmente en la UE Región Cajamarca –Sede Central, que tiene el 42% del presupuesto y presenta avance financiero acumulado de 4% del mismo PIM. En lo referente a la UE Pro Región, de un total asignado de S/ 29 millones hacia fines de marzo, alcanzó un grado de avance de 26%.

La UE Región Cajamarca - Sede Central, ejecuta desde el año 2015 por contrata el PIP Mejoramiento Carretera Santa Cruz de Succhubamba – El Empalme con el que busca beneficiar a 53,493 personas. Al 30 de marzo acumuló un avance físico real de 21.12% y un devengado acumulado de S/ 38.56 mill. Por factores climáticos se ha convenido mediante acta suscrita entre contratista, supervisión y gerencia de infraestructura paralizar la obra del 25 de marzo al 02 de mayo, además con fecha 06 de febrero se ha encargado a la empresa contratista elabore el expediente de adicional N° 02.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una Ejecución de S/ 20 millones, reflejándose una disminución de S/ 4 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Cajamarca aumentó de 8% en el año 2016 a 9% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.6**

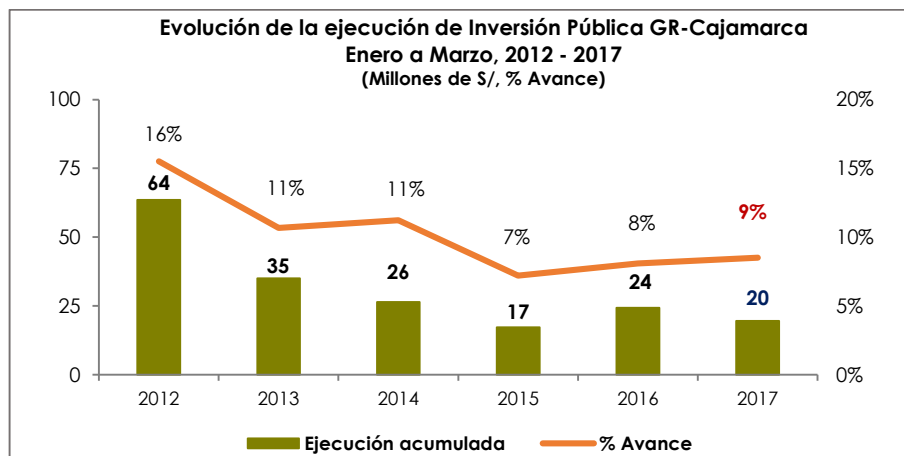

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.7 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Cusco asciende a S/ 592 millones, de los cuales se ha ejecutado el 5% (S/ 29 millones) y el monto por ejecutar es S/563 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.7**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN CUSCO**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION CUSCO -PLAN COPESCO	372	3	1%	369
REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	123	17	14%	106
REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS	42	5	11%	38
OTROS	54	4	7%	50
<b>GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO</b>	<b>592</b>	<b>29</b>	<b>5%</b>	<b>563</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Cusco se concentra principalmente en la UE Región Cusco – Plan Copesco con el 63% del total. El mayor grado de avance en la ejecución corresponde a la UE Región Cusco – Sede Central con 14% respectivamente.

La Unidad Ejecutora Plan Copesco-Cusco tiene a cargo el proyecto “Mejoramiento Integral Vía Expresa de la Ciudad del Cusco- Ovalo los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles” con un PIM de S/ 265,3 millones y se encuentra elaborando el expediente técnico y se encuentra en levantamiento de observaciones hasta el 31 de abril 2017. Asimismo, la Unidad Ejecutora Sede Central viene ejecutando el proyecto “Mejoramiento de la Carretera Huancarani – Paucartambo” por con un PIM de S/ 46,57 millones y se realiza por Administración Directa, cuenta con avance físico de 36.90% al mes de Marzo.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 29 millones, reflejándose una disminución de S/ 29 millones en relación al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Cusco disminuyó de 9% en el año 2016 a 5% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.7**

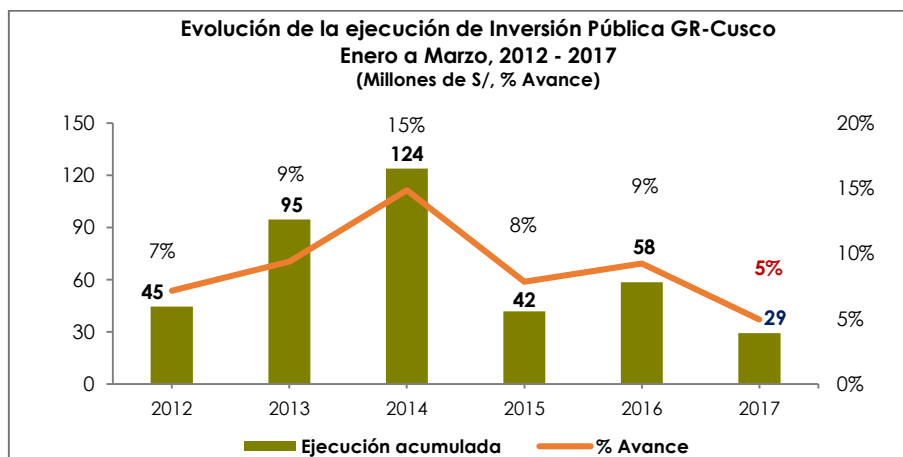

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.



## 7.8 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Huancavelica asciende a S/ 192 millones, de los cuales se ha ejecutado el 6% (S/ 12 millones) y el monto por ejecutar es S/ 180 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.8**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN HUANCAMELICA**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL	165	8	5%	157
REGION HUANCAMELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	7	2	37%	4
REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	6	0	5%	6
OTROS	14	1	9%	13
<b>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA</b>	<b>192</b>	<b>12</b>	<b>6%</b>	<b>180</b>

En Millones de Soles.

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.


El presupuesto de la región Huancavelica se concentra principalmente en la UE Región Huancavelica – Sede Central con S/ 165 millones de PIM con un avance del 5%. El mayor grado de avance en la ejecución corresponde a la UE Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja con 37%.

El GR de Huancavelica viene ejecutando importantes proyectos, como la Carretera Abra – Acopalca, con un avance físico acumulado del 25.5% y una ejecución financiera del 48%; el proyecto de la II.EE. Nuestra Señora de Lourdes en Pampas, que se viene ejecutando con un avance por encima de lo programado alcanzando el 33.6% y una ejecución financiera del 15.3%.

Es preciso señalar que el GR de Huancavelica ha tenido la paralización de la ejecución de 05 PIP por la temporada de lluvias y la declaratoria de emergencia en muchos distritos.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 12 millones, reflejándose una disminución de S/ 10 millones en relación a similar período del 2016; respecto al nivel de avance, el Gobierno Regional de Huancavelica disminuyó de 11% en el año 2016 a 6% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.8**

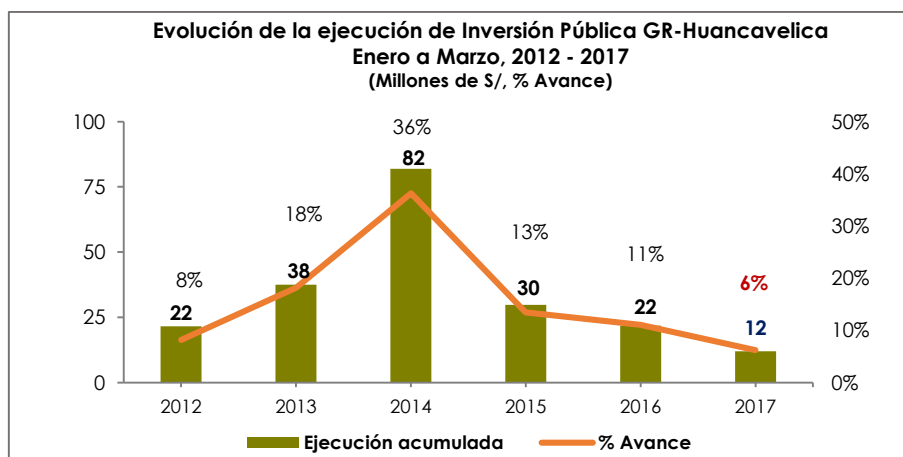

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.9 GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Huánuco asciende a S/ 258 millones, de los cuales se ha ejecutado el 6% (S/ 15 millones) y el monto por ejecutar es S/243 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.9**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN HUÁNUCO**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	258	15	6%	243
REGION HUANUCO-AGRICULTURA	0	0	0%	0
<b>GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO</b>	<b>258</b>	<b>15</b>	<b>6%</b>	<b>243</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2016

El presupuesto de la región Huánuco se concentra principalmente en la UE Región Huánuco – Sede Central, que presenta un grado de avance de 6%.

EL GR de Huánuco viene ejecutando el traslado del equipamiento y material biomédico al Hospital de Contingencia del PIP "Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco Nivel III-1", el cual cuenta con un avance físico de 60%. Y el PIP "Hospital Tingo Maria" en ejecución y con avance físico de 56.73%.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 15 millones, reflejándose una disminución de S/ 4 millones respecto al mismo período del 2016, en tanto al nivel de avance el Gobierno Regional de Huánuco también ha disminuido de 9% en el año 2016 a 6% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.9**

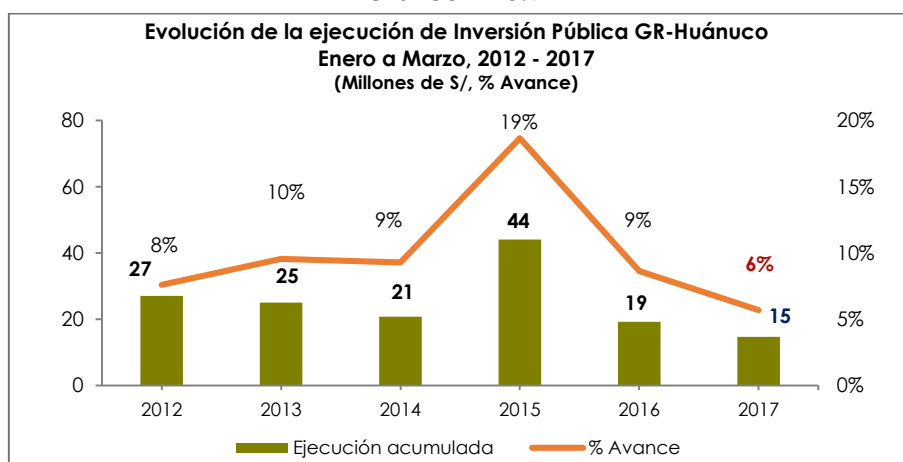

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.10 GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ica asciende a S/ 114 millones, de los cuales se ha ejecutado el 12% (S/ 14 millones) y el monto por ejecutar es S/ 100 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.10**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN ICA**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION ICA-SEDE CENTRAL	89	11	13%	78
REGION ICA-AGRICULTURA	15	1	4%	15
REGION ICA-PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	10	2	18%	8
<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b>	<b>114</b>	<b>14</b>	<b>12%</b>	<b>100</b>


En Millones de Soles.

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Ica se concentra principalmente en la UE Región Ica-Sede Central. Dicha UE, de un total asignado de S/ 89 millones; a fines de marzo alcanzó un grado de avance de 13%.

La Región Ica ejecuta desde 2016 por Oxl el PIP "Ampliación, adecuación y mejoramiento de la capacidad de respuesta del centro de operaciones de emergencia de la Región Ica", que al 31 de marzo acumuló un avance físico real de 32 % y un nivel de ejecución de 22% (S/ 3.56 millones). El PIP "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Peña-La Capilla-LD con Ayacucho (AY-111 a Ocaña), distrito y provincia de Palpa", beneficiaría la transitabilidad del traslado de carga y pasajeros, el Expediente Técnico fue aprobado y actualmente se elabora el expediente de contratación.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 14 millones, reflejándose una disminución de S/ 15 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Ica, disminuyó de 22% en el año 2016 a 12% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

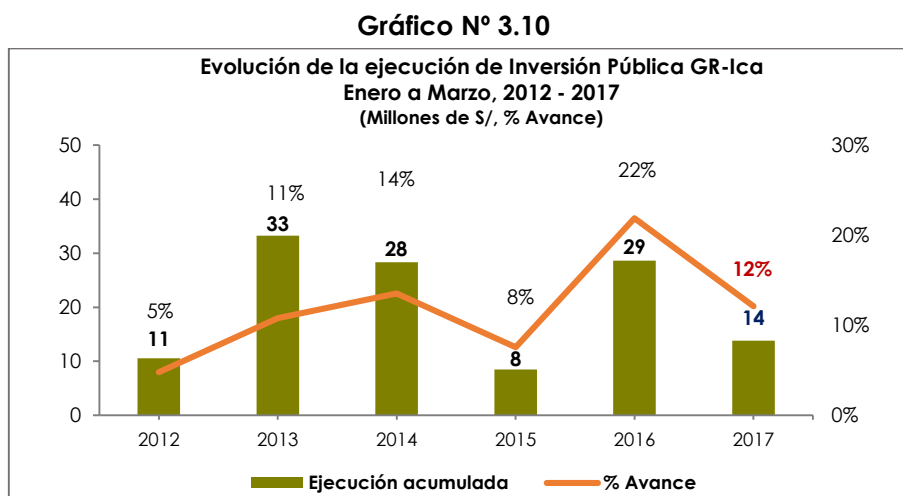

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.11 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Junín asciende a S/ 410 millones, de los cuales se ha ejecutado el 16% (S/ 65 millones) y el monto por ejecutar es S/345 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.11**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN JUNÍN**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	407	65	16%	342
REGION JUNIN-TRANSPORTES	2	0	0%	2
REGION JUNIN-AGRICULTURA	1	0	0%	1
<b>GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN</b>	<b>410</b>	<b>65</b>	<b>16%</b>	<b>345</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Junín se concentra principalmente en el mayor monto de inversión pública en la UE Región Junín - Sede Central con un PIM de S/ 407, y cuyo avance hasta marzo es de 16%.

El GR Junín viene ejecutando proyectos importantes, tales como el Mejoramiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre (PIM S/ 85.0 Mill.) con un avance financiero del 9.8% de su presupuesto asignado y un avance físico del 12.8%. El Hospital el Carmen (PIM S/ 70.02 Mill.) presenta un avance financiero del 20.8% del PIM y un avance físico del 2.8%; otro proyecto importante es el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (PIM S/ 31.68 Mill.), cuyo avance financiero es del 22.5% de su presupuesto asignado y un avance físico acumulado del 36.3%

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 65 millones, reflejándose un incremento de S/ 48 millones en relación al mismo período del 2016; respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Junín aumentó de 4% en el año 2016 a 16% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.11**

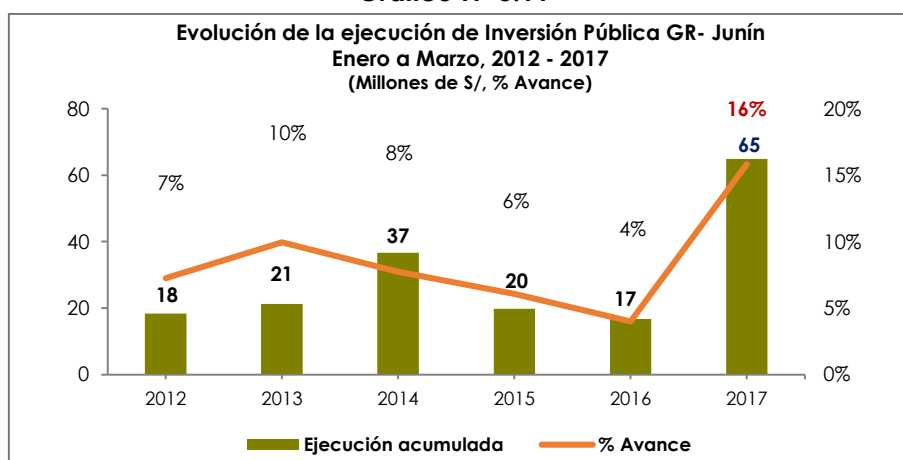

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.12 GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de La Libertad asciende a S/ 529 millones, de los cuales se ha ejecutado el 9% (S/ 45 millones) y el monto por ejecutar es S/ 484 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.12**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN LA LIBERTAD**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION LA LIBERTAD-PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	388	38	10%	351
REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL	141	8	5%	133
<b>GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD</b>	<b>529</b>	<b>45</b>	<b>9%</b>	<b>484</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región La Libertad se concentra principalmente en la UE Región La Libertad – Proyecto Especial Chavimochic. La UE Proyecto Especial Chavimochic, de un total asignado de S/ 388 millones; hacia fines de marzo alcanzó un grado de avance de 10%.

Entre otros, destaca el PIP “Chavimochic III Etapa”, obra ejecutada a través de una APP cuyos principales ejes de gestión son: saneamiento físico legal de terrenos para la ejecución de las obras y de las áreas a irrigar (expropiaciones, litigios e interferencias); Obras de la III Etapa se encuentran paralizadas a la fecha, en proceso arbitral a solicitud de la Concesionaria. Respecto al proceso judicial correspondiente a las 16 mil Has, interpuesta por la Agrícola Chicama, el Poder Judicial emitió fallo de la apelación, a favor del demandante. Durante éste mes, se devengó S/ 19.70 millones, por pago de la 9na valorización trimestral de obra, de seguros y de la Supervisión.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 45 millones, reflejándose una disminución significativa de S/ 147 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de La Libertad ha disminuido de 29% en el año 2016 a 9% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.12**

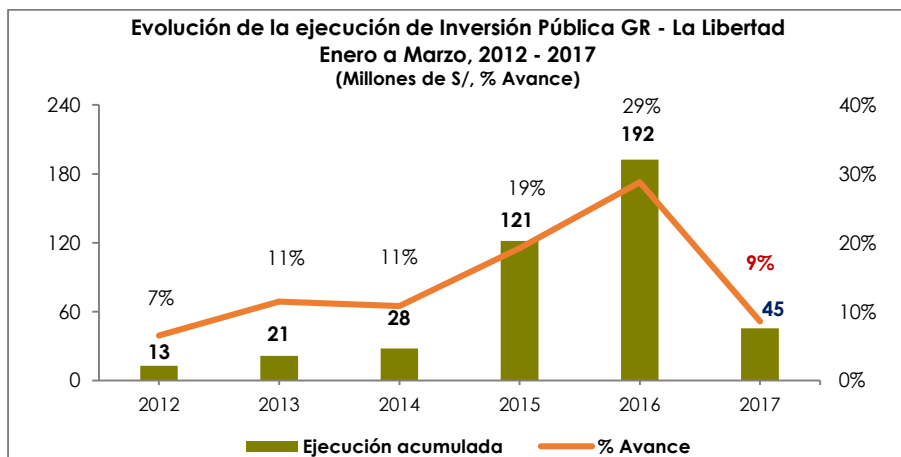

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

### 7.13 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Lambayeque asciende a S/ 205 millones, de los cuales se ha ejecutado el 18% (S/ 38 millones) de lo programado y el monto por ejecutar es S/ 167 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.13**

**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN LAMBAYEQUE**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL	136	17	12%	120
REGION LAMBAYEQUE - PROY. ESP. OLMOS TINAJONES	58	20	35%	38
REGION LAMBAYEQUE-AGRICULTURA	4	1	21%	3
OTROS	7	0	1%	7
<b>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE</b>	<b>205</b>	<b>38</b>	<b>18%</b>	<b>167</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Lambayeque se concentra principalmente en la UE Región Lambayeque – Sede Central, con un total asignado de S/ 136 millones; hacia fines de marzo alcanzó un grado de avance de 12%.

El Gobierno Regional de Lambayeque viene ejecutando entre el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo en el colegio militar Elías Aguirre”; el cual inició su ejecución en el mes de febrero del presente año y se prevé su culminación en el mes de mayo del 2017. Asimismo, el monto contratado es por S/ 46.92 mill. y su avance físico de 47.25%.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una Ejecución de S/ 38 millones, tal cual al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Lambayeque ha incrementado de 11% en el año 2016 a 18% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.13**

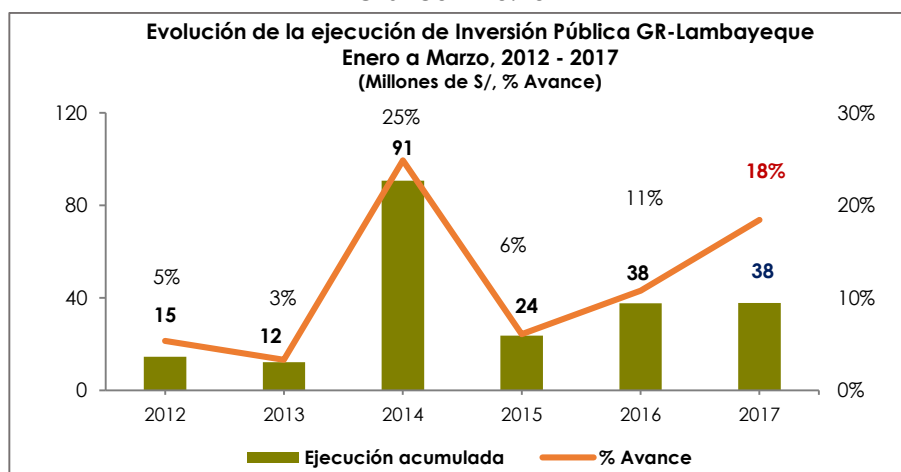

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 – 2017.

## 7.14 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Loreto asciende a S/ 245 millones, de los cuales se ha ejecutado el 17% (S/ 42 millones) y el monto por ejecutar es S/ 203 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.14**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN LORETO**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION LORETO-SEDE CENTRAL	140	25	18%	115
REGION LORETO-ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS	81	15	19%	65
REG. LORETO- ORGANISMO PUBLICO INFRAEST. PARA LA PRODUCTIVIDAD	18	2	10%	16
OTROS	7	0	4%	7
<b>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO</b>	<b>245</b>	<b>42</b>	<b>17%</b>	<b>203</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Loreto se concentra principalmente en las UE Región Loreto - Sede Central y la UE Región Loreto Alto Amazonas – Yurimaguas. La UE Región Loreto - Sede Central, de un total de S/ 140 millones asignados, hacia fines de marzo ha alcanzado un grado de avance del 18%; mientras que, en la UE Región Loreto-Alto Amazonas - Yurimaguas destaca una ejecución del 19%.

Entre los principales proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional de Loreto resaltan los siguientes: **"Hospital Santa Gema"**, que se encuentra en ejecución por Administración Indirecta, con avance físico del 72.72% al 31.03.17. La ampliación de plazo se encuentra en arbitraje, sin embargo la empresa continúa trabajando. Con dicha ampliación, el Proyecto estará culminando el 31.05.17.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 42 millones, reflejándose un aumento de S/ 15 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Loreto aumentó de 12% en el año 2016 a 17% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.14**

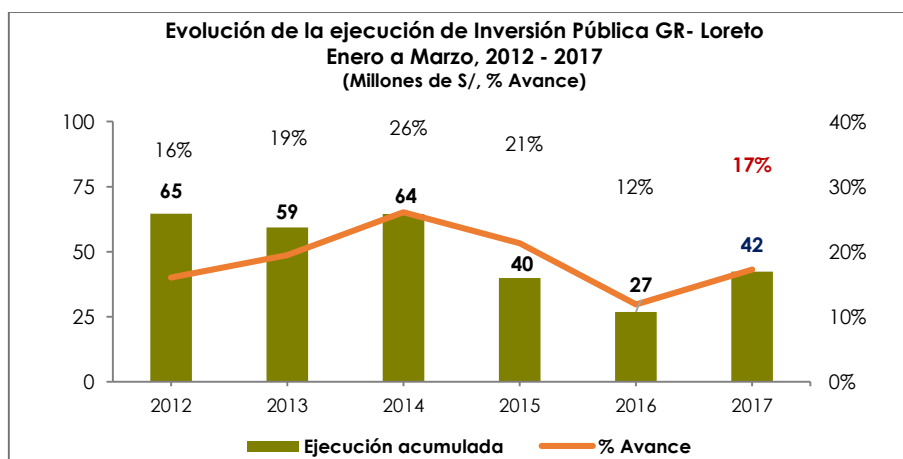

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.15 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Madre de Dios asciende a S/ 120 millones, de los cuales se ha ejecutado el 10% (S/ 12 millones) y el monto por ejecutar es S/ 108 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.15**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN MADRE DE DIOS**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL	90	9	10%	82
REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS	14	2	12%	13
REGION MADRE DE DIOS-TRANSPORTES	8	1	7%	7
OTROS	8	1	11%	7
<b>GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS</b>	<b>120</b>	<b>12</b>	<b>10%</b>	<b>108</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Madre de Dios se concentra principalmente en la UE Región Madre de Dios - Sede Central con el 75% del presupuesto. Sin embargo, la UE que tiene el mayor grado de avance es la Región Madre de Dios – Proyecto Especial Madre de Dios, con 12%.

La UE Región Madre de Dios - Sede Central resaltan los proyectos: “Comunicación y Monitoreo del COER”, que se ejecuta por tanto por Administración Directa (compra de bienes) y por Administración Indirecta (obra), cuenta con un avance financiero de 7,2% y físico de 0%; la “IEBR Augusto Bouroncle Acuña”, que se ejecuta por Administración Directa con un avance financiero de 95% y físico del 89.55%. Se tiene previsto culminar el 100% en el mes de junio 2017.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 12 millones, reflejándose una disminución de S/ 2 millones en relación al período 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Madre de Dios alcanzó el 10%, tanto en el año 2016 como en el 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.15**

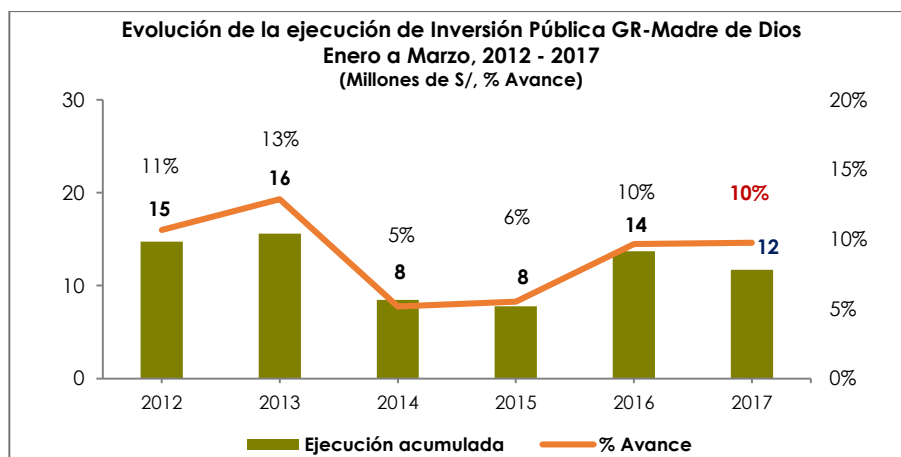

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 – 2017.



## 7.16 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Moquegua asciende a S/ 250 millones, de los cuales se ha ejecutado el 22% (S/ 56 millones) y el monto por ejecutar es S/ 194 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.16**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN MOQUEGUA**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL	198	50	25%	148
REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO	33	2	7%	31
REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	13	2	16%	11
OTROS	7	2	24%	5
<b>GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA</b>	<b>250</b>	<b>56</b>	<b>22%</b>	<b>194</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Moquegua se concentra principalmente en la UE Región Moquegua - Sede Central. La UE Sede Central, de un total asignado de S/ 198 millones; hacia fines de marzo sólo alcanzó un grado de avance de 25%.

El proyecto más representativo y estratégico del Gobierno Regional Moquegua es "Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua", el mismo que se ejecuta por contrata, tanto el equipamiento como la infraestructura. Tiene un avance físico de 66.32% y se tiene como fecha de culminación a julio 2017. Hasta el momento el proyecto se ejecuta según lo programado.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 56 millones, reflejándose un incremento de S/ 41 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Moquegua aumentó de 6% en el año 2016 a 22% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.16**

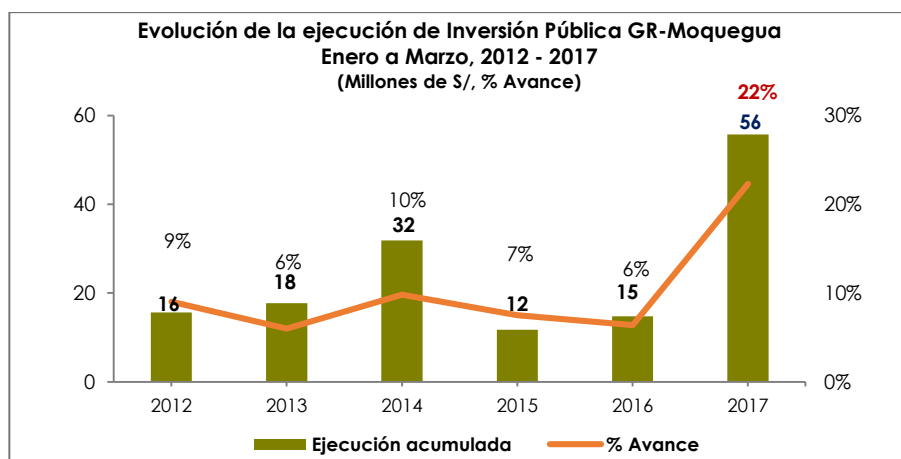

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.17 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Pasco asciende a S/ 188 millones, de los cuales se ha ejecutado el 24% (S/ 45 millones) y el monto por ejecutar es S/ 143 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.17**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN PASCO**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION PASCO-SEDE CENTRAL	179	43	24%	137
GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL	6	1	23%	5
REGION PASCO-AGRICULTURA	1	1	42%	1
REGION PASCO-TRANSPORTES	1	0	0%	1
<b>GOBIERNO REGIONAL DE PASCO</b>	<b>188</b>	<b>45</b>	<b>24%</b>	<b>143</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Pasco se concentra principalmente en la UE Región Pasco – Sede Central. La UE Sede Central, de un total asignado de S/ 179 millones; hacia fines de marzo alcanzó un grado de avance de 24%.

El GR de Pasco viene ejecutando el Hospital Regional Daniel A Carrión, con avance físico de 41.91% y el PIP "Saneamiento Integral de EMAPA Pasco" obra paralizada por falta de disponibilidad de frentes de trabajo, con un avance físico de 31.12% a cargo del Consorcio Pasco I.

Al cierre del mes de marzo del 2017, registra una ejecución de S/ 45 millones, reflejándose un aumento de S/ 37 millones con relación al mismo período del 2016; respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Pasco ha aumentado de 3% en el año 2016 a 24% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.17**

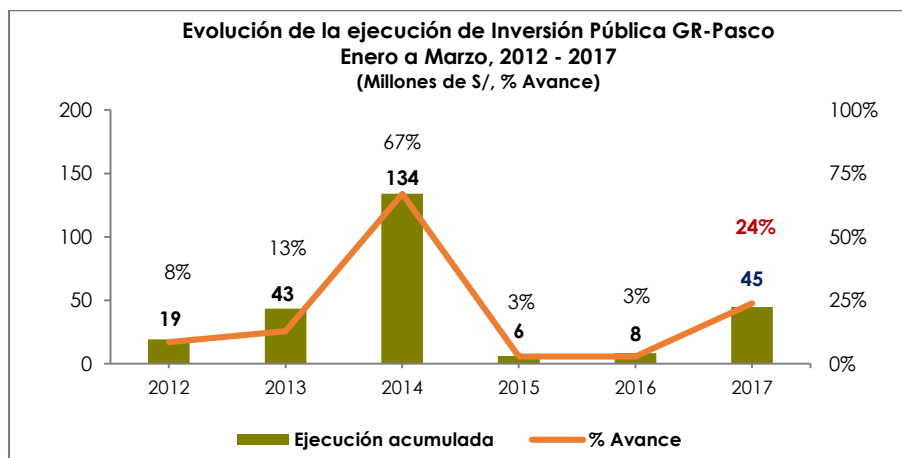

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.18 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Piura asciende a S/ 428 millones, de los cuales se ha ejecutado el 6% (S/ 28 millones) y el monto por ejecutar es S/ 400 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.18**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN PIURA**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION PIURA-SEDE CENTRAL	200	14	7%	186
REG. PIURA- PROY. ESP. DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA	153	3	2%	150
REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON HUANCABAMBA	24	1	5%	23
OTROS	50	9	17%	42
<b>GOBIERNO REGIONAL DE PIURA</b>	<b>428</b>	<b>28</b>	<b>6%</b>	<b>400</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Piura se concentra principalmente en la UE Sede Central, de un total asignado de S/ 200 millones; hacia fines de marzo, alcanzó un grado de avance de 7%.

El Gore Piura, viene ejecutando el Componente N° 01: Presa Tronera y Túnel de Trasvase del Proyecto "Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura" por S/ 474 mill., cuyo avance financiero es de S/ 27.73 mill. Así mismo en Marzo se convocaron procedimientos de selección para la ejecución de obra de los proyectos por S/ 18.3 mill., Carretera Guineo – Chivatós por S/ 7.26 mill. Y Defensas Ribereñas, Sector La Huaquilla por S/ 3.75 mill.

Al cierre del mes de marzo del 2017, registra una ejecución de S/ 28 millones, reflejándose una disminución de S/ 6 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Piura ha disminuido de 9% en el año 2016 a 6% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.18**

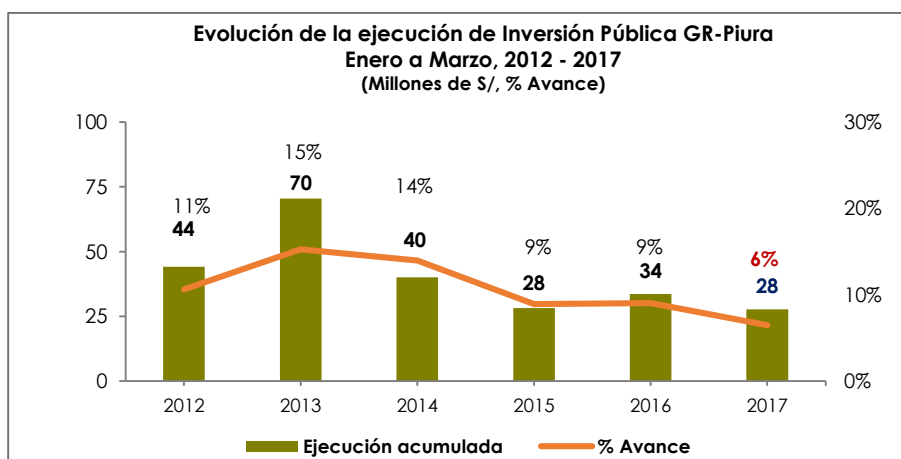

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.19 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Puno asciende a S/ 191 millones, de los cuales se ha ejecutado el 9% (S/ 17 millones) y el monto por ejecutar es S/174 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.19**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN PUNO**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION PUNO-SEDE CENTRAL	178	16	9%	163
REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO	6	0	7%	6
REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE	5	1	23%	4
REGION PUNO-AGRICULTURA	1	0	12%	1
<b>GOBIERNO REGIONAL DE PUNO</b>	<b>191</b>	<b>17</b>	<b>9%</b>	<b>174</b>


En Millones de Soles.

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Puno se concentra principalmente en la UE Región Puno - Sede Central con el 93% del presupuesto. Sin embargo, la UE que tiene el mayor grado de avance es el Programa Regional de Riego y Drenaje con 23%.

El Gobierno Regional Sede Central viene ejecutando el proyecto "Mejoramiento de la Carretera Azángaro - Saytocochoa – Sandia-San Juan del Oro" Monto de Inversión actualizado de S/ 184.1 millones, el PIM para el 2017 es de S/ 40,9 millones y será ejecutado por Administración Indirecta, se adjudicó la buena pro el 24/03/17, iniciará ejecución a fines de abril 2017.

Al cierre del mes de marzo del 2017, registra una ejecución de S/ 17 millones, tal cual al período 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Puno aumentó de 8% en el año 2016 a 9% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

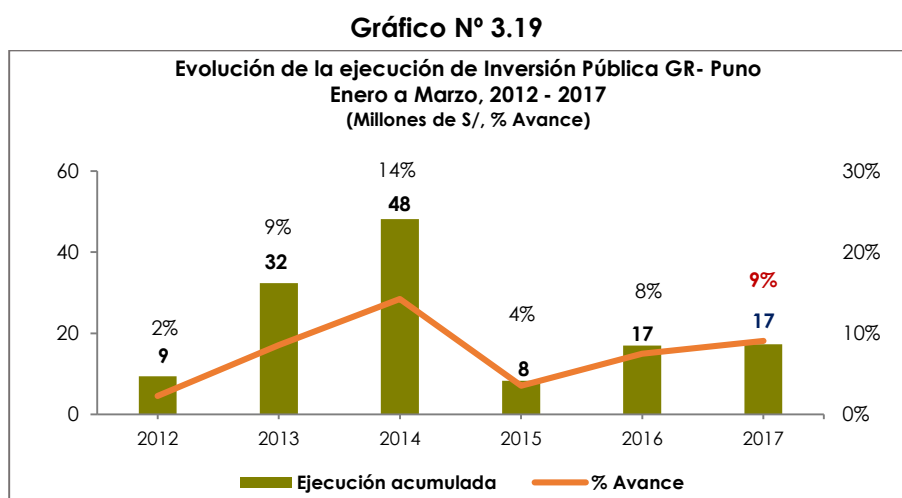

Fuente: Consulta Amigable SI AF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.20 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de San Martín asciende a S/ 348 millones, de los cuales se ha ejecutado el 19% (S/ 65 millones), dejando un saldo de 283 millones por ejecutar. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.20**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN SAN MARTÍN**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	160	35	22%	125
REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL	96	18	19%	78
REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	55	7	12%	49
OTROS	36	5	15%	31
<b>GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN</b>	<b>348</b>	<b>65</b>	<b>19%</b>	<b>283</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017

El presupuesto de la región San Martín se concentra principalmente en la UE Región San Martín - Huallaga Central y Bajo Mayo-PEHCBM, de un total de S/ 160 millones asignados; hacia fines del mes de marzo alcanzó un grado de avance de 22%.

Entre los principales proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional de San Martín resaltan el **"Hospital Tarapoto II"** la obra se encuentra culminada al 100% a noviembre de 2016, el equipamiento para el tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios se encuentran en arbitraje. Según cronograma de recepción de obra se viene verificando el levantamiento de observaciones hasta el 14.04.2017, y se prevé la suscripción del acta de recepción de obra el 21.04.17. Se logró devengar S/ 12.37 millones por obligaciones pendientes. **"Hospital de Tocache"** se viene ejecutando por administración indirecta y presenta un avance físico del 42.75%, el proyecto se ejecuta de forma normal.

Al cierre del mes de marzo del 2017, se registra una ejecución de S/ 65 millones, reflejándose un incremento de S/ 21 millones respecto al mismo período del año 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de San Martín ha mejorado de 8% en el año 2016 a 19% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.20**

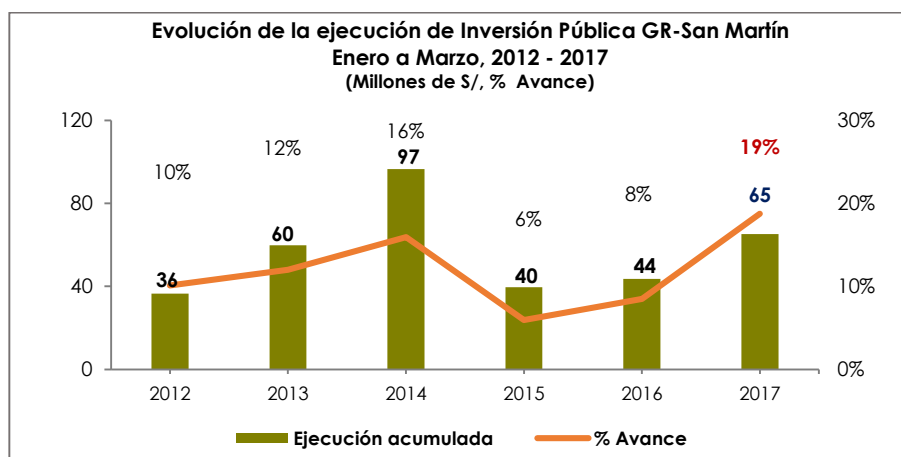

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.21 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Tacna asciende a S/ 181 millones, de los cuales se ha ejecutado el 9% (S/ 16 millones) y el monto por ejecutar es S/ 165 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.21**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN TACNA**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION TACNA-SEDE CENTRAL	127	14	11%	113
REGION TACNA - PROY. ESP. RECURSOS HIDRICOS TACNA	54	2	4%	52
<b>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</b>	<b>181</b>	<b>16</b>	<b>9%</b>	<b>165</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Tacna se concentra principalmente en la UE Región Tacna - Sede Central. La UE Región Tacna - Sede Central, de un total asignado de S/ 127 millones; a fines de marzo alcanzó un grado de avance de 11%.

La Región Tacna, ejecuta desde el 2013 por componentes en la modalidad de Administración Directa e Indirecta el PIP "Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle Tacna – Vilavilani – Fase I" por S/ 340 millones, actualmente se tiene la convocatoria del Componente Canal Villachauilani, cuyo principal problema es la elevación a OSCE, la entidad programa la reanudación de procedimiento de selección el 03.04.2017 y el otorgamiento de buena pro para el 28.04. Al 31 de marzo el PIP acumula un avance físico real del 20 % y un devengado acumulado de S/ 50.97 mill.

Al cierre del mes de marzo del 2017, registra una ejecución de S/ 16 millones, reflejándose un aumento de S/ 9 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Tacna incrementó de 5% en el año 2016 a 9% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.21**

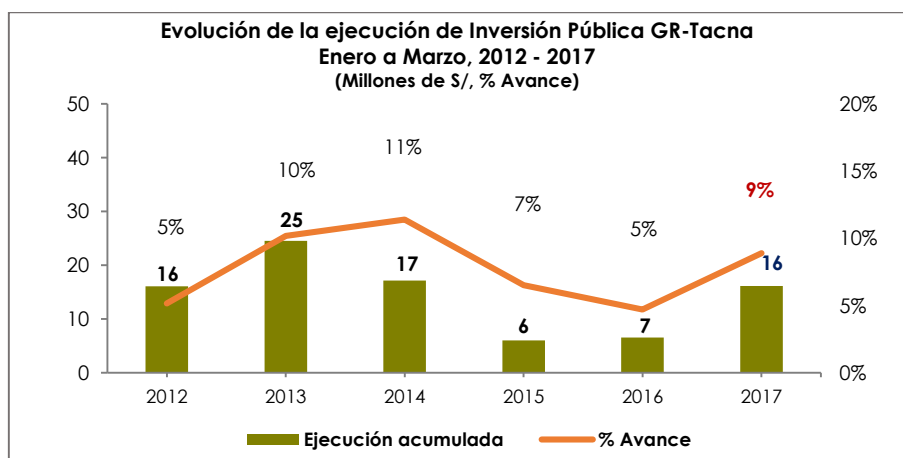

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.22 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Tumbes asciende a S/ 86 millones, de los cuales se ha ejecutado el 9% (S/ 8 millones) y el monto por ejecutar es S/ 78 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.22**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN TUMBES**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	86	8	9%	78
REGION TUMBES-SALUD	0	0	100%	0
<b>GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES</b>	<b>86</b>	<b>8</b>	<b>9%</b>	<b>78</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Tumbes se concentra principalmente en la UE Región Tumbes - Sede Central. La UE Sede Central, de un total asignado de S/ 86 millones; hacia fines de marzo sólo alcanzó un grado de avance de 9%.

El Gobierno Regional de Tumbes se encuentra ejecutando dos obras importantes: La Carretera Zarumilla – El Bendito, que cuenta tiene un avance físico de 51.08%; y, el proyecto educativo I.E. Encinas la misma que tiene un avance físico de 96.49%.

Al cierre del mes de marzo del 2017, registra una ejecución de S/ 8 millones, reflejándose una disminución de S/ 4 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Tumbes ha disminuido de 13% en el año 2016 a 9% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017. .

**Gráfico N° 3.22**

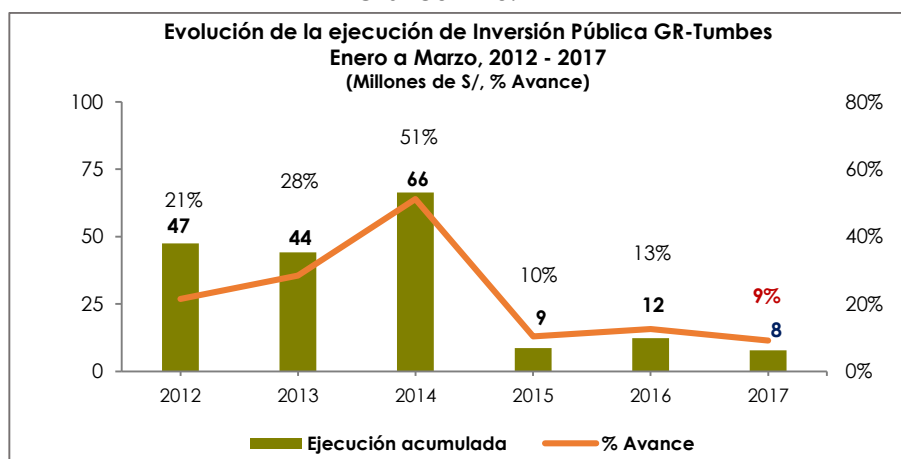

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.23 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ucayali asciende a S/ 202 millones, de los cuales se ha ejecutado el 13% (S/ 27 millones) y el monto por ejecutar es S/ 175 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.23**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN UCAYALI**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL	158	22	14%	136
REGION UCAYALI-AGRICULTURA	14	1	4%	13
REGION UCAYALI-RAYMONDI	9	2	22%	7
OTROS	21	2	11%	19
<b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b>	<b>202</b>	<b>27</b>	<b>13%</b>	<b>175</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017

El presupuesto de la región Ucayali se concentra principalmente en la UE Región Ucayali – Sede Central. Esta UE, de un total de S/ 158 millones asignado, hacia fines de marzo alcanzó un grado de avance de 14%.

Entre los principales proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional de Ucayali resalta el **“Hospital Regional de Pucallpa”** el **plan de contingencia** se ejecuta por etapas. **Etapa I** culminado al 100%. **Etapa II**, su implementación se definirá en el mes de abril, precisando la alternativa a seguir. **Obra principal**, se ejecuta por administración indirecta y presenta un avance físico del 11.75%, muestra un avance superior a lo programado (8.06%), la libre disponibilidad del terreno se prevé para el mes de setiembre de 2017.

Al cierre del mes de marzo del 2017, registra una ejecución de S/ 27 millones, reflejándose un aumento de S/ 12 millones respecto al mismo período del año 2016; respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Ucayali aumentó de 4% en el año 2016 a 13% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.23**

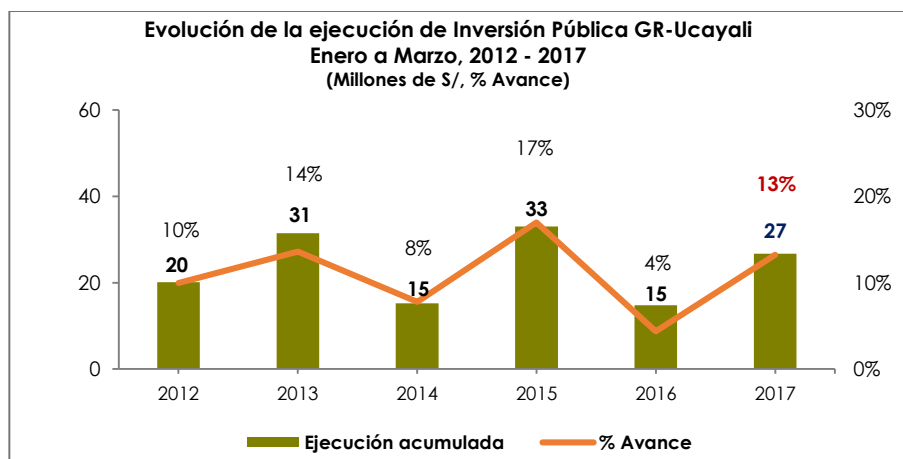

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.



## 7.24 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Lima asciende a S/ 235 millones, de los cuales se ha ejecutado el 7% (S/ 18 millones) y el monto por ejecutar es S/ 218 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.24**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN LIMA**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION LIMA	151	12	8%	139
REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	76	5	6%	71
REGION LIMA - LIMA SUR	8	1	10%	7
<b>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA</b>	<b>235</b>	<b>18</b>	<b>7%</b>	<b>218</b>

En Millones de Soles.


Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Lima se concentra principalmente en la UE Región Lima. La UE Región Lima, de un total asignado de S/ 151 millones; hacia fines de marzo alcanzó un grado de avance de 8%.

Entre otros, destaca el PIP "Hospital Regional de Cañete" con un PIM de S/ 37.40 millones, cuya obra muestra un avance físico real de 51.10%, al mes de marzo, correspondiente a la ejecución de la meta II. Asimismo, el PIP "Mejoramiento capacidad operativa de maquinaria pesada para atención de emergencias" con un PIM de S/ 22.71 millones, en actuaciones preparatorias para convocar proceso para ejecución, cuya fecha de publicación se estima para el 25.04.2017.

Al cierre del mes de marzo del 2017, registra una ejecución de S/ 18 millones, reflejándose una disminución de S/ 21 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Lima disminuyó de 24% en el año 2016 a 7% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.24**

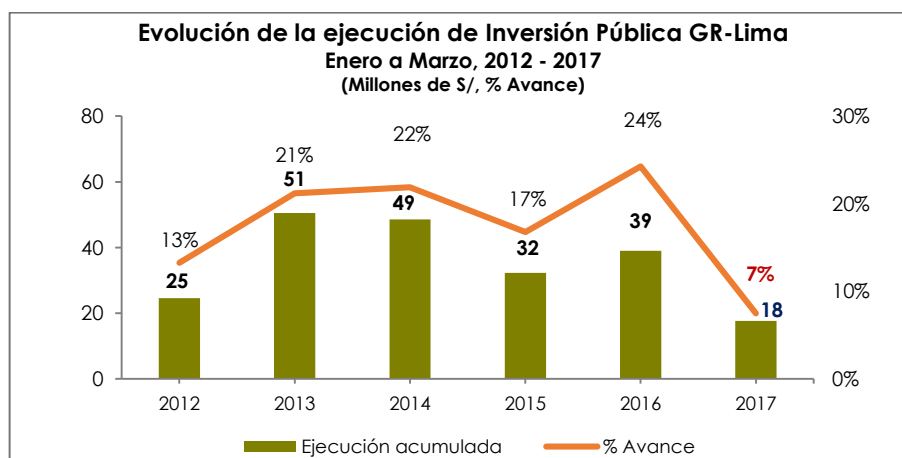

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.25 GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional del Callao asciende a S/ 184 millones, de los cuales se ha ejecutado el 19% (S/ 35 millones) y el monto por ejecutar es S/ 150 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.25**  
**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – REGIÓN CALLAO**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION CALLAO	170	35	20%	135
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	11	0	0%	11
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	2	0	0%	2
OTROS	1	0	16%	1
<b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>	<b>184</b>	<b>35</b>	<b>19%</b>	<b>150</b>


En Millones de Soles.

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

El presupuesto de la región Callao se concentra principalmente en la UE Región Callao, de un total asignado de S/ 170 millones; hacia fines de marzo alcanzó un grado de avance de 20%.

Entre otros, destaca el PIP “Vía Costa Verde” en ejecución por contrata, con un avance físico real, hacia marzo, de 87.90%; en trámite para la conformidad de pago de valorizaciones de obra (febrero) por S/ 17.28 mill. A la fecha, prosiguen acciones previas para sustentar 6ta. Verificación de viabilidad. Dos arbitrajes en curso, uno por reconocimiento de pago de Gastos Generales y otro por reconocimiento de pago de valorizaciones de 4to Adicional de Supervisión autorizado por la CGR.

Al cierre del mes de marzo del 2017, registra una ejecución de S/ 35 millones, reflejándose un incremento de S/ 5 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Callao aumentó de 10% en el año 2016 a 19% en el 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

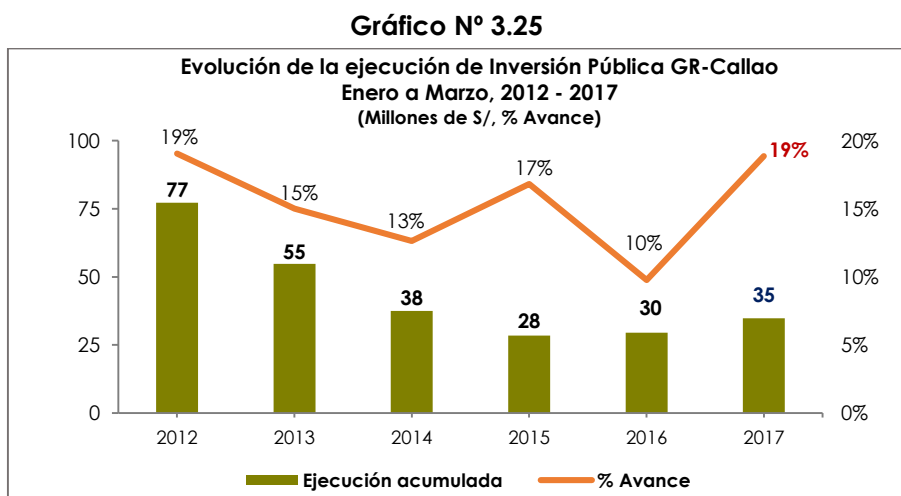

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 - 2017.

## 7.26 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Al 31 de marzo del 2017, el presupuesto asignado a La Municipalidad Metropolitana de Lima asciende a S/ 40 millones, habiendo ejecutado el 34% (S/ 13 millones) y el monto por ejecutar es S/26 millones. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública por unidades ejecutoras.

**Cuadro N° 3.26**

**DESEMPEÑO GENERAL POR EJECUTORA – MM - LIMA**

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEV	AVAN	SALDO
REGION LIMA METROPOLITANA	40	13	34%	26
<b>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>34%</b>	<b>26</b>


En Millones de Soles.

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2017.

Entre otros, destaca el PIP "Creación Estación Andrés Reyes-COSAC I" con un PIM de S/ 8.31 millones. El 30.03.17 se convocó procedimiento para ejecución de obra por S/ 7.69 millones, cuya buena pro está prevista para el 09.05.17; ejecución estará a cargo de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. (EMAPE).

Al cierre del mes de marzo del 2017, registra una ejecución de S/ 13 millones, reflejándose un incremento de S/ 13 millones al mismo período del 2016, respecto al nivel de avance el Gobierno Regional de Lima Metropolitana aumentó de 0% en el año 2016 a 34% en el año 2017. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ejecución desde enero a marzo del año 2012 al 2017.

**Gráfico N° 3.26**

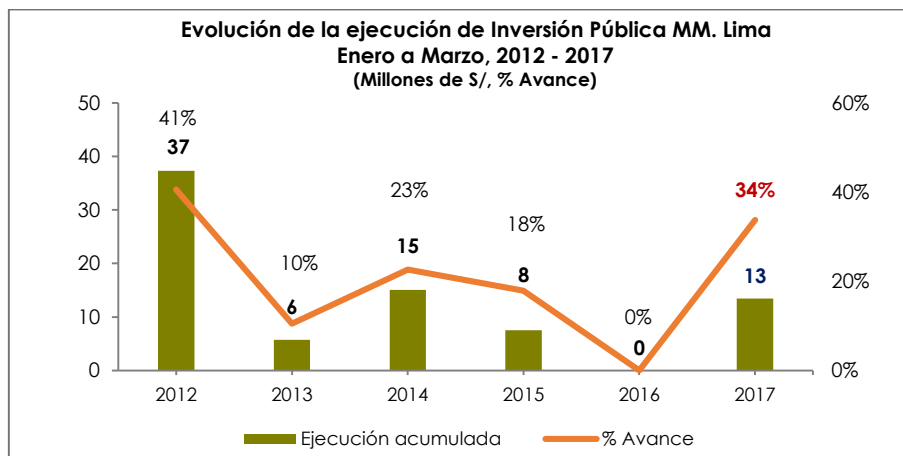

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF. Al 31 de marzo del 2012 – 2017.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministerio  
de Economía

Dirección General  
de Inversión Pública

Lima, 15 de abril del 2017.

**Unidad de la Gestión de la información**  
**Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública**  
Dirección General de Inversión Pública  
Ministerio de Economía y Finanzas
