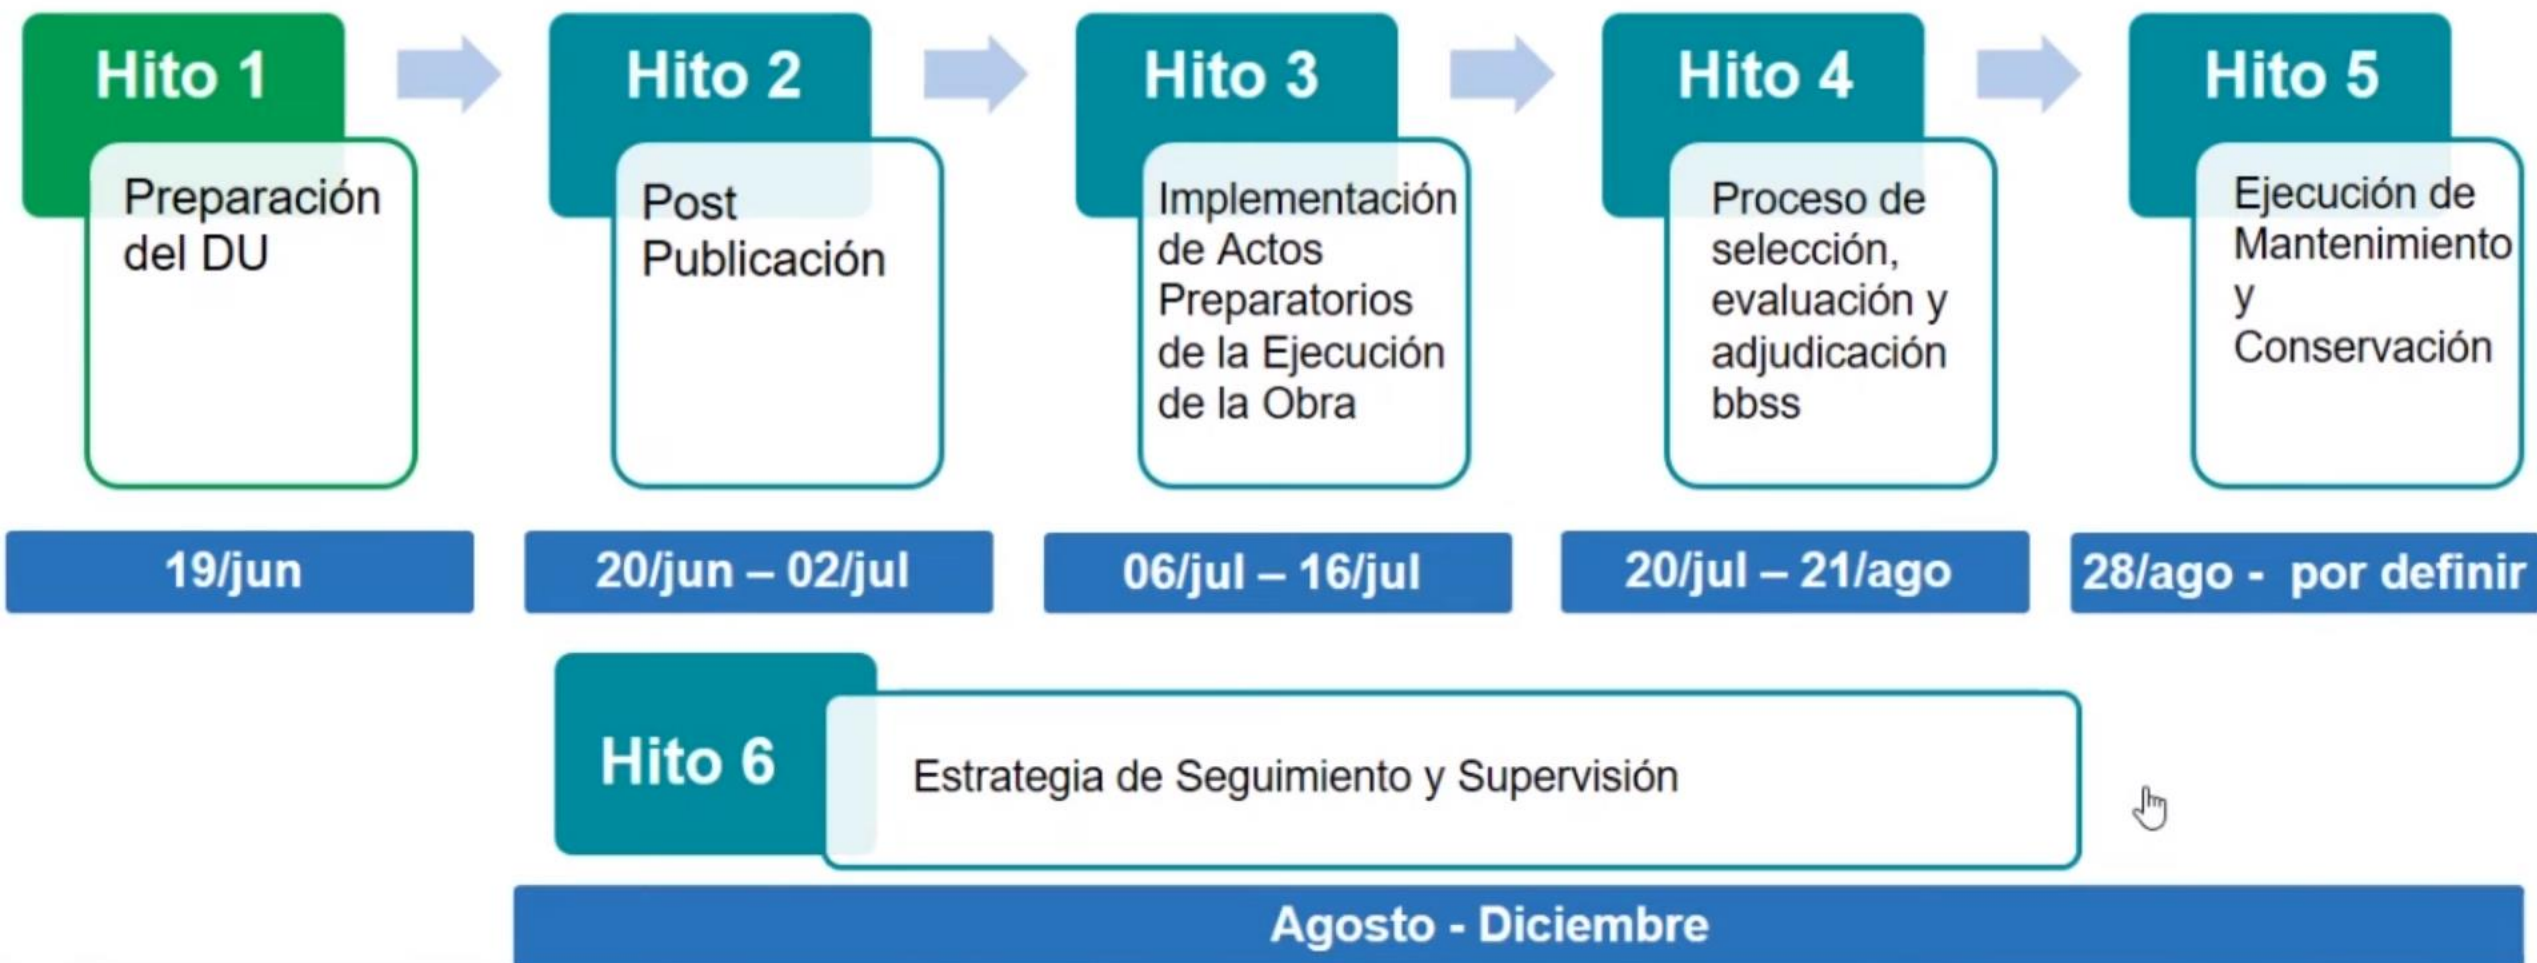

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

Ejecución del Mantenimiento vial en la RVV y RVD



Estrategia de Seguimiento - cronograma

La implementación de la estrategia Mantenimiento vial vecinal y nacional contempla los siguientes hitos:



✓ Hito 1: Post Publicación (20/jun – 02/jul)

N°	Actividad	Fecha	Productos
1	Publicación de las disposiciones adicionales previstas en el DU	20.Jun - 25.jun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lineamientos para la elaboración de Planes de Gestión Vial ▪ Manual de Operaciones para el mantenimiento de la Red Vial Departamental y Vecinal ▪ Formato de Registro de Información de Inventario Vial ▪ Publicación de base de selección ▪ Formato de Términos de Referencia ▪ Formato Bases de selección
2	Registro georeferenciado	20.Jun - 26.jun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registro referenciado a nivel de tramos validado por MINAM y MINCU.
3	Estrategia comunicacional	22.Jun - 24.jun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elab. y difusión del Video informativo en página web y redes sociales del MEF y PCM ▪ Elaboración y difusión de post en redes sociales del MEF y PCM ▪ Manual de operaciones y formatos colgados en la página web del MEF ▪ FAQ de presupuesto y contrataciones
4	Asistencia técnica	27.Jun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AT a OGA y gerencia de infraest. en contrataciones, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades de mantenimiento vial. ▪ AT para GR sobre los procedimientos de evaluación ambiental
5	Asistencia técnica de MTC	09.Jul – 10.jul	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementación y AT del Sistema y Monitoreo de Provias Descentralizado para asistencia técnica, seguimiento y monitoreo
6	Incorporación de recursos para la contratación del personal y contratación de bbyss	20.jun – 30.jun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferencia de partidas para el financiamiento de la contratación ▪ Aprobación de la Resolución para la incorporación de la transferencia del DU ▪ Remisión de la Resolución al Congreso, MEF y Contraloría ▪ OGPP instruye a UE para elaboración de "Notas para Modificación Presupuestaria"
7	Contratación del personal para procesos administrativos y logísticos	26.jun – 02.jul	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adecuación de perfiles y formato ▪ Contratación de personal e inspectores de obra para acciones de contrataciones, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades de mantenimiento vial

Hito 2 - 4 (06/jul – 21/ago)



Hito 2: Implementación de Actos Preparatorios de Ejecución de Obra



N°	Actividad	Fecha
1	Adecuación de TDR	06.Jul
2	Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado	07 Jul
2	Aprobación de expediente de contratación	08.Jul
3	Instalación del comité de selección	10.Jul
4	Adecuación de las bases y aprobación	14.Jul – 16.jul



Hito 3-4: Proceso de selección, evaluación y adjudicación bbyss

N°	Actividad	Fecha
1	Convocatoria	20.Jul
2	Registro de participantes y presentación de ofertas	03.Ago
3	Evaluación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro	05.Ago
4	Presentación de documentación para la Adjudicación	14.Ago
5	Verificar la documentación presentada	18.Ago
6	Notificación al proveedor	18.Ago
7	Subsanación (de corresponder)	20.Ago
8	Perfeccionamiento y Suscripción del contrato	21.Ago
9	Compromiso	21.Ago

Metas de ejecución de mantenimiento vía nacional y vecinal

-  Para poder establecer las metas de ejecución se ha revisado los plazos de los procedimientos de selección establecido en el Decreto de Urgencia 070-2019, con lo que se estima que la **ejecución iniciará en Setiembre**. Para que ello sea posible, se estima que el **certificado y compromiso**, debe darse en **Julio y Agosto**, respectivamente.
-  Sobre ello se estimó una tasa de ejecución promedio mensual de Setiembre a Diciembre (2017-2019), la cual se ajustó para alcanzar una ejecución del 100% al final de 2020, por Pliego y para los Productos 3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL y 3000133. CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL, respectivamente en la Genérica 3 Bienes y Servicios sin tomar en consideración el CAS y los SSBB.

