




# **INOVACIONES TECNOLOGICAS PARA FACILITAR EL REPORTE DE TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOCIAL DE LOS PROGRAMAS**

**SISTEMA DE PROGRAMACION Y GESTION POR METAS Y RESULTADOS**

**METAS-SIGOB**

**Secretaria Técnica de la  
Presidencia de la República de El Salvador**

# Comparativo Inversión Pública Programada / Ejecutada Período 2006-2010 (en millones US\$)

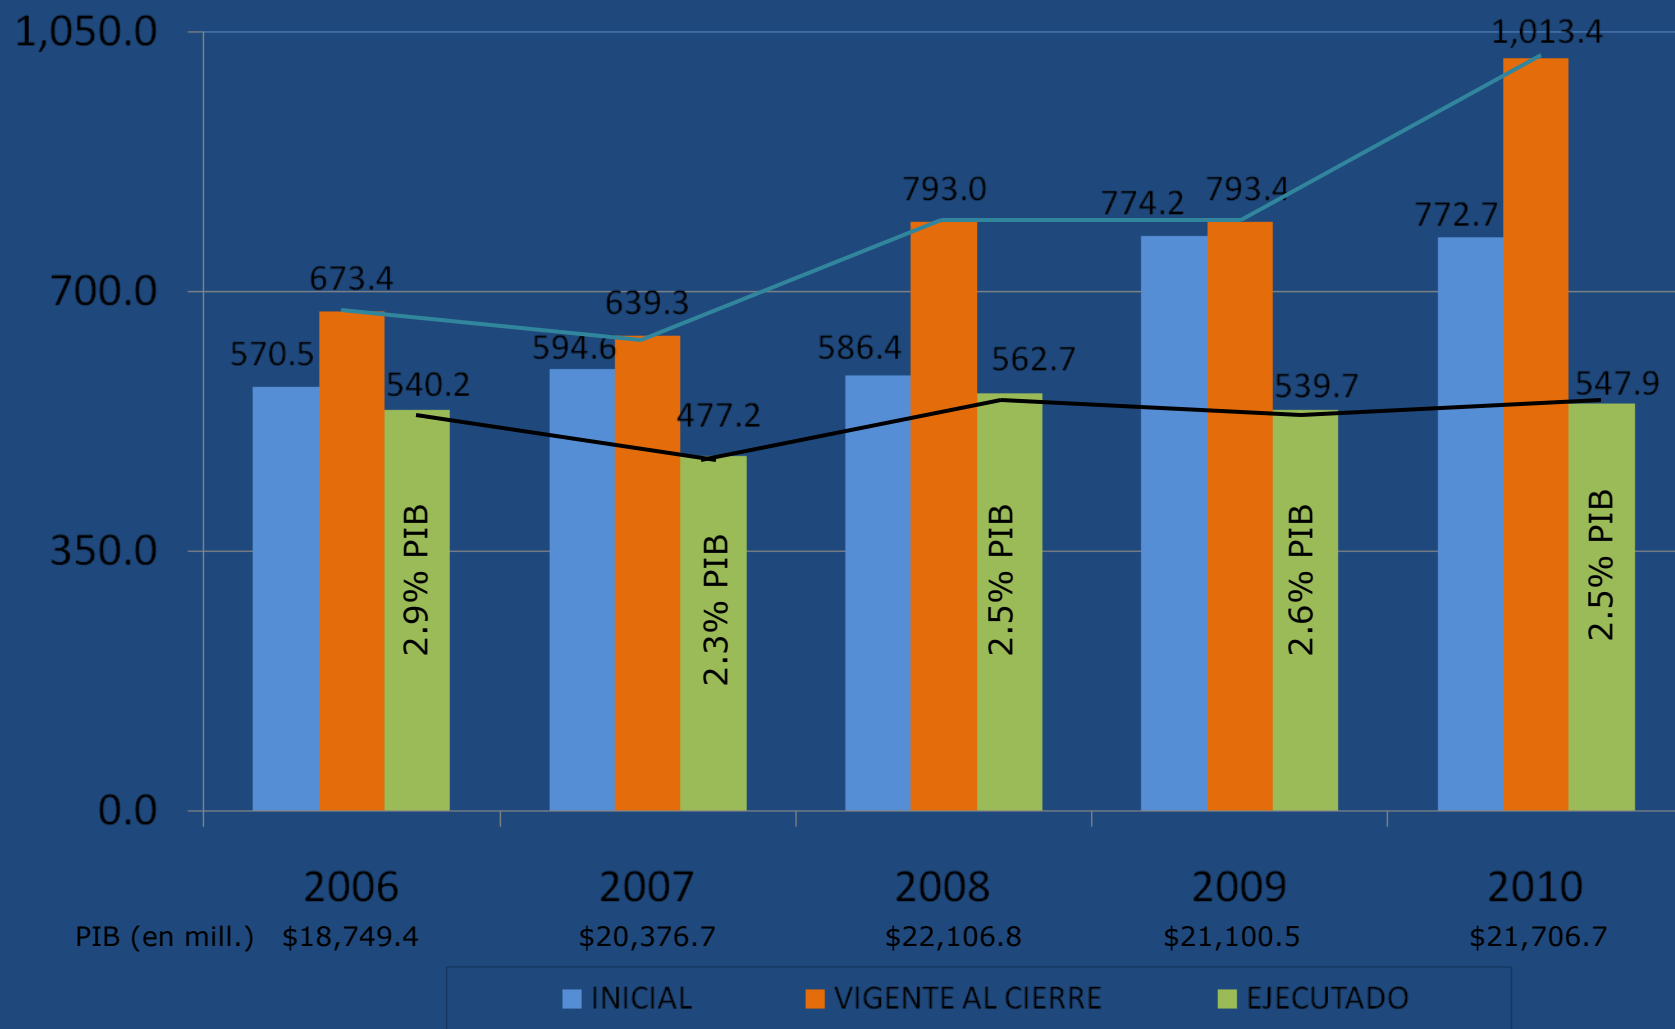

**Presidencia de la República de El Salvador**  
**METAS-SIGOB Organización del trabajo (Red)**



**CIUDADANIA**



**MINISTRA/ O**

Semanalmente atiende  
Alertas, Restricciones y Oportunidades

Mensualmente  
Toma conocimiento del Avance , Indicadores e indica reprogramaciones



**PRESIDENCIA**



**GRUPO DE ESTRATEGIA**

Semanalmente atiende  
Alertas, Restricciones y Oportunidades  
Transectoriales  
Mensualmente  
Toma conocimiento del Avance , Identifica sinergias y toma decisiones

**PRESIDENTE**

Recibe propuestas de acción presidencial: normativas, técnico-administrativas, político directas y de acción comunicacional



**GERENTE DE META**

Registro semanal  
Restricciones, Alertas y Oportunidades

Registro Mensual:  
Logros del último mes e Indicadores



**COORDINADOR INSTITUCIONAL**

Semanalmente atiende  
Alertas - Restricciones y valida oportunidades

Mensualmente valida  
Reporte de Avance e Indicadores





***El Sistema de Inversión Pública de El Salvador se enmarca en el Sistema Público de Administración Financiera Nacional, regido por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, conocida como la Ley AFI, que data de 1995, (Decreto Ley 516) y ha sido objeto de varias reformas***



# Introducción

- EN EL MES DE MAYO SE DESTACA UNA BAJA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA Y SE ACUERDA DE IMPLMENTAR SISTEMA DE PROGRAMACION Y GESTION POR METAS Y RESULTADOS A TRAVES DEL APOYO DEL PNUD .
- LA IMPLEMENTACION SE COORDINO CON LA PARTICPACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA-SECRETARIA TECNICA (FUNCION COORDINADOR DE LA PLANIFICACION NACIONAL Y DE ACUERDO A LO DEFINIDO AL PLAN QUINQUENAL)-SECRETARIA DE COMUNICACIONES-SECRETARIA DE TRANSPARENCIA.

## **CONTENIDO DEL SISTEMA**

### **AVANCES**

- SEMANALES
- MENSUALES
- INDICADORES DE RESULTADOS

### **TRATAMIENTO DE**

- ALERTAS
- RESTRICCIONES

### **IDENTIFICACION**

- COMUNICACIONALES
- AGENDA DE PARTICIPACION


## **CARACTERISTICAS**

### **TRANSPARENCIA**

### **INTERACCION REDES**

### **ESTRATEGIA**

# RUTINAS SEMANALES Y MENSUALES PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS

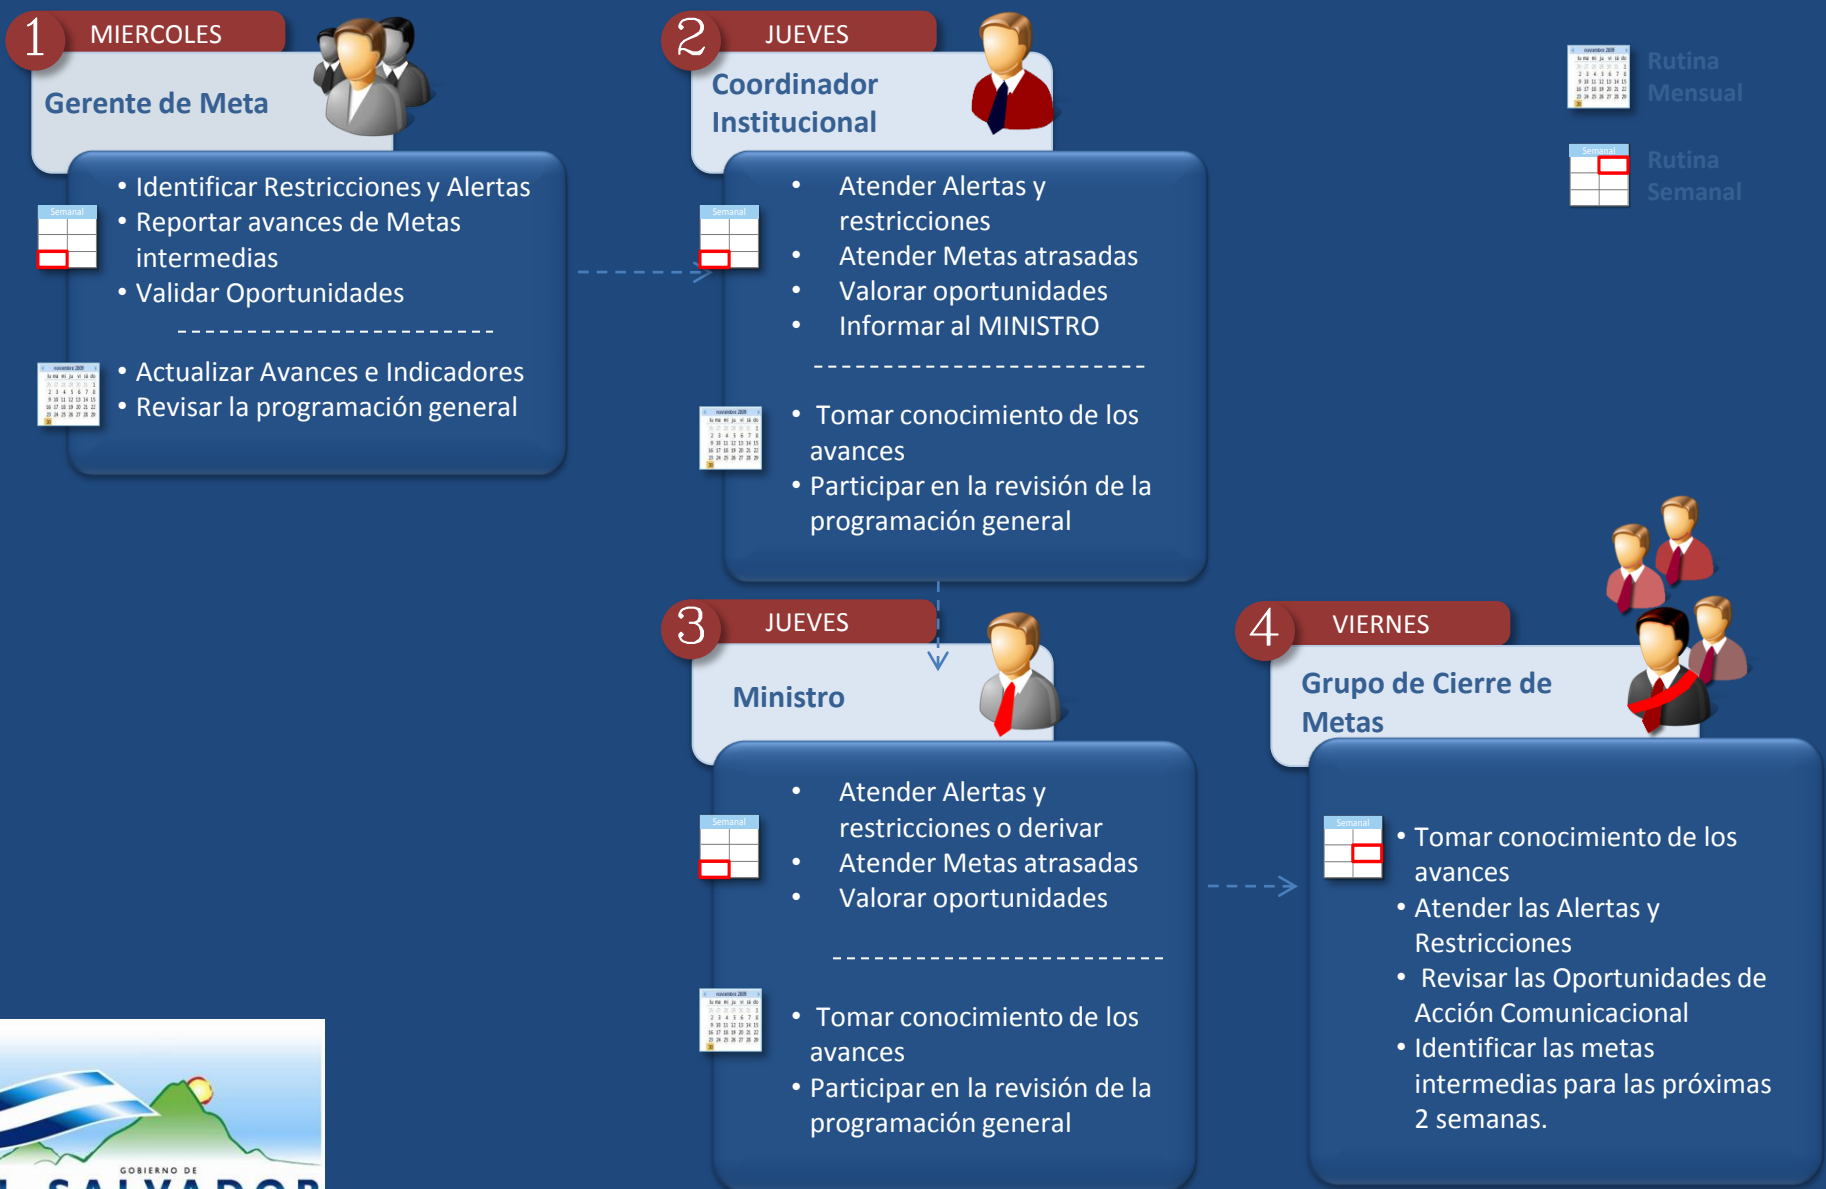

**Presidencia de la República**

El Salvador

( 1 ) usuarios activos en el SIGOB

PROGRAMAS DE ACCIÓN DE GOBIERNO

**EL SALVADOR****INICIO DE SESION****Ingresar**☐

El equipo desde el cual estoy accediendo es de uso privado, por lo que deseo que se guarden mis datos de usuario y contraseña, para futuros accesos.

Introduzca sus datos de usuario y haga clic en la opción Ingresar para acceder.

**SIGOB**

PNUD DRALC



(c) Copyright 2007. UNDP/RLA2000 Todos los derechos reservados.





# Presidencia de la República

El Salvador

(1) usuarios activos en el SIGOB

Grupo de Cierre, Grupo de Cierre

(Grupo Estratégico)



Consulta de Metas

Consulta Metas Intermedias

Control Alertas y Restricciones

Reportes

Búsquedas

Guías

## TABLERO DE GESTIÓN DE METAS PARA EL GRUPO ESTRATÉGICO



El listado de metas está ordenado por el número de Restricciones y Alertas y luego por la cantidad de Metas Intermedias atrasadas y reprogramadas.

TOTAL DE METAS : 129

♦ 2 Detenidas (1.6%)      ● 125 en Ejecución Normal (96.9%)  
■ 1 Retrasadas (0.8%)      ★ 1 Terminadas (0.8%)

Fecha  
Finalización

Metas Intermedias con

Metas Intermedias

⚡ Restricciones

🔔 Alertas

Ges. Atr. Rep. Opo.



Reparacion de Carcavas en la ruta RN03E (Paquete 2), Santa Cruz Analquito, Cuscatlan

28 feb 2011  
Venció: -44 días.

0 0 0 0 0 1

2 2 0 0

5289 Construcción de Obras de Mitigación en Daños causados por la Tormante IDA en Vías Pavimentadas

30 abr 2011  
Faltan: 16 días.

0 0 0 0 0 1

2 1 0 0

5272 Reparacion de carcavas en est. 1+130 de la ruta PAZ17E, Paraíso de Osorio, La Paz

15 may 2011  
Faltan: 31 días.

0 0 0 0 0 1

2 0 0 0

5328 Reparacion de Carcava en Est. 28+205 de la ruta RN03E, Santa Cruz Analquito, Cuscatlan

20 jun 2011  
Faltan: 67 días.

0 0 0 0 0 1

2 0 0 0

5099 Suministro e Instalación del Sistema Integral para el Centro de Atención de Emergencias 911

20 dic 2012  
Faltan: 616 días.

0 0 0 0 0 0

20 4 1 0

3737 Apertura Boulevard Diego de Holguín - Santa Tecla, Tramo II

21 feb 2012  
Faltan: 313 días.

0 0 0 0 0 0

5 3 0 0

5100 Construcción de Viviendas Permanentes en el Municipio de San Juan Nonualco, Departamento de la

14 mar 2012  
Faltan: 335 días.

0 0 0 0 0 0

31 2 0 0

EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Y ESPECIALIZADOS (COMPONENTE I , PRIMER EJE)

30 mar 2014  
Faltan: 1081 días.

0 0 0 0 0 0

21 2 0 0

4913 Ampliación, equipamiento, mejoras y/o remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuach

25 sep 2011  
Faltan: 164 días.

0 0 0 0 0 0

4 2 0 0

4878 Construcción y equipamiento de la Unidad de Salud El Molino

20 jul 2011

**Presidencia de la República**

El Salvador

(1) usuarios activos en el SIGOB

Grupo de Cierre, Gr

(Grup

Consulta de Metas

Consulta Metas Intermedias

Control Alertas y Restricciones

Reportes

Búsquedas

Guías

**Consulta de Metas > Por Dependencia Responsable > Ministerio de Obras Públicas (67)**

5467 Const. e Instal. de Obras para Puente Temp. sobre Río Titihuapa, San Idelfonso-L.D., San Vicent

Lemus, Miguel Angel

5467 Construcción e Instalación de Obras para Puente Temporal sobre Río Titihuapa, Ruta SAV25N Tramo: San Idelfonso-L.D. Cabañas, Municipio de San Idelfonso, Departamentos de San Vicente/Cabañas La obra consiste en u ...

5

Const. e instal. de Obras para Pte. Temporal sobre Río Huiza, Cantón Melara, Municipio y Dpto de La

Lemus, Miguel Angel

La obra consiste en un puente provisional, propuesta para que funcione hasta cuando se ejecute la obra definitiva, beneficiando a 35,927 habitantes el cual comprende: • Puente provisional oriente - poniente de 76. ...

0

5470 Const. e Instal. de Obras de Paso Temp. en Colonia El Sauce, Santiago Texacuango, San Salvador

Aquino Gudel, Marco Antonio

5470 Construcción e Instalación de Obras de Paso Temporal en Colonia El Sauce, Cantón El Morro, Municipio de Santiago Texacuango, Departamento de San Salvador El proyecto consiste en la construcción de un puente modu ...

5

5484 Constr. e Instal. de Obras para Puente Temp. La Pita, Cantón El Copinol, Paraíso de Osorio, La

Aquino Gudel, Marco Antonio

5484 Construcción e Instalación de Obras para Puente Temporal La Pita, sobre Camino Vecinal, Cantón El Copinol, Municipio de Paraíso de Osorio, Departamento de La Paz El proyecto consiste en la instalación de un "Pue ...

5

5466 Constr. e Instal. de Obras para Puente Temp. sobre Río Chalapán, San Pedro Perulapán, Cuscatlán

Aquino Gudel, Marco Antonio

5466 Construcción e Instalación de Obras para Puente Temporal sobre Río Chalapán, Municipio de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán El puente proyectado como solución provisional consiste en un puente modul ...

5

5464 Const. e Instal. de Obras para Puente Temp. sobre Río San Antonio, Carretera CA02, La Libertad

Aquino Gudel, Marco Antonio

5464 Construcción e Instalación de Obras para Puente Temporal sobre Río San Antonio, Carretera CA02, Municipio y Departamento de La Libertad, Zona de San Diego El proyecto consiste en un puente modular metálico de lo ...

5

5465 Const. e Instal. de Obras para Puente Temp. sobre Río Quezalapa, Camino CUS18, Suchitoto, Cusca

Aquino Gudel, Marco Antonio

5

## Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados

### 4562 - Obras de Mitigación en Zona de Cárcava Colonia Llano Verde (1 Principal y 3 Secundaria) Ilopa

Ministerio de Obras Públicas

Ver Sitio Web

1

Información de Base

2

Metas Intermedias

Consulta de Alertas

Consulta de Restricciones

Consulta de Oportunidades

Registro de Documentos

3

Reporte Avance

Indicadores Inf. Financiera

Info. de Base

Trabajos para Reporte Semanal

Reporte Mensual



El reporte de avance de esta Meta fue actualizado por última vez el 06/04/2011 por Acosta de Santos, Carolina Guadalupe



Información de Base



Histórico de Modificaciones



Reporte Impreso Estado Actual

Gerente : Acosta de Santos, Carolina Guadalupe

Área Responsable : Ministerio de Obras Públicas

Fecha Inicio : 01/07/2009

Fecha Fin : 01/02/2012

Estado de gestión : Ejecución Normal

Descripción Meta

Línea de base

Reporte de avance

Clasificadores

Las obras a realizar para la totalidad del Proyecto consisten en la limpieza y el relleno de parte de la cárcava principal con obras de retención de tierra armada en su taludes, introducción de un nuevo sistema colector de aguas lluvias, construcción de una canaleta de descarga en la quebrada, retención de tierra con soil nailing para protección de la colonia, drenaje superficial con canaletas media caña, reconstrucción de la descarga principal sobre la quebrada, obras de cobertura vegetal y cerca de protección en cárcava principal. Las obras a ejecutar para la Etapa 1 consisten en la limpieza y desmonte del área de la cárcava principal, los bordes de la quebrada y el fondo de la quebrada misma donde ira la canaleta, también contempla la excavación y desalojo de material contaminado en la cárcava principal y el fondo de la quebrada donde ira la canaleta. Relleno con material selecto y conformación de taludes hasta el nivel N = 99.00 en la cárcava principal. Aplicación de Soil Nailing en el borde de la quebrada que limita con las casas (lateral derecho de la quebrada), La construcción de canaletas de drenaje superficial tanto de concreto como de tierra, la construcción de la canaleta de mampostería de piedra (incluye barbacanas) en el fondo de la quebrada, en conjunto con el emplantillado de piedra del fondo de la canaleta, ampliación de muros existentes en la descarga de la canaleta, la limpieza y reparación del emplantillado de piedra.

Guardar

Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados

4562 - Obras de Mitigación en Zona de Cárcava Colonia Llano Verde (1 Principal y 3 Secundaria) Ilopa

Ministerio de Obras Públicas

Ver Sitio Web

1

Información de Base

2

Metas Intermedias

Consulta de Alertas

Consulta de Restricciones

Consulta de Oportunidades

Registro de Documentos

3

Reporte Avance

Indicadores Inf. Financiera

Info. de Base

Trabajos para Reporte Semanal

Reporte Mensual

El reporte de avance de esta Meta fue actualizado por última vez el 06/04/2011 por Acosta de Santos, Carolina Guadalupe

- Información de Base
- Histórico de Modificaciones
- Reporte Impreso Estado Actual

Gerente :	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe		
Área Responsable :	Ministerio de Obras Públicas		
Fecha Inicio :	01/07/2009	Fecha Fin :	01/02/2012
Estado de gestión :	Ejecución Normal		

Descripción Meta	Línea de base	Reporte de avance	Clasificadores
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos por administración: el avance semanal es de 1.38%; el avance total a la fecha es de 74.59%</li> <li>Muro soil - Nailing (contrato 072/2011): el proyecto está terminado en un 100%</li> <li>Colector de aguas lluvias (contrato 073/2010); el avance semanal es de 4.5%; el avance total a la fecha es de 65.5%</li> <li>El avance global del proyecto (obras por admón.contrato 072/2010,contrato 073/2010) es de 75.12%</li> </ul> <p>Se encuentra pendiente de Contratar la Cobertura Vegetal</p> <p>30/11/2011 AVANCE DEL 76.96%</p> <p>06/04/2011 AVANCE 78.44%</p>			

Guardar

## Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados

4562 - Obras de Mitigación en Zona de Cárcava Colonia Llano Verde (1 Principal y 3 Secundaria) Ilopa

Ver Sitio Web

Ministerio de Obras Públicas

1

Información de Base

2

Metas Intermedias



Consulta de Alertas



Consulta de Restricciones



Consulta de Oportunidades



Registro de Documentos

3

Reporte Avance

Indicadores Inf. Financiera

Info. de Base

Trabajos para Reporte Semanal

Reporte Mensual

No se han registrado Indicadores

Lista de Indicadores

Ejecución Financiera

Avance Financiero

MONTO INICIAL

\$2,240,927



Relacionar Meta con Proyecto



Actualizar Información



Imprimir Reporte

	Mes	Presupuesto modificado [1]	Comprometido [2]	Ejecutado [3]	% Ejecución [3/1]
	Febrero	0	0	0	-
	Marzo	\$371,722.15	\$371,722.15	\$370,122.15	99.57%
	Abril	\$157,000	\$157,000	\$81,840	52.13%
	Mayo	\$184,921.85	\$135,020	\$21,980	11.89%
	Junio	\$113,969.77	0	\$22,380	19.64%
	Julio	0	0	\$1,586.76	-
	Agosto	\$67,560.08	\$67,560.08	\$15,900	23.53%
	Septiembre	0	0	\$19,040	-
	Octubre	\$139,586.49	\$139,586.49	\$121,992.34	87.40%
	Noviembre	\$72,446.04	\$236,317.66	\$146,761.95	202.58%
	Diciembre	\$18,148.89	\$18,148.89	\$124,388.85	685.38%
	N/A	0	0	0	-
	TOTAL =>	\$1,125,355.27	\$1,125,355.27	\$925,992.05	82.28%

**Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados**

**4562 - Obras de Mitigación en Zona de Cárcava Colonia Llano Verde (1 Principal y 3 Secundaria) Ilopa**

Ministerio de Obras Públicas

Ver Sitio Web

1 Información de Base 2 Metas Intermedias 3 Reporte Avance

Con ayuda de Alertas Con ayuda de Resoluciones Con ayuda de Oportunidades Registro de Documentos Reporte Avance Indicadores Inf. Financiera

Info. de Base Trabajos para Reporte Semanal Reporte Mensual

No se han registrado Indicadores

Lista de Indicadores Ejecución Financiera Avance Financiero

**MONTO INICIAL**

**\$2,240,927**

Relacionar Meta con Proyecto

Actualizar Información

Imprimir Reporte

Mes	Presupuesto modificado [1]	Comprometido [2]	Ejecutado [3]	% Ejecución [3/1]
Año: 2011				
Enero	\$144,799.34	\$144,799.34	\$84,831.44	58.59%
Febrero	\$284,295.37	\$279,012.37	\$120,764.44	42.48%
Marzo	\$243,573.56	\$133,781.35	\$110,100	45.20%
Abril	\$315,864.94	0	0	0.00%
Mayo	\$411,463.35	0	0	0.00%
Junio	\$370	0	0	0.00%
Julio	0	0	0	-
Agosto	0	0	0	-
Septiembre	0	0	0	-
Octubre	0	0	0	-
Noviembre	0	0	0	-
Diciembre	0	0	0	-
<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>\$1,400,366.56</b>	<b>\$557,593.06</b>	<b>\$315,695.88</b>	<b>22.54%</b>

La programación financiera de las obras de mitigación se realiza en el sistema de programación financiera, para lo cual a continuación se reflejan las macropartidas de las obras a realizarse: cons....

4629 - Construcción de Caja en Arenal Monserrat y Colonia Malaga, San Salvador

Acosta de Santos, Carolina Guadalupe

Objetivo General: Construir obras de mitigación para la prevención de pérdidas de vidas humanas e inmuebles, así como devolverle a la población afectada en los sectores vulnerables, la seguridad y tranquilidad. La....


4641 - Obras de Mitigación en Zona de Quebrada la Lechuza Aledaño al Ministerio de Obras Públicas,

Acosta de Santos, Carolina Guadalupe

El proyecto tendrá como alcance los niveles de intervención necesarios que garanticen una solución definitiva de la problemática, para lo cual a continuación se reflejan las macropartidas de las obras a realizarse: cons....

3737 Apertura Boulevard Diego de Holguín - Santa Tecla, Tramo II



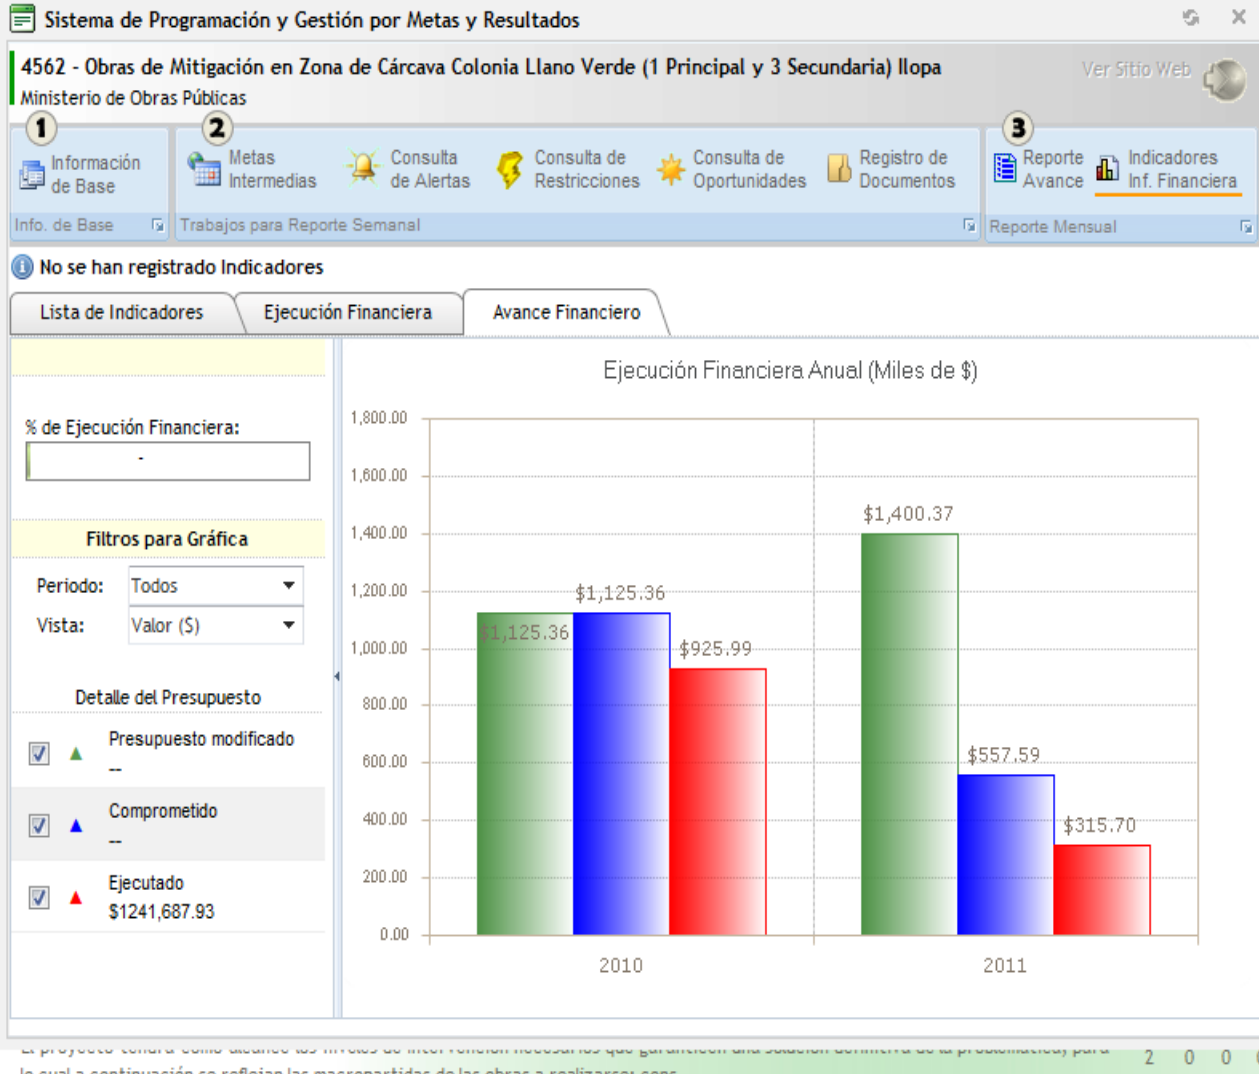




## Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados

4562 - Obras de Mitigación en Zona de Cárcava Colonia Llano Verde (1 Principal y 3 Secundaria) Ilopa


Ministerio de Obras Públicas

Ver Sitio Web




Información de Base

Info. de Base




Metas Intermedias


Trabajos para Reporte Semanal




Consulta de Alertas




Consulta de Restricciones



Consulta de Oportunidades



Registro de Documentos



Reporte Avance

Reporte Mensual

Indicadores Inf. Financiera

No se han registrado Indicadores

Lista de Indicadores

Ejecución Financiera

Avance Financiero

% de Ejecución Financiera:

## Filtros para Gráfica


Periodo: Todos

Vista: Porcentaje (%)






## Detalle del Presupuesto

☒ False☒ False☒ Ejecutado  
49.16%

Ejecución Financiera Anual (Porcentaje)

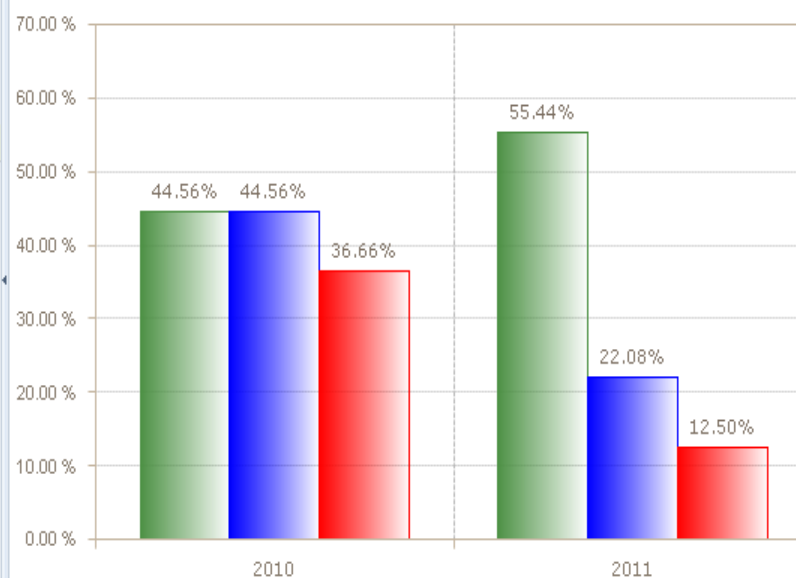

La presente tendrá como alcances los límites de intervención necesarios que garanticen una ejecución eficiente de la programación para la cual la continuación es reflejar las responsabilidades de los actores a realizarlos.





Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados

4562 - Obras de Mitigación en Zona de Cárcava Colonia Llano Verde (1 Principal y 3 Secundaria) Ilopa

Ministerio de Obras Públicas

Ver Sitio Web

1

Información de Base

Info. de Base

2

Metas Intermedias

Trabajos para Reporte Semanal

Consulta de Alertas

Consulta de Restricciones

Consulta de Oportunidades

Registro de Documentos

3


Reporte Avance

Reporte Mensual

Indicadores Inf. Financiera

No se han registrado Indicadores

Lista de Indicadores Ejecución Financiera Avance Financiero

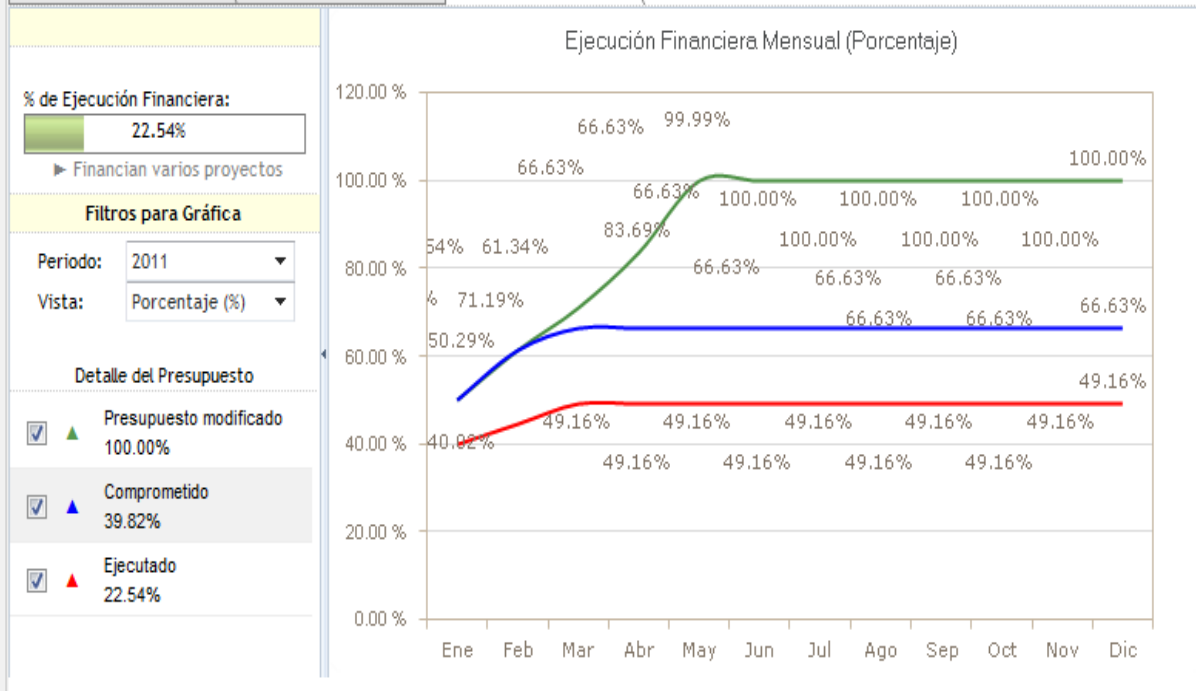

**Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados**

4562 - Obras de Mitigación en Zona de Cárcava Colonia Llano Verde (1 Principal y 3 Secundaria) Ilopa

Ministerio de Obras Públicas

Ver Sitio Web

1 Información de Base 2 Metas Intermedias 3 Reporte Avance

Consulta de Alertas Consulta de Restricciones Consulta de Oportunidades Registro de Documentos Indicadores Inf. Financiera

Info. de Base Trabajos para Reporte Semanal Reporte Mensual

+ Agregar Documento X Eliminar Documento


	Nombre	Insertado por	Tamaño	Insertado el
<input type="checkbox"/>	FOTOGRAFIAS AL 30/03/2011	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	1229312	30 marzo 2011
<input type="checkbox"/>	Fotografía I	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	2401792	19 enero 2011
<input type="checkbox"/>	Fotografía II	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	3637760	19 enero 2011
<input type="checkbox"/>	informe 14 al 18 febrero 2011	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	2461696	23 febrero 2011
<input type="checkbox"/>	INFORME AL 16/03/2011	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	621568	16 marzo 2011

La proyecto tendrá como acciones las metas de mediano plazo que garanticen una ejecución eficiente de la programación para la cual continuará en relación las responsabilidades de los actores involucrados.

<http://168.243.233.46/metas/componentes/metas/metas.aspx>

# METAS-SIGOB Organización del trabajo (Red)

## Indicadores de Avance de la Meta

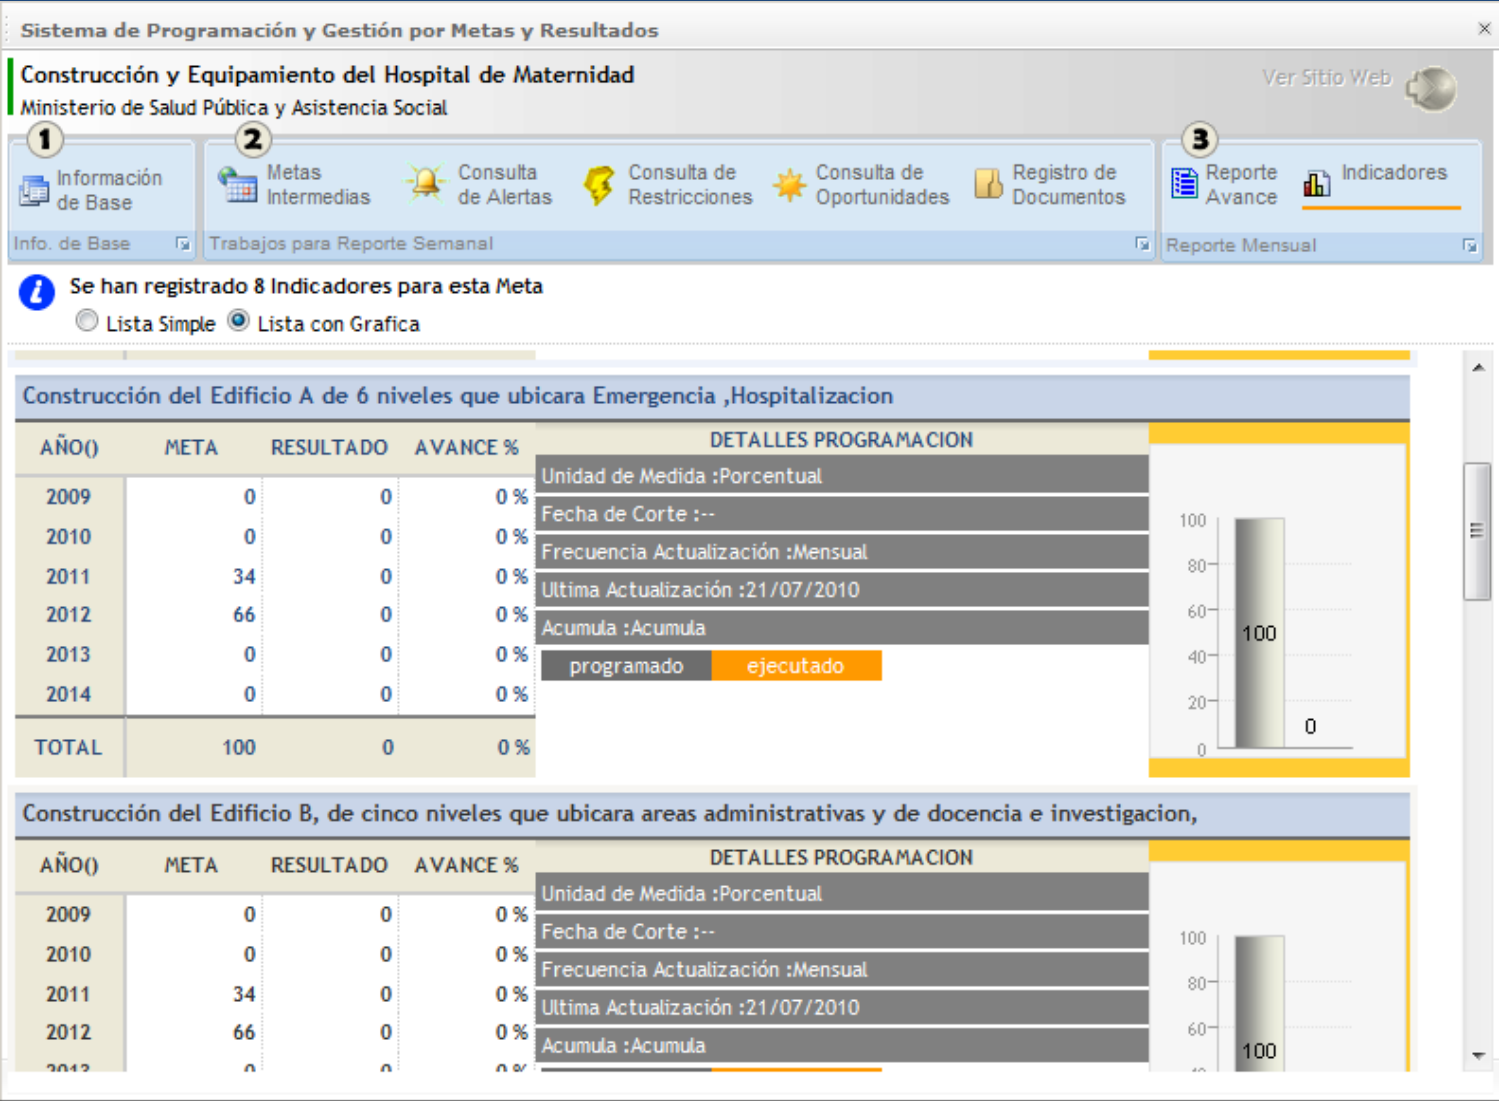

4653 Construcción y equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Naciona	30 abr 2012	Faltan: 381 días.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
--	-------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados

4562 - Obras de Mitigación en Zona de Cárcava Colonia Llano Verde (1 Principal y 3 Secundaria) Ilopa

Ministerio de Obras Públicas

Ver Sitio Web

1 Información de Base

2 Metas Intermedias

3 Reporte Avance

Indicadores Inf. Financiera

Info. de Base

Trabajos para Reporte Semanal

Reporte Mensual

Agregar Meta Intermedia

Calendario Anual

Calendario Mensual

Título	Responsable	Fecha	Estado		
Proceso de Preinversión	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	01 jul 2009	Terminada	0	0
Proceso de UACI	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	14 jul 2010	Terminada	0	0
Orden de Inicio Ejecución	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	14 ago 2010	Terminada	0	0
Finalización del Proyecto	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	01 dic 2011	Normal	0	0
Liquidación del Proyecto	Acosta de Santos, Carolina Guadalupe	01 feb 2012	No Iniciada	0	0

Principal y 3 Secundaria) Ilopa	01 feb 2012	Faltan: 292 días.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
4626 - Construcción de Muro de Retención en Quebrada La Lechuza en	31 ago 2011		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

## Reportes Automáticos

## Reportes Automáticos del Sistema

- Filtro Metas
- Filtro Metas Intermedias
- Filtro Alertas
- Filtro Restricciones

## .: Reportes para la Acción y Gestión

- A 1.1 Reporte de Ficha de Meta
- A 1.2 Meta en Ejecución - Avance por Actor Institucional
- A 1.3 Listado Básico de Metas, Alertas, Restricciones y Oportunidades
- A 2.1 Metas Intermedias - Avance
- A 2.2 Metas Intermedias - Avance Metas Intermedias - Oportunidades
- A 2.3 Metas Intermedias - Avance y Alertas
- A 2.4 Metas Intermedias - Avance y Restricciones
- A 2.5 Reporte de avance, Restricciones y Alertas en Metas prioritarios
- A 3.1 Alertas por Actores Institucionales de Ejecución de Meta
- A 3.2 Alertas por orden de fecha límite de solución
- A 3.3 Alertas por Tipología
- A 3.4 Restricciones por Tipología
- A 3.5 Alertas que Deben ser Atendidas por mis Ámbitos
- A 3.6 Restricciones que deben ser atendidas por mi Ámbito

## .: Reportes para el Análisis y Sinergia

- B 1.1 Metas Intermedias Programados (Próximos 20 Días)
- B 2.2 Oportunidades por Localización Territorial
- B 3.1 Alertas en Metas Intermedias por Actores Individuales
- B 3.2 Alertas en Metas Intermedias por Actores Institucionales

Configurar Reportes Favoritos...

# EVALUACION DE SISTEMAS

<b>17. Con la aplicación del modulo ha ganado tiempo en las siguientes actividades (productividad)? Responda si o no</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Tareas de obtención de información de base	5	
Tareas de programación	4	1
Tareas de seguimiento	5	
Tareas de gestión	4	1
Tareas de elaboración de reportes e informes	4	1
Reuniones de coordinación institucional	5	
Reuniones de coordinación interinstitucional	5	
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>3</b>
<b>18. Cuanto estima usted aumentaron los resultados conseguidos en los programas que gerencia, con la aplicación del Modulo de Metas del SIGOB?</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
No aumento		
Menos del 10%		
Entre el 10 y 30%	2	
Entre 30 y 70%	3	
Más del 70%		
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>19. Como considera su comunicación y retroalimentación actual con el coordinador institucional, la alta dirección, e Inter institucional?</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Coordinador Institucional	5	
Alta dirección directa vinculada al PAG	5	
Inter Institucional	5	
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>20. Cree usted que con la aplicación del Modulo de Metas del SIGOB las autoridades de su institución hoy valoran más su trabajo?</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Muchísimo más valorado	2	
Más valorado		
Valorado	1	
No valorado		
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>21. Cree usted que en su institución se logro programar y gestionar con? (Responda si, no ò parcial)</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
Lógica anticipativa de programación y gestión para resultados	5	
Ruta crítica y responsables-actores definidos por resultado	5	
Trabajo horizontal y simultáneo entre ejecutores y alta dirección (nuevo espacio)	5	
Gestión técnico-político de alertas y restricciones para encontrar solución	5	
Aprovechamiento estratégico de oportunidades	4	1
Conexión directa y estrecha entre demandantes de información y oferentes	4	1
Transparencia permanente de resultados obtenidos (interna y externa)	5	
Rendición de cuentas orientada a ciudadanos	2	3
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>5</b>
	279	148

# Logros

- REUNIONES DEL GRUPO ESTRATEGICO TODAS SEMANA CON LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL :MINISTRO DE HACIENDA,SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA,COORDINADOR ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA Y LOS MINISTROS Y GERENTES DE LOS PROYECTOS
- SE ESTA ESTABLECIENDO UNA CULTURA DE RETROLIMENTACION SEMANAL DONDE INFORMAN DE LOS AVANCES
- SE HAN INCORPORADO LAS ACTIVIDADES MAS RELEVANTES QUE SE LES DA SEGUIMIENTO AQUELLOS PROCESOS QUE PUEDEN SER UN PROBLEMA QUE DETENGA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS.
- INCORPORACION DEL SIIP-SAFI –SIGOB EN UNA INTERFASE QUE CONTEMPLA LOS AVANCES FINANCIEROS DE CADA PROYECTO
- SE HACE PARTICIPE A TODOS LOS ACTORES DESDE EL GERENTE DEL PROYECTO-UNIDADES DE COMPRA – UNIDADES FINANCIERA –UNIDADES LEGALES – DIRECTORES –MINISTROS DENTRO DE LAS INSTITUCIONES
- PARTICIPAN MAS 71 USUARIOS DEL SISTEMA TODAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA ,SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIALES QUE PUEDEN VERIFICAR EL AVANCE DE CADA PROYECTOS (DIRECCIONES DE CREDITO PUBLICO,TESORERIA, PRESUPUESTO)
- DESPUES HABER IDENTIFICADO LOS PROBLEMAS DEL TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA INVERSION SE CONTRATO UNA DE LOS PROCESOS DE LA OBRA PUBLICA .
- CAPACITACION CONSTANTE A LOS GERENTE DE META, COORDINADORES INSTITUCIONALES
- VISIBILIZA EL ESFUERZO DE LAS INSTITUCIONES

	TIEMPO POR PASOS					
ETAPA Y PASOS	MOP	MINED	ANDA	MARN	FISDL	MSPAS
ETAPA I. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO.	8	21	13	22	18	3
ETAPA III. CONTRATACIÓN DEL DISEÑO.	215	298	38	138	65	27
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.	100	298			65	27
ETAPA IV. DISEÑO DEL PROYECTO.	115	0	38		84	0
ETAPA V. CONSULTA CIUDADANA.	5	0	0		0	0
ETAPA VI. CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION.	144	193	48		85	94
A. TRAMITES PARA LA ADQUISICION DE FONDOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO.	28		5		0	0
B. CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.	116	193	43	68	85	94
C. CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.	0		0	73	0	122
TOTALES	380	545	99	233	252	262



# Algunas Consideraciones

- **ATRASO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS (ADECUACIONES EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN DE OFERTAS, PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARPETAS).**
  - **PROCESOS LEGALES (CANCELACIÓN DE CONTRATOS, LAUDOS, INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS CONTRACTUALES)**
  - **FALTA DE PLANIFICACIÓN Y DE ELABORACIÓN CUIDADOSA DE LOS ESTUDIOS.**
  - **PROCESOS INSTITUCIONALES ENGORROSOS**
  - **CAPACIDAD LIMITADA PARA ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA.**
  - **REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y DESFASES EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.**
  - **PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EJECUTORAS FOSEDU.**
  - **DILACIONES EN LOS TRÁMITES INTERINSTITUCIONALES**
  - **OCURRENCIA DE EVENTOS DE RIESGO EN OBRAS PÚBLICAS EN ZONAS VULNERABLES**
  - **FALTA DE AFINACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS FRENTE A LOS CRONOGRAMAS CLIMATOLÓGICOS.**
  - **DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.**
- CONTRATACIÓN LLAVE EN MANO: ARMA DE DOBLE FILO**



# Aspectos que superar

- RESISTENCIA A LA CULTURA DE LA INFORMACION
- AUN SE TIENE PROBLEMAS DE COORDINACION INTERNA ENTRE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIONES
- FALTA DE UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA QUE LES PERMITA OPTIMIZAR Y PROGRAMAR LAS PROYECTOS DE
- INVERSION
- LEY DE INFORMACION, MODULO ESTRATADO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA
- ACTUALIZACION Y MODIFICACION DE NORMATIVAS E INSTRUMENTOS DEL SNIP
