



Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Formato de Seguimiento de Inversiones “Formato N° 12-B”



Capacidad

Identificar el conjunto de actividades relativas al registro sistematizado y análisis de datos sobre el avance de la ejecución física y financiera de las inversiones



Contenidos

1. Registro de la Ejecución Financiera
2. Registro de la sección Información de la Inversión
3. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente
4. Registro de Ejecución física

SECCIONES DEL FORMATO N° 12 -B

Sección ET / DE

- A** Descripción del ET/DE
- Tipo de documento
 - Modalidad
 - Etapas e hitos
- B** Programación de fechas de hitos
- Programación Inicial
 - Programación actualizada
 - Vinculación con el SEACE

- A** Información general del seguimiento
- Etapas e hitos
 - Programación
- B** Cronograma
- Cronograma inicial
 - Cronograma modificado

Sección Ejecución Física

- C** Información del avance físico
- Valorizaciones
 - Riesgos
 - Problemática
 - Acciones a seguir
- D** Información de modificaciones en ejecución física
- Adicional/Reducción
 - Ampliación de Plazo
 - Mayores Gastos Generales
 - Mayores Metrados

Sección Ejecución Financiera

- Programada
- Actualizada

Sección Información de la inversión

- Avance y situación de la inversión
- Estimación de la inversión

Inversión

- Viable
- Aprobado
- Incorporado en el PMI



Inicia el Registro del F12B, con la programación financiera.

Nota: B, C y D de la sección ejecución física no corresponde para bienes y servicios.

1

Registro de la Ejecución Financiera



I. Registro de la Ejecución Financiera

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:58:51

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI Entidad : UEI

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

2438679 - CREACION DEL BIEN PUBLICO DE SOCOS DEL DISTRITO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Información de la inversión Expediente técnico **\$ Ejecución Financiera** BIM Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

IMPORTANTE:

El registro de la ejecución financiera es requisito previo para el ingreso de información del avance físico.

I. Registro de la Ejecución Financiera

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año:

2022

Ejecutora presupuestal:

ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

Programación Financiera (mensual)

Programación Financiera (anual)

Programación Financiera

Periodo

Monto (Soles)

TOTAL:

S/.

Guardar

Programación Financiera Actualizada

Periodo

Monto (Soles)

TOTAL:

S/.

Guardar

Programación financiera (soles):

- Luego de que el usuario haya ingresado al aplicativo, deberá seleccionar el año de ejecución (2022).
- En caso la entidad cuente con mas de una Unidad Ejecutora Presupuestal, deberá seccionar una de ellas para iniciar el registro del avance financiero.

I. Registro de la Ejecución Financiera

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año:

2022

Ejecutora presupuestal:

REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL

PIM: S/14,177,990.00

Programación Financiera (mensual)

Programación Financiera (anual)

Programación Financiera	
Período	Monto (Soles)
2022-01	<input type="text" value="0"/>
2022-02	<input type="text" value="0"/>
2022-03	<input type="text" value="0"/>
2022-04	<input type="text" value="0"/>
2022-05	<input type="text" value="0"/>
2022-06	<input type="text" value="0"/>
2022-07	<input type="text" value="0"/>
2022-08	<input type="text" value="0"/>
2022-09	<input type="text" value="0"/>
2022-10	<input type="text" value="0"/>
2022-11	<input type="text" value="0"/>
2022-12	<input type="text" value="0"/>
TOTAL:	S/0.00

Guardar

Programación Financiera Actualizada	
Período	Monto (Soles)
2022-01	<input type="text"/>
2022-02	<input type="text"/>
2022-03	<input type="text"/>
2022-04	<input type="text"/>
2022-05	<input type="text"/>
2022-06	<input type="text"/>
2022-07	<input type="text"/>
2022-08	<input type="text"/>
2022-09	<input type="text"/>
2022-10	<input type="text"/>
2022-11	<input type="text"/>
2022-12	<input type="text"/>
TOTAL:	

Guardar

a) Programación financiera (soles): Programar PIA/PIM asignado a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.), es decir como se estima gastar el presupuesto asignado en el año. **Se registra por única vez.**

Guarda la información registrada

 Guardar



⚠ Información del sistema
Requisitos mínimos:
El monto total del avance financiero programado no debe superar el PIM.

I. Registro de la Ejecución Financiera

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal:

Año: 2022 PIM: S/14,177,990.00

Ejecutora presupuestal: REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL

Programación Financiera (mensual) Programación Financiera (anual)

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2022-01	0
2022-02	0
2022-03	0
2022-04	0
2022-05	0
2022-06	0
2022-07	0
2022-08	0
2022-09	0
2022-10	0
2022-11	0
2022-12	0
TOTAL:	S/0.00

Guardar

Programación Financiera Actualizada

Periodo	Monto (Soles)
2022-01	0
2022-02	2005890.37
2022-03	1753512.6
2022-04	257417.05
2022-05	49500
2022-06	49500
2022-07	49500
2022-08	10500
2022-09	0
2022-10	0
2022-11	0
2022-12	0
TOTAL:	S/4,175,820.02

Guardar

b) Programación financiera ACTUALIZADA (soles): Se registran las reprogramaciones financieras a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.) cada vez que se requiera.

¿Qué puedo actualizar?

- Reprogramación de saldos por ejecutar.
- La programación de presupuesto incorporado.
- La programación del nuevo PIM, después de efectuado un recorte presupuestal.



IMPORTANTE:
Se puede reprogramar
montos mayores al PIM

Guarda la
información
registrada

Guardar

I. Registro de la Ejecución Financiera

c) Programación financiera anual (soles): Programar el saldo de la inversión a nivel de devengados anuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.), posterior al registro de la programación financiera mensual (soles).

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año:

PIM: 5/8,836,297.00

2022

Ejecutora presupuestal:

REGION HUANUCO-TRANSPORTES

Programación Financiera (mensual)

Programación Financiera (anual)

Costo Actualizado	Devengado acumulado (al año anterior)	PIM	Saldo
79,748,213.12	12,242,207.98	8,836,297.00	58,669,708.14

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2023	19400000
2024	39,669,708.14
TOTAL:	58,669,708.14

Guardar



La visualización de los años de la programación financiera (anual), se encuentra vinculados a los plazos de la programación de ejecución de la inversión registrados en el Formato N° 8 , sección B o C, según corresponda.

Guarda la información registrada

I. Registro de la Ejecución Financiera

Reporte de la sección ejecución financiera

- 1 Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF” y seleccionar la primera opción
- 2 hacer clic en el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
Digitar el Código Único de inversión y hacer clic en “buscar”.
- 3

The image displays three sequential screenshots of a web browser, each with a red circle and a number indicating a step in the process.

Step 1: A Google search for "aplicaciones informaticas mef". The search results show a link to "Aplicaciones Informáticas - Ministerio de Economía y Finanzas" highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.

Step 2: The website "invier.pe" is shown. Under the "Acceso público" section, the "SSI" (Sistema de Seguimiento de Inversiones) button is highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.

Step 3: The SSI system's search interface is shown. The search bar contains the number "2988111", and a hand cursor is pointing to the search button (magnifying glass icon).

Reporte de la sección ejecución financiera

- 

5

INVERSIÓN

Fecha Últ. Modificación: 20/04/2021



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO **Nº 12-B**

SECCIONES DEL FORMATO Nº 12-B:



**FORMATO
Nº 12-B**







1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2310861	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PIURA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
		REGISTRO DE CIERRE:	NO
		PMI AÑO 1 <2022>	0



Reporte de la sección ejecución financiera

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

PIM 2022 (a):	S/ 12,432,275
DEVENGADO 2022 :	S/ 2,750,508
PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA (b):	S/ 12,747,050
DEFICIT O SALDO (a-b):	S/ -314,775

22.1%

Mês	PIM	Program.	Atualiz.	Devengado
Ene	12	0	0	0
Feb	12	0.86	0.86	0.86
Mar	12	1.9	1.9	1.9
Abr	12	2.75	3.8	2.75
May		6.12	6.12	0
Jun		6.93	6.93	0
Jul		7.51	7.51	0
Ago		7.83	7.83	0
Set		7.85	7.85	0
Oct		10.71	10.71	0
Nov		10.73	10.73	0
Dic		12.75	12.75	0

[illegible]


2


Registro de la sección Información de la Inversión




II. Registro de la sección Información de la Inversión

ACCESO

- 1 Ingresar al Banco de Inversiones
- 2 Buscar el código único de la inversión y hacer clic en el icono 

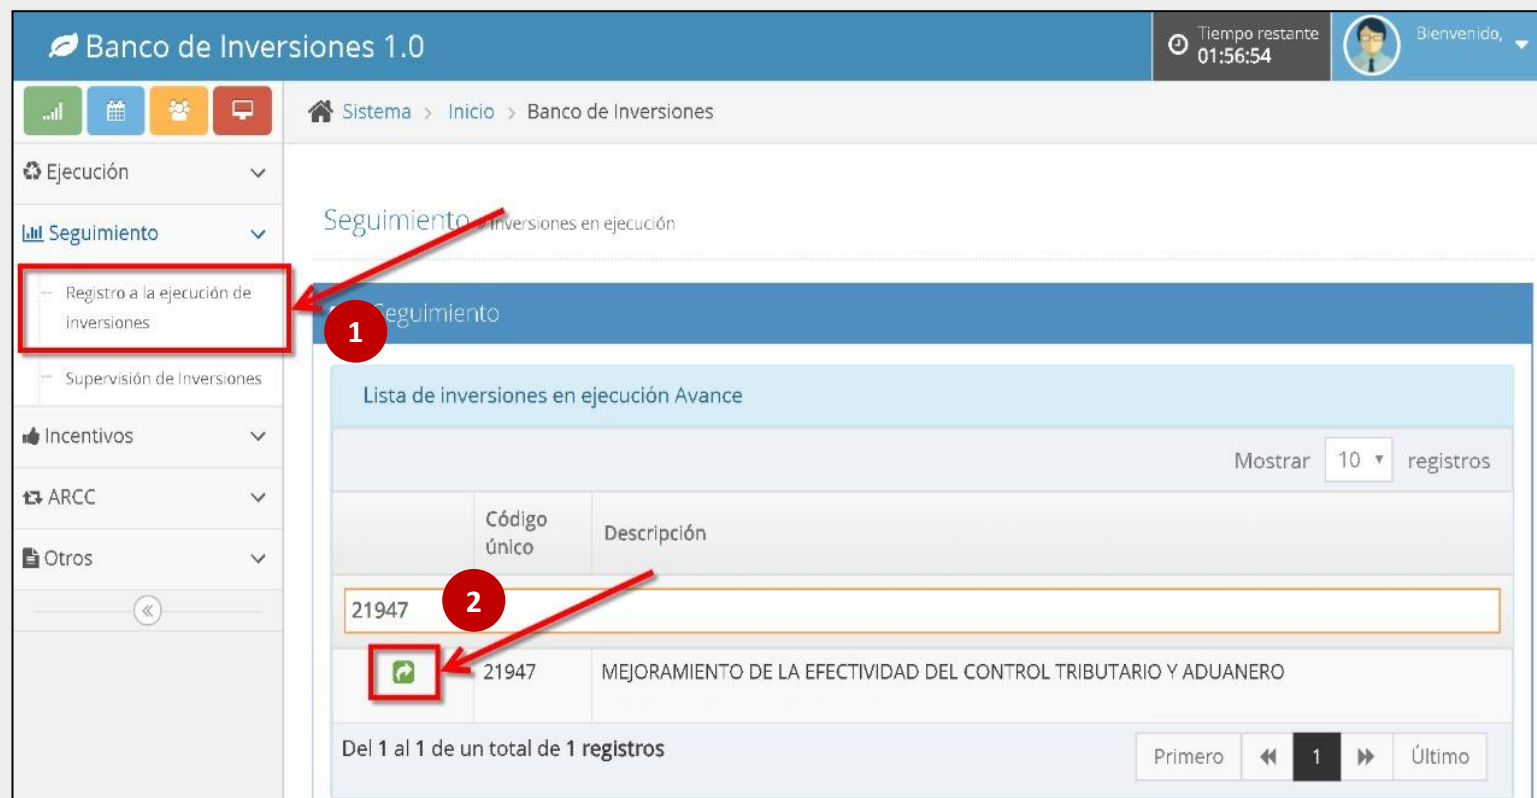

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:56:54 Bienvenido, 

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Seguimiento

Lista de inversiones en ejecución Avance

Mostrar 10 registros

Código único	Descripción
21947	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

Primero 1 Último

II. Registro de la sección Información de la Inversión

ACCESO

3 Seleccionar “Información de la inversión”

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:58:51

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI

Entidad : UEI

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

2438679 - CREACION DEL BIEN PUBLICO DE SOCOS DEL DISTRITO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

3

Información de la inversión

Expediente técnico

Ejecución Financiera

BIM


Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

II. Registro de la sección Información de la Inversión

4 En la pestaña “Avance y situación” se muestra:

- A El avance de la ejecución de la inversión que se calcula automáticamente con la información registrada en la pestaña “Estimación”.
- B En situación se registra la información actualizada de la inversión.

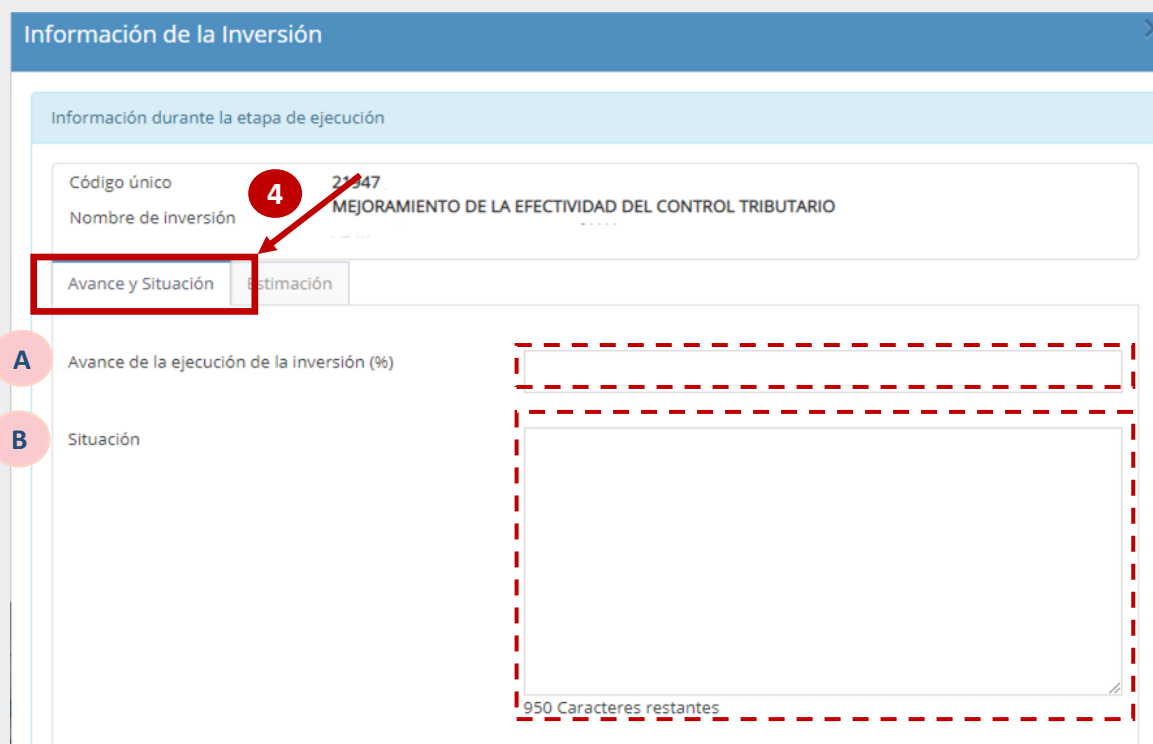

The screenshot shows a web form titled "Información de la Inversión". Under the heading "Información durante la etapa de ejecución", there are two input fields: "Código único" with the value "21347" and "Nombre de inversión" with the value "MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO". Below these are two tabs: "Avance y Situación" (highlighted with a red box and a red circle with the number 4) and "Estimación". Under the "Avance y Situación" tab, there are two sections: "A Avance de la ejecución de la inversión (%)" and "B Situación". The "Situación" section is a large text area with a red dashed border and a "950 Caracteres restantes" indicator at the bottom.



Si la inversión no registra Formato N° 08, la UEI en el campo B -“Situación” deberá describir las acciones realizadas e indicar el avance alcanzado de la elaboración del Expediente Técnico y/o Documentos Equivalentes.

II. Registro de la sección Información de la Inversión

5 Seleccionar la pestaña “Estimación”

6 hacer clic en “Iniciar el cálculo”

Información de la Inversión

Información durante la etapa de ejecución

Código único2194716

Nombre de inversiónMEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL

Avance y Situación

Estimación

Actualizado al:

Avance

Avance de la ejecución de la inversión:

Avance de la ejecución física (*):

(*)El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.

6

Iniciar

Nueva declaración

II. Registro de la sección Información de la Inversión

7 El Formato N° 12-B considera la información registrada del Formato N° 08, en ese sentido, la estimación del avance de la inversión se realiza por componentes (A + B) y otros costos de inversión C .

ESTIMACIÓN EN EL FORMATO N° 12 - B

Componentes/otros costos de inversión	Costo	Avance		Comentarios
		%	Costo	
A MEJORAMIENTO DEL CONTROL TRIBUTARIO	449,056.13	%	0.00	150 Caracteres
B MEJORAMIENTO DE LA ARQUITECTURA INFORMÁTICA	1,274,404.75	%	0.00	150 Caracteres
GESTION DEL PROYECTO	41,362.12	%	0.00	150 Caracteres
SUPERVISIÓN	0.00	%	0.00	150 Caracteres
EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	%	0.00	150 Caracteres
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/		1,764,823.00	0.00	

FORMATO N° 08

Descripción de productos /acciones	Tipo de factor productivo	Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)
A Mejoramiento del control tributario				
1.1.1 Cuenta Única: Contratación consultor	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		45,000.00
1.1.2 Cuenta Única: Arquitectura	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		404,056.13
B Mejoramiento de la arquitectura informática				
2.1.1 Fortalecimiento de la Plataforma de Base de Datos: Hardware (Servidores RISC, Switch SAN, servicios)	EQUIPAMIENTO	2 NÚMERO DE EQUIPOS		358,673.61
2.1.2 Fortalecimiento de la Plataforma de Base de Datos: Software (Licencias del sistema operativo)	INTANGIBLES	1 N° DE DOCUMENTOS		915,731.14
C				
GESTION DEL PROYECTO: S/				41,362.12
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00
SUPERVISIÓN: S/				0.00
MONTO ACTUALIZADO: S/				1,764,823

II. Registro de la sección Información de la Inversión

- 8 Se registra el porcentaje de avance de cada componente y otros costos de la inversión.
- 9 La UEI puede describir comentarios de cada componente y otros costos de la inversión.

Componentes/otros costos de inversión	Costo	Avance		Comentarios
		%	Costo	
MEJORAMIENTO DEL CONTROL TRIBUTARIO	449,056.13	<div>8</div> <div>%</div>	0.00	<div>9</div> <div>150 Caracteres</div>
MEJORAMIENTO DE LA ARQUITECTURA INFORMÁTICA	1,274,404.75	%	0.00	150 Caracteres
GESTION DEL PROYECTO	41,362.12	%	0.00	150 Caracteres
SUPERVISIÓN	0.00	%	0.00	150 Caracteres
EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	%	0.00	150 Caracteres
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/		1,764,823.00	0.00	

10

Declarar

Completado la información del avance por componente y otros costos de la inversión, hacer clic en “Declarar”.

II. Registro de la sección Información de la Inversión

Luego de hacer clic en “Declarar”:

Avance y Situación

Estimación

Actualizado al: 23/05/2020

Avance

Avance de la ejecución de la inversión: 40.31 %

Avance de la ejecución física (*): 39.86 %

(*)El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.

Nueva declaración

Componentes/otros costos de inversión	Costo	Avance		Comentarios
		%	Costo	
MEJORAMIENTO DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO	222,708,580.08	55	122489719.04	150 Caracteres
MEJORAMIENTO DE LA ARQUITECTURA INFORMÁTICA DE LA SUNAT	112,954,218.82	10	11295421.88	150 Caracteres
GESTION DEL PROYECTO	6,941,362.12	62	4303644.51	150 Caracteres
SUPERVISIÓN	0.00	0	0.00	150 Caracteres
EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	0	0.00	150 Caracteres
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/			138,088,785.43	

11

Se muestra una ventana de confirmación, hacer clic en “Aceptar”

Confirmación

Ult. declaración: 23/05/2020

¿Está seguro(a) de realizar esta operación?

Fecha / Avance

Inversión: Aceptar

Cancelar

12

Con los datos de la pestaña “Estimación”, se calcula automáticamente el avance de la ejecución de la Inversión

Avance y Situación

Estimación

Actualizado al: 23/05/2020

Avance

Avance de la ejecución de la inversión: 40.31 %

Avance de la ejecución física (*): 39.86 %

(*)El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.

Nueva declaración

Para reiniciar una nueva estimación deberá seleccionar “Nueva declaración”



II. Registro de la sección Información de la Inversión

- 13 El cálculo del avance de la ejecución física, considera los datos registrados de cada componente.

Avance y Situación

Estimación

Actualizado al: 23/05/2020

Avance

Avance de la ejecución de la inversión: 40.31 %

Avance de la ejecución física (*): 39.86 %

(*)El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.

Nueva declaración

Componentes/otros costos de inversión	Costo	Avance		Comentarios
		%	Costo	
MEJORAMIENTO DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO	222,708,580.08	55	122489719.04	150 Caracteres
MEJORAMIENTO DE LA ARQUITECTURA INFORMÁTICA DE LA SUNAT	112,954,218.82	10	11295421.88	150 Caracteres

II. Registro de la sección Información de la Inversión

Reporte de la sección información de la inversión

- 1 Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF” y seleccionar la primera opción
- 2 hacer clic en el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
Digitar el Código Único de inversión y hacer clic en “buscar”.

The image displays three sequential screenshots of a web browser, each with a red circle and number indicating a step in the process.



Step 1: A Google search for "aplicaciones informaticas mef". The search results show a link to "Aplicaciones Informáticas - Ministerio de Economía y Finanzas" highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.

Step 2: The website "invierte.pe" is shown. Under the "Acceso público" section, the "SSI" (Sistema de Seguimiento de Inversiones) button is highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.

Step 3: The SSI website's search interface is shown. The search bar contains the number "2988111", and a hand cursor is pointing to the search button (magnifying glass icon).

II. Registro de la sección Información de la Inversión

Reporte de la Sección Información de la Inversión

- 4 En la sección “Datos de la fase de ejecución” hacer clic en el icono .
- 5 En el Reporte de seguimiento ir a la sección ejecución de la inversión, donde visualizara el avance de la ejecución de la inversión, avance de la ejecución física y situación de la inversión.
- 6 Para ver el detalle del avance de la ejecución de la inversión, avance de la ejecución física, deberá hacer clic en el icono .

4

CON DECRETO DE EMERGENCIA

CADENA FUNCIONAL

TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS NACIONALES

APROBADO (S/)

BENEFICIARIOS (HABITANTES)

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?

SI

NO

¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?

SI

NO

REGISTRO DE CIERRE

NO

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN

10/09/2018

FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN

25/12/2020

COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)

(a)

SOLUCIÓN DE CONTROL (S/)

(b)

MONTO DE CARTA FIANZA (S/)

(c)

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/)

(a+b+c)

Consideraciones:

5

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

21/11/2019

CULMINACIÓN:

08/02/2022

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (I)

80.2%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (II)

81.3%

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (S/ MM)

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

10 MM

NOV-2014

APROBACIÓN DEL 3º ET/05

73 MM

NOV-2014

ÚLTIMA MODIFICACIÓN

79.8 MM

ENE-2022

Variación

Porcentaje (%)

Respecto a la viabilidad

702% (S/ 69.8 MM)

SITUACIÓN

Fecha de declaración: 18/03/2022

VER DETALLE DEL AVANCE: 25

[13/04/2022] El avance de la ejecución física de la inversión es de 81.3% que corresponde a lo ejecutado en obra (etapa I y II), expediente técnico, supervisión y gestión de proyecto. II ETAPA: Se repite la valorización del mes de febrero, debido a que el mes de marzo está pendiente a su aprobación. I Etapa: el 04-12-2021 SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, ASIMISMO SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE ENTREGA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA PARA EL INICIO DE LA FASE II OPERACIÓN ASISTIDA (180 DÍAS).

6

INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN

% Avance de la Ejecución de la Inversión

80.23 %

% Avance Físico de la Inversión

81.27 %

Fecha de Declaración

18/03/2022

Nº	Componentes/otros costos de inversión	Costo total actualizado	Avance		
			%	Costo	Comentarios
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE etapa 1	14,454,508	89.82%	12,863,497	
2	SISTEMA DE ALCANTARILLADO etapa 1	9,401,757	89.82%	8,444,957	
3	PLANTA DE TRATAMIENTO ETAPA 1	8,154,210	89.82%	7,324,370	
4	UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) ETAPA 1 EN EL C.P. SUACASO	10,178,349	89.82%	9,142,516	
5	SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 2	8,482,077	68.72%	5,828,573	
6	SISTEMA DE ALCANTARILLADO ETAPA 2	6,843,517	68.72%	4,702,614	
7	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA 2	9,449,823	68.72%	6,493,572	
8	UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) ETAPA 2	3,995,604	68.72%	2,745,633	
9	GESTIÓN DEL PROYECTO	934,017	70.04%	654,229	
10	EXPEDIENTE TÉCNICO	868,583	100%	868,583	
11	EXPEDIENTE TÉCNICO COVID	0	0%	0	
12	SUPERVISIÓN	6,553,247	71.96%	4,715,749	
13	SUPERVISIÓN COVID	335,977	0%	0	
14	LIQUIDACIÓN	0	0%	0	
Total		75,651,969		62,904,593	

II. Registro de la sección Información de la Inversión

Reporte de la Sección Información de la Inversión

6

ESTIMACIÓN DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN



% Avance de la Ejecución de la Inversión	32.07 %	% Avance Físico de la Inversión	29.93 %	Fecha de Declaración	20/11/2020
--	---------	---------------------------------	---------	----------------------	------------


Nº	Componentes/otros costos de inversión	Costo total actualizado	Avance		
			%	Costo	Comentario
1	CALZADA TRAMO I: AV. LA MARINA - SAN PEDRO - SANTO TOMÁS	610,393,075	68.02%	415,189,370	
2	ALZADA TRAMO II: SANTO TOMÁS- MAZÁN	198,581,684	0%	0	
3	CALZADA TRAMO III: MAZAN- SALVADOR	22,322,282	0%	0	
4	CALZADA TRAMO IV: SALVADOR - SAN PABLO	555,849,345	0%	0	
5	GESTION DEL PROYECTO	21,770,493	94%	20,464,264	SEGÚN REPORTE SGP AGOSTO 2020
6	EXPEDIENTE TÉCNICO	25,139,728	100%	25,139,728	SEGÚN REPORTE SGP AGOSTO 2020
7	SUPERVISIÓN	56,797,202	30.46%	17,300,428	
8	LIQUIDACIÓN	0	0%	0	
Total		1,490,853,809		478,093,790	


3 Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente



III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la programación de los ET/DE en el F12B

- 1 Ingresar al módulo de “Seguimiento” del Banco de Inversiones.
- 2 Buscar el código único de la inversión que se quiere registrar ET/DE y hacer clic en 

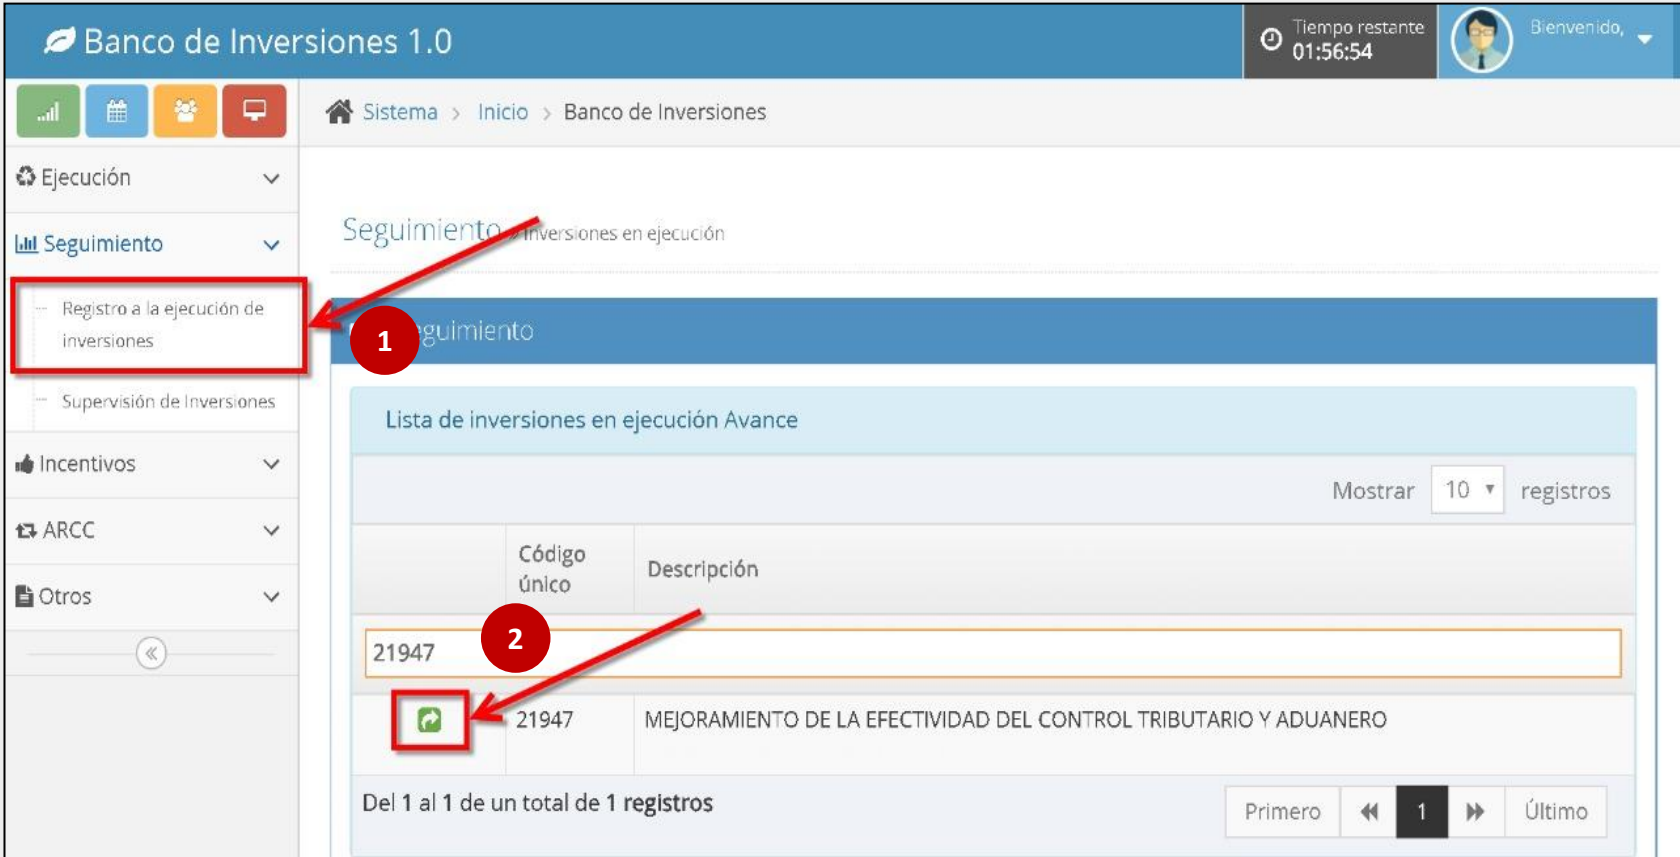

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:56:54 Bienvenido, ▼

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Seguimiento

Lista de inversiones en ejecución Avance

Mostrar 10 registros

Código único	Descripción
21947	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

Primero 1 Último

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la programación de los ET/DE en el F12B

- 3 Seleccionar “Expediente Técnico”.
- 4 hacer clic en **Agregar** para generar ET/DE.

Banco de Inversiones 1.0

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI Entidad : UEI

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

2438679 - CREACION DEL BIEN PUBLICO DE SOCOS DISTRICTO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

3

Información de la inversión Expediente técnico Ejecución Financiera BIM Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

Formato 12B » Registros

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

4


Nº de ET/DE 0 Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Documento	Modalidad de ejecución	Ver detalle
--	-------------	-------------------	-----------	------------------------	-------------

Salir

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la programación de los ET/DE en el F12B

- 5 Completar la información en cada sección (Tipo de documento, descripción, modalidad de ejecución y etapa)
- 6 Finalmente seleccionar  para visualizar los hitos correspondientes a la “etapa seleccionada”.

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

5

Tipo de documento

5

Modalidad de ejecución


5

Etapas

5

Descripción

6



Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
------	------------------	-------------------	--------	------------

Problemática

350 Caracteres

Cancelar

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la programación de los ET/DE en el F12B

- A** Se visualiza los hitos correspondientes a la etapa seleccionada (el siguiente ejemplo corresponde a un ET que se elaborará bajo la modalidad Administración Indirecta-Por contrata):
- Etapas: Actuaciones Preparatorias**

ET/DE

A

Tipo de documento

EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Etapas

ACTUACIONES PREPARATORIAS

Descripción

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N°12 "EL BUEN SABER" DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO

Mostrar

Atención:

{1} Elimine los hitos con los que no trabajará.

{2} Ingrese la fecha programada por cada hito.

{3} Finalice haciendo clic en el botón "Definir hitos".

Definir hitos

Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
<div><div>A</div>INICIO DE ACTUACIONES PREPARATORIAS</div>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<div>150 Caracteres</div>

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la programación de los ET/DE en el F12B

- B** Se visualiza los hitos correspondientes a la etapa seleccionada:
Etapa: Procedimiento de Selección

ET/DE

Tipo de documento

EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Etapa

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Descripción

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N°12 "EL BUEN SABER" DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO

Mostrar

Atención:

- (1) Elimine los hitos con los que no trabajará.
- (2) Ingrese la fecha programada por cada hito.
- (3) Finalice haciendo clic en el botón Definir hitos.

Definir hitos

Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
<div>PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>		<div></div> <div>150 Caracteres</div>
<div>INTEGRACIÓN DE BASES</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>		<div></div> <div>150 Caracteres</div>
<div>OTORGAMIENTO DE BUENA PRO</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>	<div>dd/mm/aaaa</div>		<div></div> <div>150 Caracteres</div>

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la programación de los ET/DE en el F12B

- 7 Se visualiza los hitos correspondientes a la etapa seleccionada.
 - 8 Definir los hitos ha registrar y completar las fechas programadas de cada hito.
- Etapas: Elaboración del ET

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

Tipo de documento

EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Etapas

ELABORACIÓN DEL ET

Descripción

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N°12 "EL BUEN SABER" DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO

Mostrar

Atención:

(1) Elimine los hitos con los que no trabajará.

(2) Ingrese la fecha programada por cada hito.


(3) Finalice haciendo clic en el botón "Definir hitos".

Definir hitos

	Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
	FIRMA DE CONTRATO	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
	INICIO DE PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
	ENTREGABLE 1	Fecha de entrega	Fecha de entrega	<div></div>	
	ENTREGABLE 2	Fecha de entrega	Fecha de entrega	<div></div>	
	ENTREGABLE 3	Fecha de entrega	Fecha de entrega	<div></div>	
	ENTREGABLE 4	Fecha de entrega	Fecha de entrega	<div></div>	
	ENTREGABLE 5	Fecha de entrega	Fecha de entrega	<div></div>	
	APROBACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<div>150 Caracteres</div>

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS ET/DE EN EL F12B

- 9 Luego de evaluar los hitos que corresponde a la etapa seleccionada, deberá completar la fecha programada y seleccionar 

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

Tipo de documento

EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Etapas

ELABORACIÓN DEL ET

Descripción

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N°12 "EL BUEN SABER" DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO

Mostrar















Atención:

• (1) Elimine los hitos con los que no trabajará.

• (2) Ingrese la fecha programada por cada hito.

• (3) Finalice haciendo clic en el botón "Definir hitos"

Definir hitos

Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
 FIRMA DE CONTRATO	01/07/2020 	dd/mm/aaaa 		
INICIO DE PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ET	02/07/2020 	dd/mm/aaaa 		
 ENTREGABLE 1	04/07/2020 	Fecha de entrega 	<div></div>	
 ENTREGABLE 2	22/07/2020 	Fecha de entrega 	<div></div>	
 APROBACIÓN DEL ET	01/08/2020 	dd/mm/aaaa 		<div>150 Caracteres</div>



No se podrá “Definir hitos”, si no registra la fecha programada de dichos hitos.

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la programación de los ET/DE en el F12B

- 10 Aparecerá una ventana de confirmación, hacer clic en **Aceptar**.
- 11 Se mostrará un mensaje indicando “Operación Exitosa”.
- 12 Finalmente, se visualiza el ET/DE registrado correctamente.

Confirmación

¿Está seguro(a) que desea guardar estos 5 hitos?

10

Aceptar

Cancelar

11

Operación Exitosa

Operación exitosa.

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

Nº de ET/DE

1




Agregar

	Descripción	Fecha de egistro	Documento	Modalidad de ejecución	Ver detalle
	ET DE SALDO DE OBRA	01/07/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	

Salir

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente









Actualización del registro de ET/DE en el F12B

- 1 Para realizar la actualización de las fechas, comentarios y estado de los hitos , hacer clic en  .
- 2 Para visualizar los hitos, seleccionar la etapa haciendo clic en 
- 3 Registrar las fechas actualizadas de cada hito.
- 4 Hacer clic en 

ET/DE

Nº de ET/DE
4

Agregar


	Descripción	Fecha de registro	Documento	Modalidad de ejecución	Ver detalle
1	EJEMPLO AD	10/06/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	 
	DOC CONTRATAC DIRECT	09/06/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATACION DIRECTA	 
	ET SALDO 2	09/06/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	 
	EXPEDIENTE TECNICO DE SAL	09/06/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	 

Salir

Etapa

Ver

ELABORACIÓN DEL ET



Hito

Fecha Programada

Fecha Actualizada

Estado

Comentario

1	FIRMA DE CONTRATO	01/07/2020	02/07/2020		
2	INICIO DE PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ET	02/07/2020	09/07/2020		
3	ENTREGABLE 1	04/07/2020	14/07/2020		
4	ENTREGABLE 2	22/07/2020	22/07/2020		
5	APROBACIÓN DEL ET	01/08/2020	27/08/2020		


150 Caracteres

Guardar cambios

4

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Vinculación con el SEACE

- 1 La vinculación de las fechas actualizadas de los hitos de procedimientos de selección y firma de contrato, deberá seleccionar 

ET/DE

Tipo de documento

EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de ejecución


ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA


Descripción

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N°12 "EL BUEN SABER" DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO

Número de Convocatoria

100064



	Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
1	FIRMA DE CONTRATO	01/07/2020	02/07/2020 		
2	INICIO DE PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ET	02/07/2020	08/07/2020		
3	ENTREGABLE 1	04/07/2020	23/07/2020		
4	ENTREGABLE 2	22/07/2020	25/07/2020		
5	ENTREGABLE 3	22/07/2020	23/07/2020		

150 Caracteres

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Vinculación con el SEACE

- 2 Seleccionar el procedimiento de selección o contrato, haciendo clic en .

Vincular

Información de SEACE

Objeto de contratación

Consultoría de Obra

	Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción del proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)
2	 Adjudicación Simplificada	2021-GRL/CS-1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE	1	20/10/2021	 Contratado	190,000.00

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

Primero<<1>>Último

Se visualizará la información de los procedimientos de selección o contratos que extrae del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente


Registro de estados en la etapa de elaboración ET
















- 1 El usuario registra el “Estado” de los entregables correspondientes a la etapa de Elaboración de ET/DE.
- 2 Hacer clic en 

Etapa

Ver

ELABORACIÓN DEL ET



	Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
1	FIRMA DE CONTRATO	01/07/2020 	02/07/2020  		<div>150 Caracteres</div>
2	INICIO DE PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ET	02/07/2020 	08/07/2020 		<div>150 Caracteres</div>
3	ENTREGABLE 1	04/07/2020 	23/07/2020 	APROBADO	<div>150 Caracteres</div>
4	ENTREGABLE 2	22/07/2020 	25/07/2020 	DESARROLLO	<div>150 Caracteres</div>
5	ENTREGABLE 3	22/07/2020 	23/07/2020 	OBSERVADO	<div>150 Caracteres</div>
6	ENTREGABLE 4	30/07/2020 	23/07/2020 	<div>DESARROLLO OBSERVADO APROBADO</div>	<div>150 Caracteres</div>
7	APROBACIÓN DEL ET	01/08/2020 	12/08/2020 		

Guardar cambios

Cancelar

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la problemática

- 1 En la parte inferior seleccionar el tipo de problemática: Saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales, incidencias en procedimientos de selección, incumplimiento contractual por parte del contratista, permisos, licencias y/o autorizaciones, deficiente supervisión de elaboración de ET, resolución del contrato, ampliaciones de plazo, arbitraje y otros.
- 2 Registrar comentarios respecto a la problemática.

ET/DE

Tipo de documento

EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Descripción

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N°12 "EL BUEN SABER" DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO

Número de Convocatoria

100064

Vincular con SEACE

Etap	Ver
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ELABORACIÓN DEL ET	

Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
Problemática				
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y/O ARREGLOS INSTITUCIONALES				
COORDINACIONES CON LAS INSTITUCIONES				

314 Caracteres

Guardar cambios Cancelar

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de antecedentes

- 1 En caso la inversión cuente con ET/DE históricos, registrar información en antecedentes.
- 2 Adjuntar documento referente a los antecedentes registrados.

ET/DE

Tipo de documento

EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Descripción

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE N°12 "EL BUEN SABER" DE LA CIUDAD DE AZÁNGARO

Número de Convocatoria

100064

Vincular con SEACE

Etapas	Ver
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ELABORACIÓN DEL ET	

Antecedente: (Ingrese información de los ET/DE históricos, no considerados en el presente registro)

1

LA INVERSIÓN CUENTA CON 3 EXPEDIENTES TÉCNICOS, EL REGISTRO DEL PRESENTE CORRESPONDE AL SEGUNDO ET

252 Caracteres

2

Adjunte un archivo referente a los antecedentes descritos (Opcional)

314 Caracteres

Guardar cambios

Cancelar

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Reporte del Expediente Técnico/Documento Equivalente

- 1 Buscar en el navegador “Aplicaciones Informáticas MEF” y seleccionar la primera opción
- 2 hacer clic en el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
- 3 Digitar el Código Único de inversión y hacer clic en “buscar”.

The image displays three sequential screenshots of a web browser, each with a red circle and a number indicating a step in the process.


Step 1: A Google search for "aplicaciones informaticas mef". The search results show a link to "Aplicaciones Informáticas - Ministerio de Economía y Finanzas" which is highlighted with a red box and a hand cursor.

Step 2: The website "invier.te.pe" is shown. Under the "Acceso público" section, the "SSI" (Sistema de Seguimiento de Inversiones) button is highlighted with a red box and a hand cursor.

Step 3: The SSI system interface is shown. The search bar contains the number "2988111" and is highlighted with a red box. A hand cursor is shown clicking the search button.

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Reporte del Expediente Técnico/Documento Equivalente

- 4
- En la sección “Datos de la fase de ejecución” hacer clic en el icono .
- 5
- En el Reporte de seguimiento hacer clic en la pestaña de Expediente Técnico.
- 6
- Se redireccionará al modulo de Expediente Técnico/Documento Equivalente.

4

CON DECRETO DE EMERGENCIA		APROBADO (S/)	
CADENA FUNCIONAL	TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS NACIONALES	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)		
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	SOLUCIÓN DE CONTROL (S/) (b)		
REGISTRO DE CIERRE	NO	MONTO DE CARTA FIANZA (c)		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	10/09/2018	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	25/12/2020	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)

Consideraciones:

5

Ministerio de Economía y Finanzas

Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones del Formato N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2310861	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
		REGISTRO DE CIERRE:	NO
		PMI AÑO 1 <2022>	0

6

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE


Código Único:	2310861	Tipo de Inversión:	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

EXPEDIENTE TÉCNICO : 6

Descripción	Fecha de Registro	Modalidad de Ejecución	Ver Detalle
PROCESO MENOR A 8 UIT CON EL CONTRATISTA	25/07/2020	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - IGUAL O MENOR A 8 UIT	
OBRAS CON LA EMPRESA Y LA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO III	25/07/2020	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS	
EXPEDIENTE TÉCNICO ENDEUDAMIENTO	24/07/2020	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ENDEUDAMIENTO	
EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA TRAMO I	24/07/2020	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATACIÓN	

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Reporte del Expediente Técnico/Documento Equivalente

- 6 Se visualiza el reporte de los múltiples ET/DE.
- 7 Seleccionar  para ver el detalle del registro de ET/DE.

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código Único:

2452536

Nombre de la Inversión:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES (I.E. Nº 38443 MX-U, I.E. Nº38394 MX-U, I.E. Nº38451 MX-U, I.E. Nº 38636 MX-U, I.E. Nº 38994-6 MX-U) , DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Tipo de Inversión:

PROYECTO DE INVERSION

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

EXPEDIENTE TÉCNICO : 2


Descripción	Fecha de Registro	Modalidad de Ejecución	Etapas - Hitos	Ver Detalle
EXPEDIENTE TECNICO Nº01-INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº38443 MX-P CCAHUASANA	28/04/2022	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	ELABORACIÓN DEL ET - APROBACIÓN DEL ET	<div> <div></div> <div>7</div> </div>
EXPEDIENTE TECNICO Nº02-INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº38394 MX-U CHONTACCOCHA	22/01/2021	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	ELABORACIÓN DEL ET - APROBACIÓN DEL ET	<div> <div></div> <div></div> </div>

DOCUMENTO EQUIVALENTE : 2

Tipo de Documento	Descripción	Fecha de Registro	Modalidad de Ejecución	Etapas - Hitos	Ver Detalle
Estudios Definitivos de Ingeniería	EDI MR VERSION FINAL EDI DEL MATERIAL RODANTE	19/04/2021	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (APP)	ELABORACIÓN DEL DOC. EQUIVALENTE - APROBACIÓN	<div> <div></div> <div>7</div> </div>
Estudios Definitivos de Ingeniería	EDI 2L4-16 PROYECTO INTEGRADO ETAPA 2 LÍNEA 4	19/04/2021	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (APP)	ELABORACIÓN DEL DOC. EQUIVALENTE - APROBACIÓN	<div> <div></div> <div></div> </div>

III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Reporte del Expediente Técnico/Documento Equivalente

8 Se visualiza el estado situacional del ET/DE registrado, hacer clic en el ícono  para descargar la información detallada.

EXPEDIENTE TECNICO

Código Único:

2331661

Nombre de la Inversión:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO

Descripción:

ETAPA I: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PI CON CUI 2331661

8

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

ETAPA	HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA ACTUALIZADA	ESTADO	COMENTARIO
ELABORACIÓN DEL ET	ENTREGABLE 2	21/03/2019	22/04/2019	APROBADO	14/03/2019 al 10/04/2019 (Suspensión del plazo contractual N° 01, 28 dc)
ELABORACIÓN DEL ET	ENTREGABLE 3	20/05/2019	30/07/2019	APROBADO	14/06/2019 al 23/07/2019 (Suspensión del plazo contractual N°02, 40 dc)
ELABORACIÓN DEL ET	ENTREGABLE 4	19/07/2019	06/11/2019	APROBADO	01/08/2019 al 12/09/2019 Ampliación de Plazo N° 01 (RA. N°184-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3), 42 dc
ELABORACIÓN DEL ET	APROBACIÓN DEL ET	17/09/2019	12/04/2022		12.04.2022: MEDIANTE R.D.N° 065-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 SE APRUEBA ADMINISTR. LA ETAPA I, CON UN PRESUPUESTO DE OBRA DE S/. 1'281,581,751.67

PROBLEMÁTICA

FECHA	TIPO DE PROBLEMA	COMENTARIO
05/07/2022	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y/O ARREGLOS INSTITUCIONALES	A. La Municipalidad de San Román a emitido las constancias de disponibilidad de los terrenos requeridos para la ETAPA I y II del proyecto, y para la seguridad jurídica vienen complementando la inscripción definitiva en registros públicos.

ANTECEDENTES


COMENTARIO	DESCARGA SUSTENTO
El 15.6.2021 la MPSR presentó la doc. del saneamiento físico legal de los terrenos de la Etapa 1. El PNSU luego de compatibilizar los datos técnicos de las estructuras saneadas por la MPSR y los datos técnicos del ET, solicitó aclaración y/o subsanación de 20 componentes. El 01.07.2021, se llevó a cabo la reunión sobre los avance de las aclaracio	

4 Registro de Ejecución física



IV. Registro de Ejecución física

Estructura de registro para obras

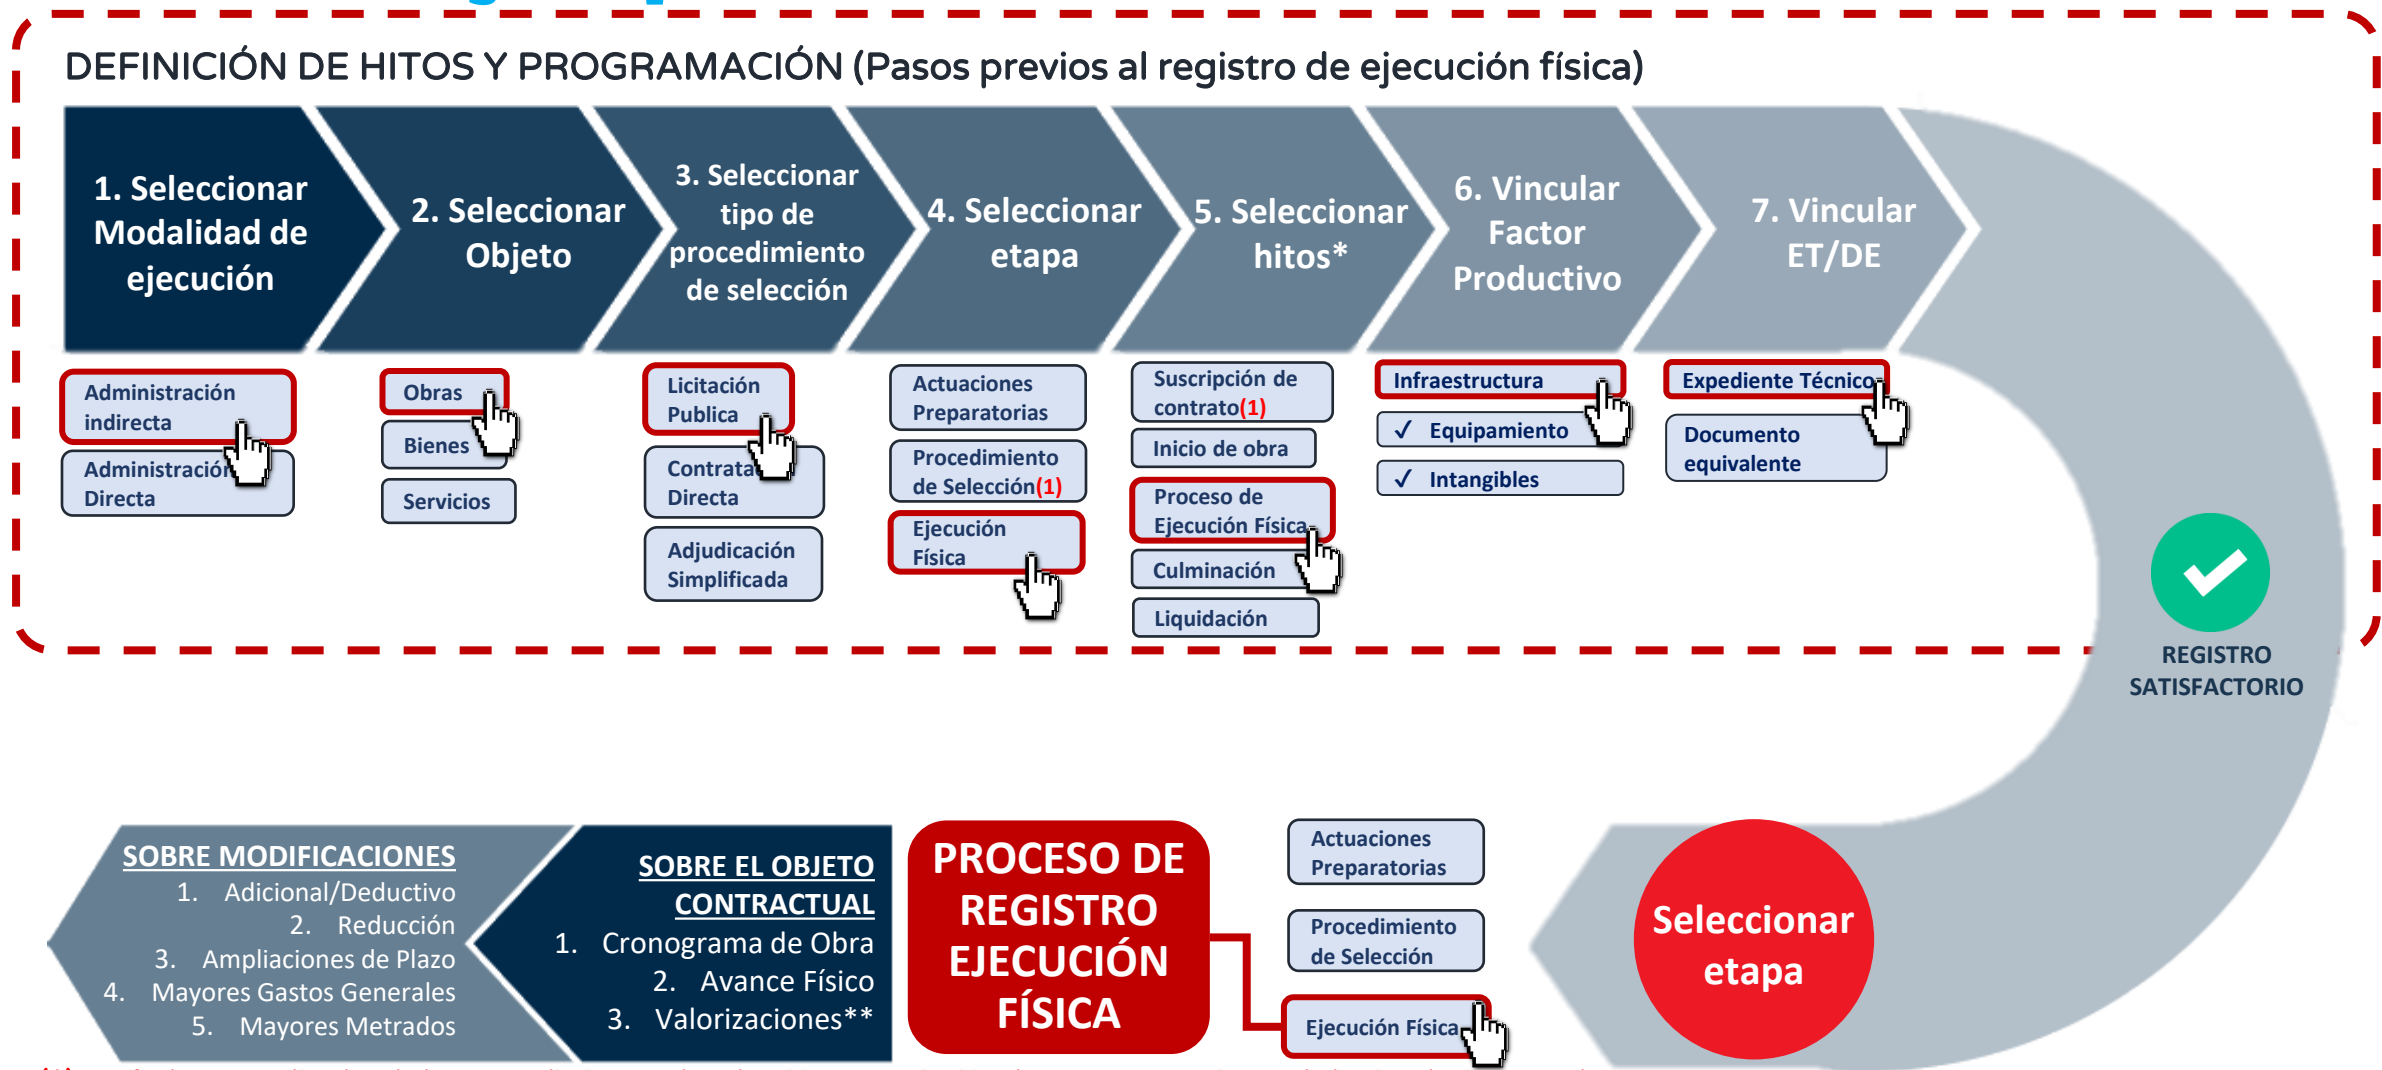

(1) Las fechas actualizadas de los procedimientos de selección y suscripción de contrato provienen de la vinculación con el SEACE

*Registrar las fechas programadas en cada Hito y las fechas actualizadas, de corresponder

** Valorizaciones de las modificaciones contractuales (Adicionales, Mayores Gastos Generales, Mayores Metrados)

IV. Registro de Ejecución física

Las UEI podrán registrar el seguimiento de la ejecución física a nivel de etapas e hitos de las diferentes modalidades de ejecución. Cabe indicar que el registro de la ejecución física se realiza por línea de seguimiento y este se encuentra vinculado a un ET/DE.



A. Información general del seguimiento

Información general del seguimiento de obras, bienes y servicios a nivel de etapas e hitos.



B. Cronograma

Información del plazo de ejecución física programada y vigente



C. Avance físico

Información del avance físico de la obra programado y real




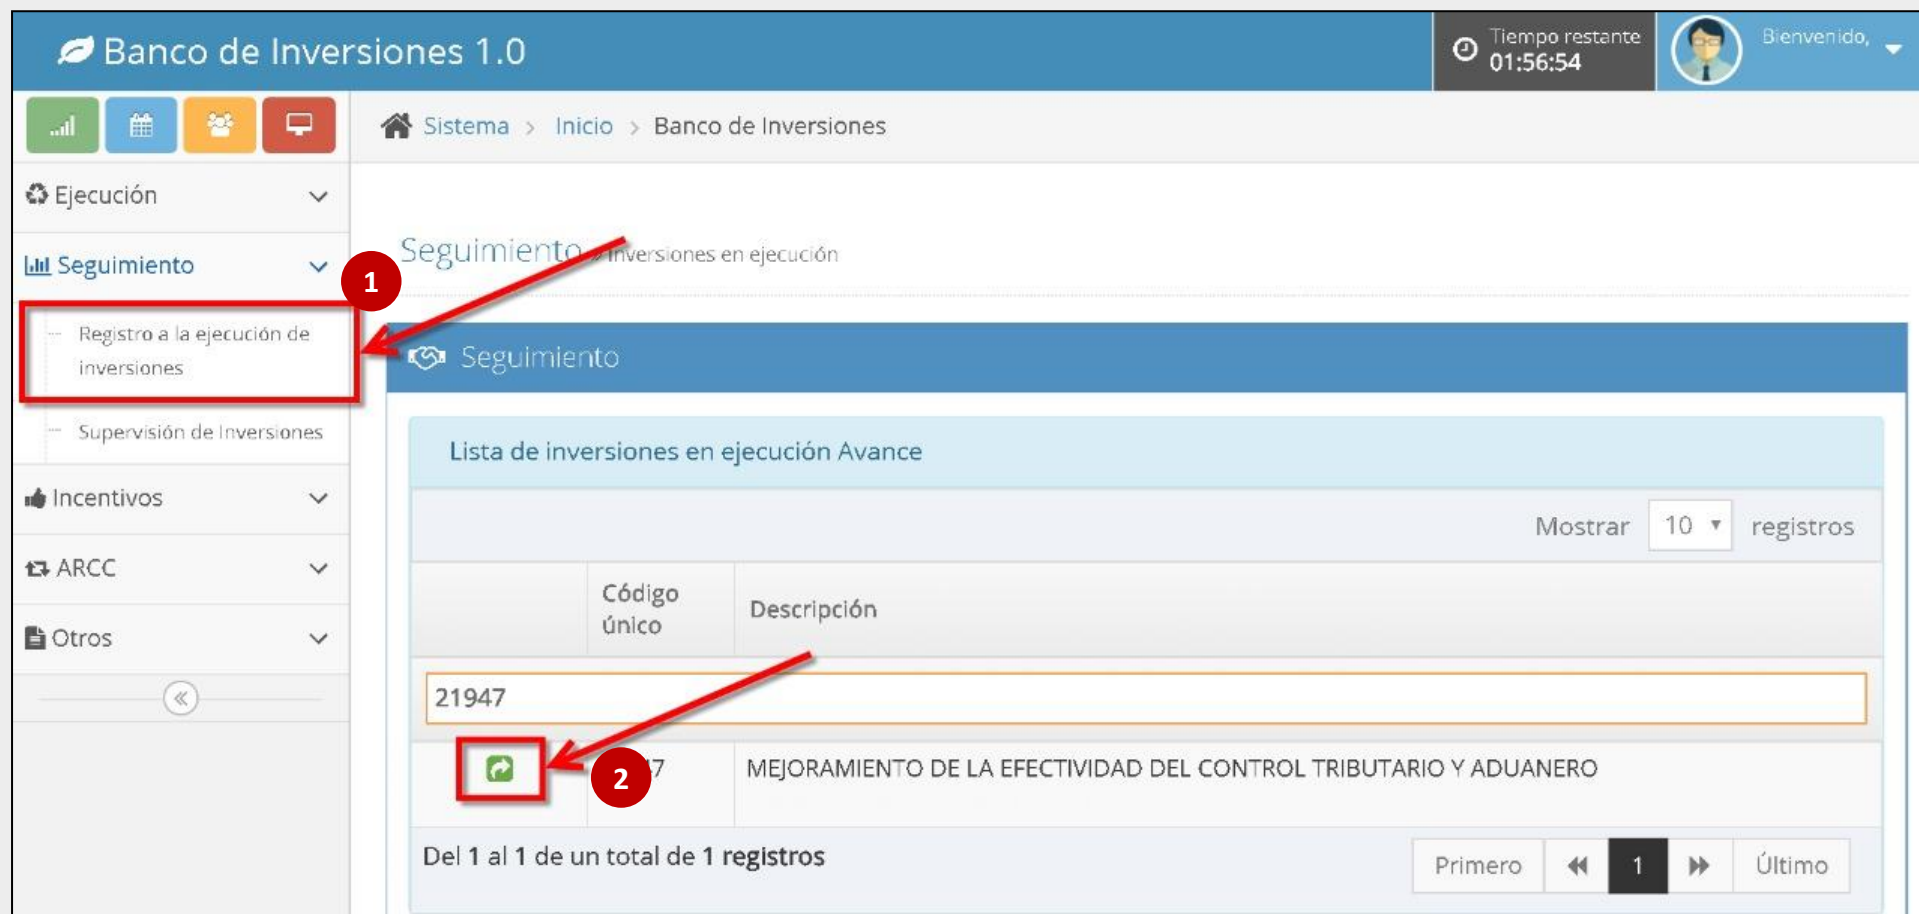
D. Modificaciones en ejecución física

Documentos aprobados de las modificaciones de la obra


IV. Registro de Ejecución física

ACCESO

- 1 Ingresar al módulo de “Seguimiento” del Banco de Inversiones.
- 2 Buscar el código único de la inversión que va registrar Avance físico y hacer clic en 



Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:56:54 Bienvenido, 

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Supervisión de Inversiones

Incentivos

ARCC

Otros

Seguimiento de inversiones en ejecución

Seguimiento

Lista de inversiones en ejecución Avance

Mostrar 10 registros

Código único	Descripción
21947	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

Primero 1 Último

IV. Registro de Ejecución física

ACCESO

- 3 Seleccionar “Seguimiento físico (Hitos)”.
- 4 hacer clic en **Agregar** para generar registro.

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEIPNSR3 > Entidad : UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Registro del seguimiento de inversiones > Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

2170957 - INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUSNUPATA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

Información de la inversión Expediente técnico Ejecución Financiera BIM Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

Seguimientos

Nº de Seguimientos

0 Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
--	-------------	-------------------	--------	------------------------	------------------------

Volver

IV. Registro de Ejecución física

A. Información General del Seguimiento

5 Para iniciar el registro por cada línea de seguimiento, la UEI deberá hacer clic en **Agregar**.

Seguimientos

Nº de Seguimientos

1

Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
	I ETAPA: EJECUCIÓN DE OBRA DE AMBIENTES DE ATENCIÓN MÉDICA PARA EL PUESTO DE SALUD DE SAURAMA	24/06/2022	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	

6 La UEI deberá completar:

- **Descripción del seguimiento** (el nombre con el cual se identifica a las obras, bienes o servicios y al cual se realizará seguimiento)
- **Modalidad de ejecución,**
- **Objeto** (obras, bienes o servicios),
- **Tipo de proceso** (este campo no esta habilitado para la modalidad administración directa)
- **Etapa**

Seguimientos

Descripción del Seguimiento

EJECUCION DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL

Modalidad de Ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Objeto

OBRAS - CONTRATA

Tipo de Proceso

LICITACIÓN PÚBLICA

Etapa

ACTUACIONES PREPARATORIAS

6

IV. Registro de Ejecución física

A. Información General del Seguimiento

7 Se registra las fechas programadas de los hitos, de acuerdo con la etapa, modalidad y objeto seleccionado previamente.

Lista de hitos					
	Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	<div><input type="text"/></div>	<div><input type="text"/></div>	<div><div></div></div>	<div><input type="text"/></div> <div>150 Caracteres</div>
2	INICIO DE OBRA	<div><input type="text"/></div>	<div><input type="text"/></div>	<div><div></div></div>	<div><input type="text"/></div>

8

+ Agregar Factores Productivos

Lista de factores productivos

	N°	Tipo de factor productivo
<div><div></div></div>	1	<div><input type="text"/></div>

Esta información proviene del Formato N° 08, sección B o C

Asociar a uno o más factores productivos.

8

+ Agregar ET

Lista de Expedientes Técnicos (F12B)

	N°	Nombre
<div><div></div></div>	1	<div>EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE - BCBVBCBVB</div>



Guardar cambios

Cancelar

Vincular con el ET/DE registrado previamente en el F12B y hacer clic en **Guardar cambios**.

9 Luego de realizar los pasos señalados, el aplicativo le mostrará el seguimiento registrado.

Seguimientos					
N° de Seguimientos					
<div><div>4</div><div>Agregar</div></div>					
	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
<div><div></div></div>	SEGUIMIENTO 1	17/11/2020	OBRA	MODALIDAD INDIRECTA	<div><div></div><div></div></div>

Al hacer clic en los iconos de   podrá realizar la actualización de fechas o agregar nuevas etapas, respectivamente.

IV. Registro de Ejecución física

B. Cronograma

- 10 Seleccionar la etapa **Ejecución Contractual** (para administración indirecta) o **Ejecución Física** (para administración directa)
- 11 En el hito de “proceso ejecución física” seleccionar el siguiente icono:

Ingrese cronograma y avance físico



Seguimientos

Etapas

- EJECUCIÓN CONTRACTUAL ✓
- ACTUACIONES PREPARATORIAS
- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
- EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Lista de hitos

	Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado
1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	07/06/2021	14/06/2021 *	
2	INICIO DE OBRA	14/06/2021	21/06/2021	INICIADO
3	PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA			



Cabe indicar que los iconos solo corresponden al objeto contractual obra.

IV. Registro de Ejecución física

B. Cronograma

Registro del avance físico

Información durante la etapa de ejecución

CRONOGRAMA AVANCE FISICO

VALORIZACIONES DE ADICIONAL, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES METRADOS

Agregar

Listado de cronogramas

Nro.	Cronograma	Fecha de Aprobación	Fecha de Inicio	Fecha de Término
------	------------	---------------------	-----------------	------------------

12

13 Completar los campos de tipo de cronograma, fecha de aprobación, fechas de inicio y termino, asimismo adjuntar el cronograma en pdf.

14 Completar el periodo, el avance físico acumulado programado en porcentaje y nuevos soles y hacer clic en **Agregar periodo**.

15 Una vez culminado el registro de los periodos, hacer clic en **Guardar**.

12 Al aperturarse la ventana de registro de avance físico, nos ubicaremos en la pestaña de cronograma y hacer clic en el botón **Agregar**.

Registro del avance físico

Información durante la etapa de ejecución

CRONOGRAMA AVANCE FISICO VALORIZACIONES DE ADICIONAL, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES METRADOS

Cancelar

Registro

Tipo **PROGRAMADO** Fec. Aprobación 01/06/2021

Fec. Inicio 01/06/2021 Fec. Término 11/06/2021 Adjuntar calendario CRONOGRAMA - COPIA.PDF

Periodo 202006 Avance físico acum. (%) 3.00 Avance físico acum. (S/.) 86275.98 **Agregar periodo**

Avance

Periodo	Avance físico programado acumulado (%)	Avance físico programado acumulado (S/.)
---------	--	--

Guardar **Salir** **Agregar periodo**

13

14

15

IV. Registro de Ejecución física

C. Avance Físico



16 Para registrar información del avance físico nos ubicamos en la pestaña “avance físico” y hacer clic en el botón **Agregar**.

17 Completar los campos de periodo, avance físico programado y real en porcentajes (%) y en soles (S/), seleccionar el estado situacional, adjuntar el resumen de valorización en formato pdf y una foto en formato jpg.

CRONOGRAMA AVANCE FISICO

VALORIZACIONES DE ADICIONAL, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES METRADOS

Cancelar

17

Registro

Periodo: 20200

Adjuntar valorización: VALORIZACION.PD

Adjuntar foto: FOTO.JPG

Avance físico Acumulado (%)		Programado (%)	Real (%)
		3	1.96

Avance valorizado acumulado (S/.)		Programado (S/.)	Real (S/.)
		86275.98	56275.98

Estado situacional: OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)

- OBRA SUSPENDIDA
- OBRA PARALIZADA
- OBRA ATRASADA (5% - 20%)
- OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)**
- OBRA ADELANTADA (>5%)
- EN CONTROVERSIA/ARBITRAJE
- CONTRATO RESUELTO/CONVENIO RESUELTO

IV. Registro de Ejecución física

C. Avance Físico

18 registre un riesgo o una problemática

☒ Riesgo/Problemática ☐ No se identifica Riesgo/Problemática

Riesgos

Problemas

Riesgo

Los riesgos son los eventos o condiciones inciertas que, en caso de ocurrir, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos de la inversión.

Cerrar

Iniciar

19 Completar los campos de riesgos / problemática, descripción, medidas de mitigación (riesgo), entidad, responsable, agregar un comentario del periodo y hacer clic en **Guardar**.

18 Para poder registrar un riesgo / problemática seleccionar la pestaña y hacer clic en el botón **Iniciar**.

Riesgos

Geológicos y/o Geotécnicos

Descripción del riesgo

Inestabilidad de Talud aledaño al Cerco perimétrico

Máximo de caracteres permitidos: 949

Medidas de mitigación

Evaluación del especialista de la UEI

Máximo de caracteres permitidos: 963

Entidad/Responsable

ENTIDAD (GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS/ GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO/ UEI)

Supervisor/UEI

Máximo de caracteres permitidos: 486

Comentario del periodo

La ejecucion presenta atraso aprox del 1%

Máximo de caracteres permitidos: 459

Guardar

Salir

IV. Registro de Ejecución física

C. Avance Físico

✓ Valorizaciones de adicional, mayores gastos generales y mayores metrados

20 Ubicaremos la pestaña “Valorizaciones de Adicional, Mayores Gastos Generales y Mayores Metrados” y hacer clic en Agregar.

21 Al aperturarse la ventana emergente completar los campos necesarios para el registro, adjuntar documentos solicitados y al finalizar hacer clic en Guardar.

Información durante la etapa de ejecución

CRONOGRAMA

AVANCE FISICO

VALORIZACIONES DE ADICIONAL, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES METRADOS

Agregar

Listado de registros de valorizaciones

CRONOGRAMA

AVANCE FISICO

VALORIZACIONES DE ADICIONAL, MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES METRADOS

Registro

Tipo de valorización

DE PRESTACIONES ADICIONALES

Periodo

202006

Avance fisico Acumulado (%)

→

Avance valorizado acumulado (5/)

→

Comentario

Avance físico dentro de lo programado

Máximo de caracteres permitidos: 463

Esta información proviene de la siguiente sección “Modificaciones”

Seleccionar modificación que corresponda:

ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1

Adjuntar valorización

VALORIZACION.PDF

⬇

Programado

10.00

Real

10.00

Programado

20,000.00

Real

20,000.00

Guardar

Salir

IV. Registro de Ejecución física

D. Modificaciones en ejecución física

- 22 Seleccionar la etapa **Ejecución Contractual** (para administración indirecta) o **Ejecución Física** (para administración directa)
- 23 En el hito de “proceso ejecución física” seleccionar el siguiente icono:

Ingrese modificaciones



Seguimientos

Etapas		Lista de hitos			
EJECUCIÓN CONTRACTUAL ✓					
ACTUACIONES PREPARATORIAS					
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
	Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	
1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	07/06/2021	14/06/2021 *	▼	
2	INICIO DE OBRA	14/06/2021	21/06/2021	INICIADO ▼	
3	PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA				



Cabe indicar que los iconos solo corresponden al objeto contractual obra.

IV. Registro de Ejecución física

D. Modificaciones en ejecución física

Registro de modificaciones

Información durante la etapa de ejecución

ADICIONAL AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

MAYORES METRADOS

24 **Agregar**

Listado de Previsiones Adicionales

25 Al aperturarse la ventana emergente completar los campos y adjuntar documentos solicitados, asimismo finalizar hacer clic en **Guardar**.

24 Al aperturarse la ventana de registro de modificaciones, se podrá observar las pestañas de **Adicional**, **Ampliación**, **Reducción**, **Mayores Metrados** y **Mayores Gastos Generales**, en esta sección se adjuntará el documento que aprueba la modificación, con la opción **Agregar**.

Registro del avance Físico

Información durante la etapa de ejecución

ADICIONAL AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MAYORES GASTOS GENERALES MAYORES METRADOS

Cancelar

Registro

Nº de adicional/Deductivo 1

Fec. Aprobación 12/09/2020

Tipo de Adicional/Deductivo ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE

Porcentaje aprobado (%) 2.88

Monto de aprobación (S/.) 82697.94

Documento de Aprobación MODIF_ADICIONAL1_RES_Nº 123-2021-MPT_GI.PD


Causales POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

24 **Guardar** **Salir**

IV. Registro de Ejecución física



Reporte de Ejecución Física

Brinda información actualizada de la ejecución física de las inversiones a nivel de etapas e hitos de obras, bienes, servicios y consultorías de las diferentes modalidades de ejecución, así como a las modificaciones contractuales.



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B


SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:




1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2151255	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
OPRI:	OPRI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	REGISTRO DE CIERRE:	N/D
UEI:	INTERVENCIÓN NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PMI AÑO 1 <2022>	105.555
		PMI AÑO 2 <2023>	0
		PMI AÑO 3 <2024>	0

2. FOTOGRAFÍAS



MAY-2020



ABR-2020

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:	05/11/2018
CULMINACIÓN:	11/12/2020

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (I)

99.5%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (II)

100%

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD	APROBACIÓN DEL TERCER ETC	ÚLTIMA MODIFICACIÓN
0 MM	13.9 MM	17.2 MM
01-01-2012	01-05-2016	PER-2021

Variación

Porcentaje (%)

EJECUCION FISICA

Código Único:	2310861	Tipo de Inversión:	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre de la inversión:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

OBRAS : 22

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapas - Hitos	Ver
1	09/04/2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SISIPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			
2	26/04/2021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			

BIENES : 2

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapas - Hitos	Ver
1	26/04/2021	ADQUISICION DE MAQUINARIAS	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA		
2	03/03/2021	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y MATERIALES	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA		

SERVICIOS : 2

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapas - Hitos	Ver
1	26/04/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PTAR	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA		
2	09/04/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SISIPA	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	CONCURSO PÚBLICO		

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

- 1 Buscar en el navegador “Aplicaciones Informáticas MEF” y seleccionar la primera opción.
- 2 hacer clic en el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
- 3 Digitar el código único de inversión y hacer clic en “buscar”.

The image displays three sequential screenshots of a web browser, each illustrating a step in the process of accessing the Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).


Screenshot 1: A Google search for "aplicaciones informaticas mef". The first result, "Aplicaciones Informáticas - Ministerio de Economía y Finanzas", is highlighted with a red circle and a hand cursor pointing to it.

Screenshot 2: The website "invierte.pe" is shown. Under the "Acceso público" section, the "SSI" button (Sistema de Seguimiento de Inversiones) is highlighted with a red circle and a hand cursor pointing to it.

Screenshot 3: The SSI system interface is shown. The search bar contains the number "2988111", and the "Buscar" (Search) button is highlighted with a red circle and a hand cursor pointing to it.

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

- 4 En la sección “DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN” hacer clic en el icono .
- 5 En el Reporte de seguimiento hacer clic en la pestaña de ejecución física.
- 6 Se redireccionará al modulo de ejecución física.

4

CON DECRETO DE EMERGENCIA

CADENA FUNCIONAL

TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS NACIONALES

APROBADO (S/)

BENEFICIARIOS (HABITANTES)

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?

SI



COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)

¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?

SI



SOLUCIÓN DE CONTROLES (S/) (b)

REGISTRO DE CIERRE

NO

MONTO DE CARTA FIANZA (c)

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN

10/09/2018

FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN

25/12/2020

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)

Consideraciones:

5

Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha Últ. Modificación: 20/04/2021



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:











1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:

2310861

TIPO DE INVERSIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

NOMBRE DE LA INVERSIÓN:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

REGISTRO DE CIERRE:

NO

PMI AÑO 1 <2022>

0

6

EJECUCION FISICA

Código Único:

2310861

Nombre de la Inversión:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO

Tipo de Inversión:

PIP MAYOR (SNIP)

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

OBRAS : 22

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapas - Hitos	Ver
1	08/04/2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SISIPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			
2	26/04/2021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			

BIENES : 2

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapas - Hitos	Ver
1	26/04/2021	ADQUISICION DE MAQUINARIAS	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA		
2	03/03/2021	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y MATERIALES	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA		

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

6

EJECUCION FISICA

Código Único:

2310861

Tipo de Inversión:

PIP MAYOR (SNIP)

Nombre de la Inversión:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESTINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

OBRAS : 2

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapas - Hitos	Ver
1	16/04/2021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA – I ETAPA	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL - SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Ver
2	12/04/2021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA – II ETAPA	ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento	REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA)	ACTUACIONES PREPARATORIAS - APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	Ver

BIENES : 1

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapas - Hitos	Ver
1	26/04/2021	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y MATERIALES	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA		Ver

SERVICIOS : 2

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapas - Hitos	Ver
1	26/04/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA – II ETAPA	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA		Ver
2	09/04/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA – I ETAPA	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	CONCURSO PÚBLICO		Ver

Datos generales


- ☒ Código único de Inversión
- ☒ Nombre de la inversión
- ☒ Tipo de Inversión
- ☒ Modalidad ejecución de la inversión

Seguimientos registrados ordenados por objeto contractual

- ☒ Fecha de registro
- ☒ Descripción del seguimiento
- ☒ Modalidad de ejecución
- ☒ Tipo de proceso
- ☒ Etapa-Hito
- ☒ Ver detalle

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

7 Para visualizar la información del avance físico y las modificaciones de estas, deberá hacer clic en “ver detalle” 

EJECUCION FISICA

Código Único:

2310861

Nombre de la Inversión:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO

Tipo de Inversión:

PIP MAYOR (SNIP)

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

OBRAS :

2

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapas - Hitos	Ver
1	16/04/2021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA – I ETAPA	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL - SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
2	12/04/2021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA – II ETAPA	ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento	REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA)	ACTUACIONES PREPARATORIAS - APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	

IMPORTANTE:

Para el objeto Obras se visualizará las siguientes secciones:

✓ Hitos

✓ Avance físico

✓ Cronograma

✓ Modificaciones contractuales

✓ Ampliación de plazo

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

8 Se visualizará la ventana con información específica del objeto, para ello se dispone de 5 secciones (Hitos del objeto, avance físico, cronograma, modificaciones contractuales y ampliación de plazo).

8

EJECUCION FISICA

Código Único:	2310861	Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO
Descripción del seguimiento:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA – I ETAPA	Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
Objeto:	OBRAS - CONTRATA	Tipo de proceso:	LICITACIÓN PÚBLICA

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

Datos generales del objeto contractual

☒ Código único de inversión

☒ Nombre de la inversión

☒ Descripción del seguimiento

☒ Modalidad ejecución de

☒ Objeto contractual

☒ Tipo de proceso

Secciones para el objeto obras

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

9

HITOS DEL OBJETO

Hitos del objeto contractual

En esta sección podremos encontrar información de las etapas, hitos, fecha programada y actualizada, estado y comentarios registrados por la UEI.



Asimismo, se podrá visualizar gráficamente la línea de tiempo del seguimiento registrado.

9

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

ETAPAS - HITOS

Etapas	Hitos	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentarios
ACTUACIONES PREPARATORIAS	REQUERIMIENTO CON ET APROBADO	01/06/2021	01/06/2021	NO SOLICITADO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONVOCATORIA	15/06/2021	15/06/2021		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	INTEGRACIÓN DE LAS BASES	01/07/2021	01/07/2021		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	16/08/2021	16/08/2021		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25/09/2021	25/09/2021		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	INICIO DE OBRA	01/10/2021	01/10/2021	EN PROCESO	
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CULMINACIÓN DE OBRA	31/03/2022	31/03/2022	SIN RECEPCIONAR	
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	LIQUIDACIÓN	30/04/2022	30/04/2022	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN	

LINEA DE TIEMPO

ELABORACIÓN DEL ET

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FIRMA DE CONTRATO
19/06/2019

ENTREGABLE 1
20/08/2019

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
27/01/2021

CULMINACIÓN DE OBRA
22/07/2021

INICIO DE PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ET
20/06/2019

APROBACIÓN DEL ET
22/06/2020

INICIO DE OBRA
24/02/2021

LIQUIDACIÓN
22/08/2021

Hitos Cumplidos

Hitos Programados

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

10

AVANCE FÍSICO

Avance físico

Esta sección brinda información registrada por la UEI sobre valorizaciones (principal, adicional, mayores gastos generales y mayores metrados), el estado situacional, comentarios y riesgos/problemáticas asociados al periodo.

Del mismo modo, puede realizar descargas de las valorizaciones y fotografías.

10

HITOS DEL OBJETO	AVANCE FÍSICO	PROGRAMA ACTUALIZADO	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	AMPLIACIÓN DE PLAZO						
RESUMEN DE VALORIZACIONES										
Periodo (año-mes)	Obra Principal				Adicional	Mayores Metrados	Mayores Gastos Generales	Estado Situacional	Comentarios	Ver riesgos y Problemáticas
	Programado Acumulado		Real Acumulado		Aprobado Acumulado					
	(%)	(S/)	(%)	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)			
2021-10	96.53%	14,468,103.45	90.35%	13,541,379.02	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		
2021-09	92.27%	13,828,610.81	84.37%	12,645,115.09	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-08	88.28%	13,231,374.11	82.83%	12,414,304.64	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-07	78.55%	11,773,431.49	74.81%	11,212,291.8	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-06	65.68%	9,843,530.1	63.13%	9,461,729.47	0.00	0.00	350,000.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-05	53.79%	8,061,219.48	49.76%	7,457,875.15	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		
2021-04	41.14%	6,166,534.00	43.28%	6,486,672.76	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-03	31.72%	4,753,433.85	35.23%	5,280,163.62	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-02	25.88%	3,878,511.51	26.62%	3,989,723.4	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-01	18.95%	2,839,540.39	20.76%	3,111,444.7	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

1 Para ver el detalle de la información registrada de Adicionales, Mayores gastos Generales y Mayores metrados, hacer clic en el periodo, luego desplazarse a la parte inferior de la ventana para visualizar dicha información.

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

PROGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Periodo (año-mes)	Obra Principal				Adicional	Mayores Metrados	Mayores Gastos Generales	Estado Situacional	Comentarios	Ver riesgos y Problemáticas
	Programado Acumulado		Real Acumulado		Aprobado Acumulado					
	(%)	(S/)	(%)	(S/)	(S/)					
2021-10	97.00%	14,468,103.00	90.00%	13,541,379.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		
2021-09	92.00%	13,828,611.00	84.00%	12,645,115.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		
2021-08	88.00%	13,231,374.00	83.00%	12,414,305.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		
2021-07	79.00%	11,773,431.00	75.00%	11,212,292.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		
2021-06	63.00%	9,843,530.00	63.00%	9,461,729.00	96.00	180.00	350,000.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		
2021-05	54.00%	8,061,219.00	50.00%	7,457,875.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		

ADICIONAL

Periodo	Programado Acumulado		Real Acumulado		Numero de modificación	Comentarios
	(%)	(S/)	(%)	(S/)		
2021-06	1.00 %	3.00	2.00 %	4.00	DEDUCTIVO N° 15	
2021-06	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00	ADICIONAL DE OBRA N° 1	

MAYORES METRADOS

Periodo	Monto Acumulado (S/)	Numero de modificación	Comentarios
2021-06	80.00	MAYORES METRADOS N° 1	
2021-06	100.00	MAYORES METRADOS N° 10	

MAYORES GASTOS GENERALES

Periodo	Monto Acumulado (S/)	Numero de modificación	Comentarios
2021-06	100,000,000.00	MAYORES GASTOS GENERALES N° 2	
2021-06	15.00	MAYORES GASTOS GENERALES N° 3	

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

12 Para visualizar la valorización y fotografía registrada, hacer clic en  y  respectivamente.

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

PROGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Periodo (año-mes)	Obra Principal				Adicional	Mayores Metrados	Mayores Gastos Generales	Estado Situacional	Comentarios	Ver riesgos y Problemáticas
	Programado Acumulado		Real Acumulado		Aprobado Acumulado					
	(%)	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)					
2021-10	97.00%	14,468,103.00	90.00%	13,541,379.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 04

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86338 DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH

UBICACIÓN: HUARI - CAJAY - CAJAY
Ppto. BASE: SI 6'195,842.89
Ppto. Contratado: SI 9'974,181.00
FINANCIACIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
EJECUTORA: CONSORCIO SAN PEDRO
FACTOR DE RELACION: 0.88789

PERIODO: AGOSTO 2018
RESPONSABLE: ING. JORGE OLIVEROS RODRIGUEZ
SUPERVISOR: ING. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI
FECHA DE INICIO DE OBRA: 22/05/2018
PLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS
FECHA DE TERMINO DE OBRA: 16/01/2019

ITEM	SUB PRESUPUESTO	MONTO DEL CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE DEL MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		AVANCE PROGRAMADO	
			MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
1	INFRAESTRUCTURA	2,504,053.44	973,816.98	38.88%	278,669.02	11.13%	1,252,546.00	50.00%	1,252,546.00	50.00%	-	0.00%
2	ANQUESTRUTURA	1,961,107.59	567,608.04	28.95%	327,338.00	16.69%	434,946.03	22.34%	1,466,161.56	74.76%	-	0.00%
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	278,187.35	5,477.95	1.99%	5,576.35	2.00%	13,054.11	4.00%	264,133.24	95.98%	-	0.00%
4	INSTALACIONES SANITARIAS	236,904.38	38,718.63	16.34%	11,029.68	4.66%	49,748.31	21.00%	187,156.07	79.00%	-	0.00%
5	SUB TOTAL	4,978,052.76	1,186,811.60	23.82%	622,612.05	12.81%	1,808,294.45	36.33%	3,169,758.31	63.67%	-	0.00%
6	IMP. IMPU.	896,048.80	213,422.89	23.82%	112,870.31	12.51%	325,493.00	36.33%	570,555.80	63.67%	-	0.00%
7	TOTAL	5,874,101.56	1,399,104.20	23.82%	735,482.36	12.81%	2,133,787.45	36.33%	3,740,314.11	63.67%	-	0.00%

CONSORCIO SAN PEDRO

CONSORCIO DE INGENIEROS DEL PERU





IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

13 Para ver el riesgo/problemática hacer clic en el icono .

10

HITOS DEL OBJETO		AVANCE FÍSICO		CRONOGRAMA ACTUALIZADO		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		AMPLIACIÓN DE PLAZO		
RESUMEN DE VALORIZACIONES										
Periodo (año-mes)	Obra Principal				Adicional	Mayores Metrados	Mayores Gastos Generales	Estado Situacional	Comentarios	Ver riesgos y Problemáticas
	Programado Acumulado		Real Acumulado		Aprobado Acumulado					
	(%)	(S/)	(%)	(S/)	(S/)	(S/)	(S/)			
2021-10	97.00%	14,468,103.00	90.00%	13,541,379.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		
2021-09	92.00%	13,828,611.00	84.00%	12,645,115.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-08	88.00%	13,231,374.00	83.00%	12,414,305.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-07	79.00%	11,773,431.00	75.00%	11,212,292.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-06	66.00%	9,843,530.00	63.00%	9,461,729.00	0.00	0.00	350,000.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-05	54.00%	8,061,219.00	50.00%	7,457,875.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		


RIESGOS Y/O PROBLEMATICAS			X
Periodo	Riesgo/Problemática		
2021-10	Problemática	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES	
	Ambito	FACTORES EXTERNOS	
	Descripción	DEMORA EN LLEGADA DE ASCENSOR	
	Medidas de mitigación	MONITOREAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN	
	Entidad Responsable	GOBIERNO REGIONAL	
	Comentarios	GR INFRAESTRUCTURA MONITOREAR ADQUISICIÓN	

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

Cronograma actualizado

Esta sección brinda información registrada por la UEI sobre los cronogramas de la obra (descripción, fecha de inicio, fecha de termino, la descarga del cronograma y un enlace para ver el detalle del cronograma).

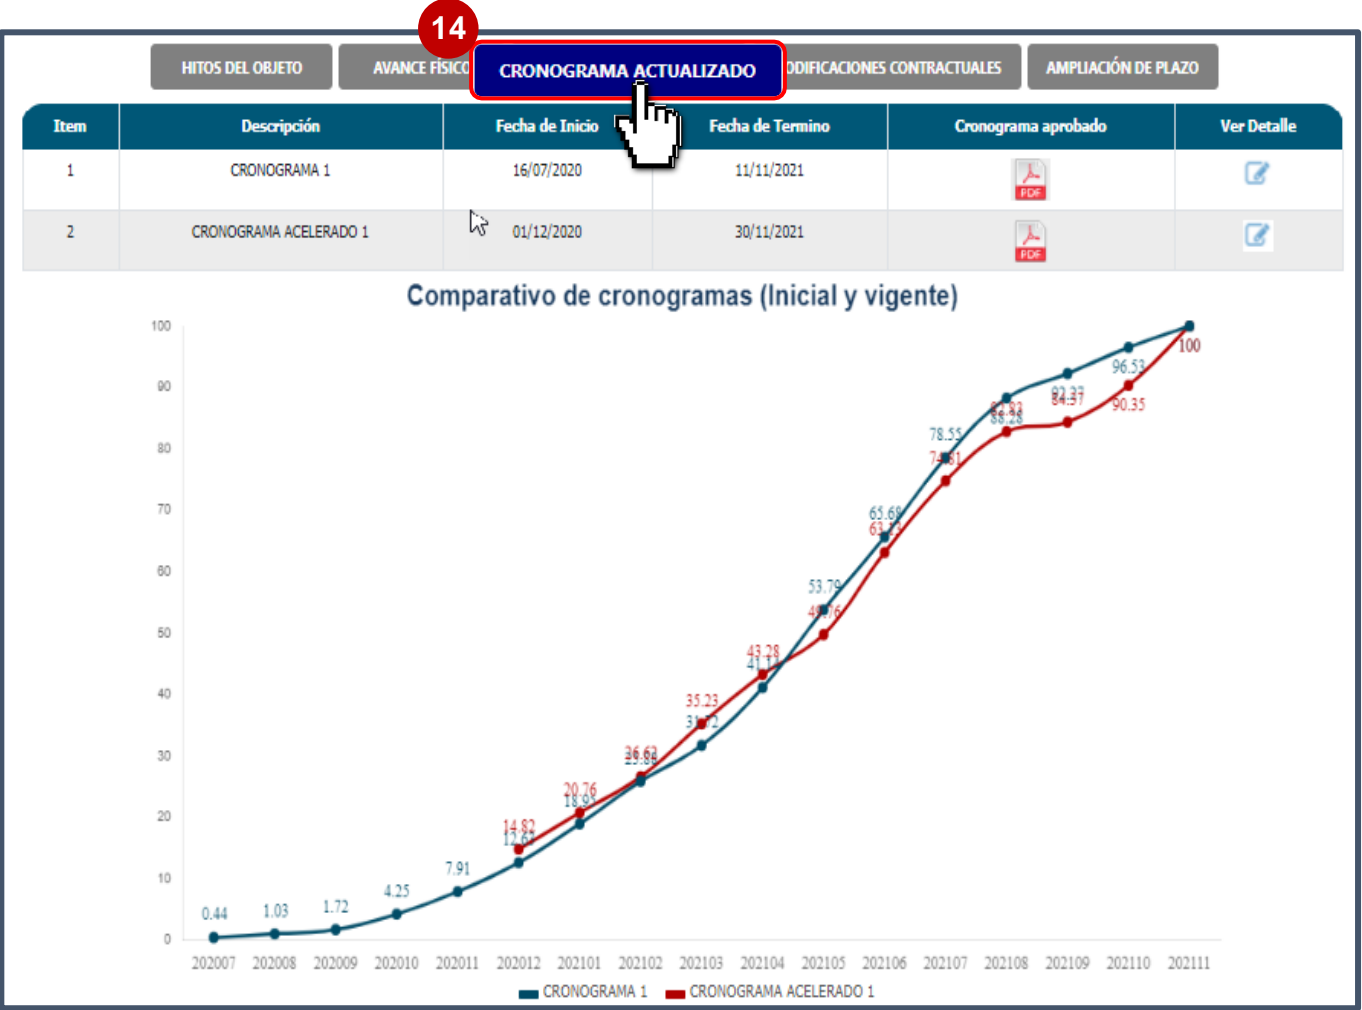

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

15

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificaciones contractuales

Esta sección brinda información de:


- A. Resumen de las modificaciones durante la ejecución.
- A. El detalle de las modificaciones aprobadas, las causales, fecha de aprobación, % de aprobación respecto al contrato principal, monto en soles y la descarga de documentos.

HITOS DEL OBJETO AVANCE FÍSICO CRONOGRAMA ACTUAL 15 MODIFICACIONES CONTRACTUALES AMPLIACIÓN DE PLAZO


RESUMEN

Nº DE ADICIONALES/DEDUCTIVOS :	1	MONTO TOTAL DE ADICIONAL/DEDUCTIVO :	1,500,000.00
Nº DE REDUCCIONES :	0	MONTO TOTAL DE REDUCCIONES :	0.00
Nº DE MAYORES GASTOS GENERALES :	1	MONTO TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES :	125,000.00
Nº DE MAYORES METRADOS :	1	MONTO TOTAL DE MAYORES METRADOS :	15,000.00


ADICIONALES/DEDUCTIVOS

Nº adicional	Tipo de adicional/Deductivo	Causales	Fecha de Aprobación	% respecto al contr. principal	Monto S/	Descarga
1	ADICIONAL DE OBRA	POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	27/08/2020	15.00 %	1,500,000.00	

MAYORES GASTOS GENERALES

Nº de Mayores Gastos Generales	Fecha de Aprobación	Monto S/	Descarga
2	09/04/2021	125,000.00	

MAYORES METRADOS

Nº de Mayores Metrados	Fecha de Aprobación	Monto S/	Descarga
1	10/12/2020	15,000.00	

Descarga del documento aprobado

IV. Registro de Ejecución física

Reporte de Ejecución Física

16

AMPLIACIÓN DE PLAZO

Ampliación de plazo

Esta sección brinda información de:

- A. Resumen de las ampliaciones de plazo.
- A. Detalle sobre las ampliaciones aprobadas, causales, fecha de aprobación, N° de días, fecha de termino, nueva fecha de termino y la descarga de documentos.

16

AMPLIACIÓN DE PLAZO

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

RESUMEN

N° DE AMPLIACIONES:	6	FECHA DE INICIO (b):	17/03/2021
N° TOTAL DE DÍAS (a):	51	FECHA DE TERMINO (c):	21/04/2021
PLAZO DE EJECUCION VIGENTE EN DÍAS ((c-b) + a):	86	NUEVA FECHA DE TERMINO:	01/05/2021

AMPLIACIONES DE PLAZO

N° de ampliación	Causales	Fecha de Aprobación	N° de días	Fecha de termino	Nueva fecha de termino	Descarga
2	OTROS	17/03/2021	10	20/03/2021	29/03/2021	
4	ATRASOS Y/O PARALIZACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRESTACIONES POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	17/03/2021	1	20/03/2021	20/03/2021	
53	OTROS	17/03/2021	10	20/03/2021	30/03/2021	
7	CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL	17/03/2021	10	20/03/2021	29/03/2021	
54	ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA	20/03/2021	10	20/03/2021	30/03/2021	
9	CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL	21/04/2021	10	21/04/2021	01/05/2021	

¡No te lo pierdas!



Capacitaciones virtuales



Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.

<https://bit.ly/CAPACITACIONES2023>



Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.

<https://bit.ly/DGPMICapacitacionesrealizadas2023>



Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.

<https://bit.ly/recursosdeaprendizaje>



¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO DGPMI>

¡No te dejes engañar!

Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>



Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

iMuchas gracias!

