

invierte.pe

Reporte de Seguimiento de Inversiones de FORMATQ N° 12-B







Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del **FORMATQ N° 12-B**

- I. ¿Qué es el reporte de Seguimiento?
- II. Acceso al Reporte
- III. Objetivos
- IV. Estructura del Reporte
- V. Importancia de las secciones


I. ¿Qué es el Reporte de Seguimiento?

Es una **herramienta de seguimiento de acceso público** que brinda información consolidada de la inversión en fase de ejecución, así como el avance físico y financiero, situación, riesgos y/o problemáticas asociados a la inversión. Cabe mencionar que la información es registrada por la UEI.

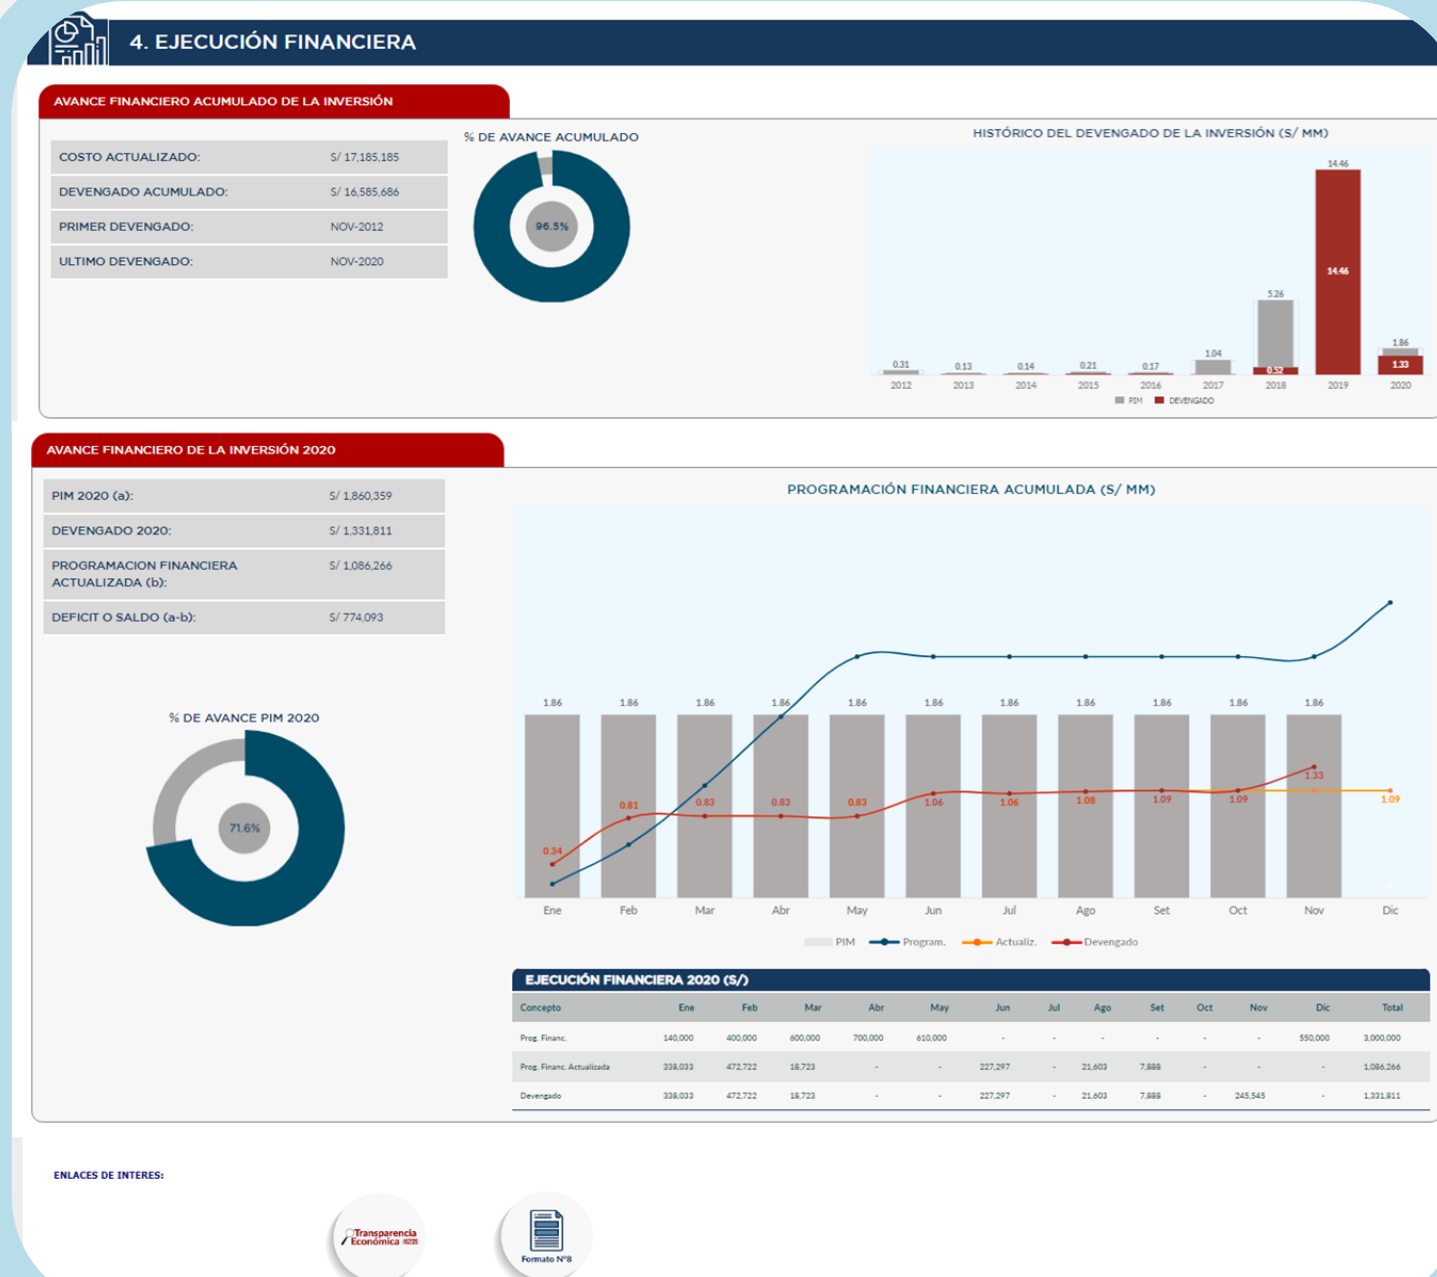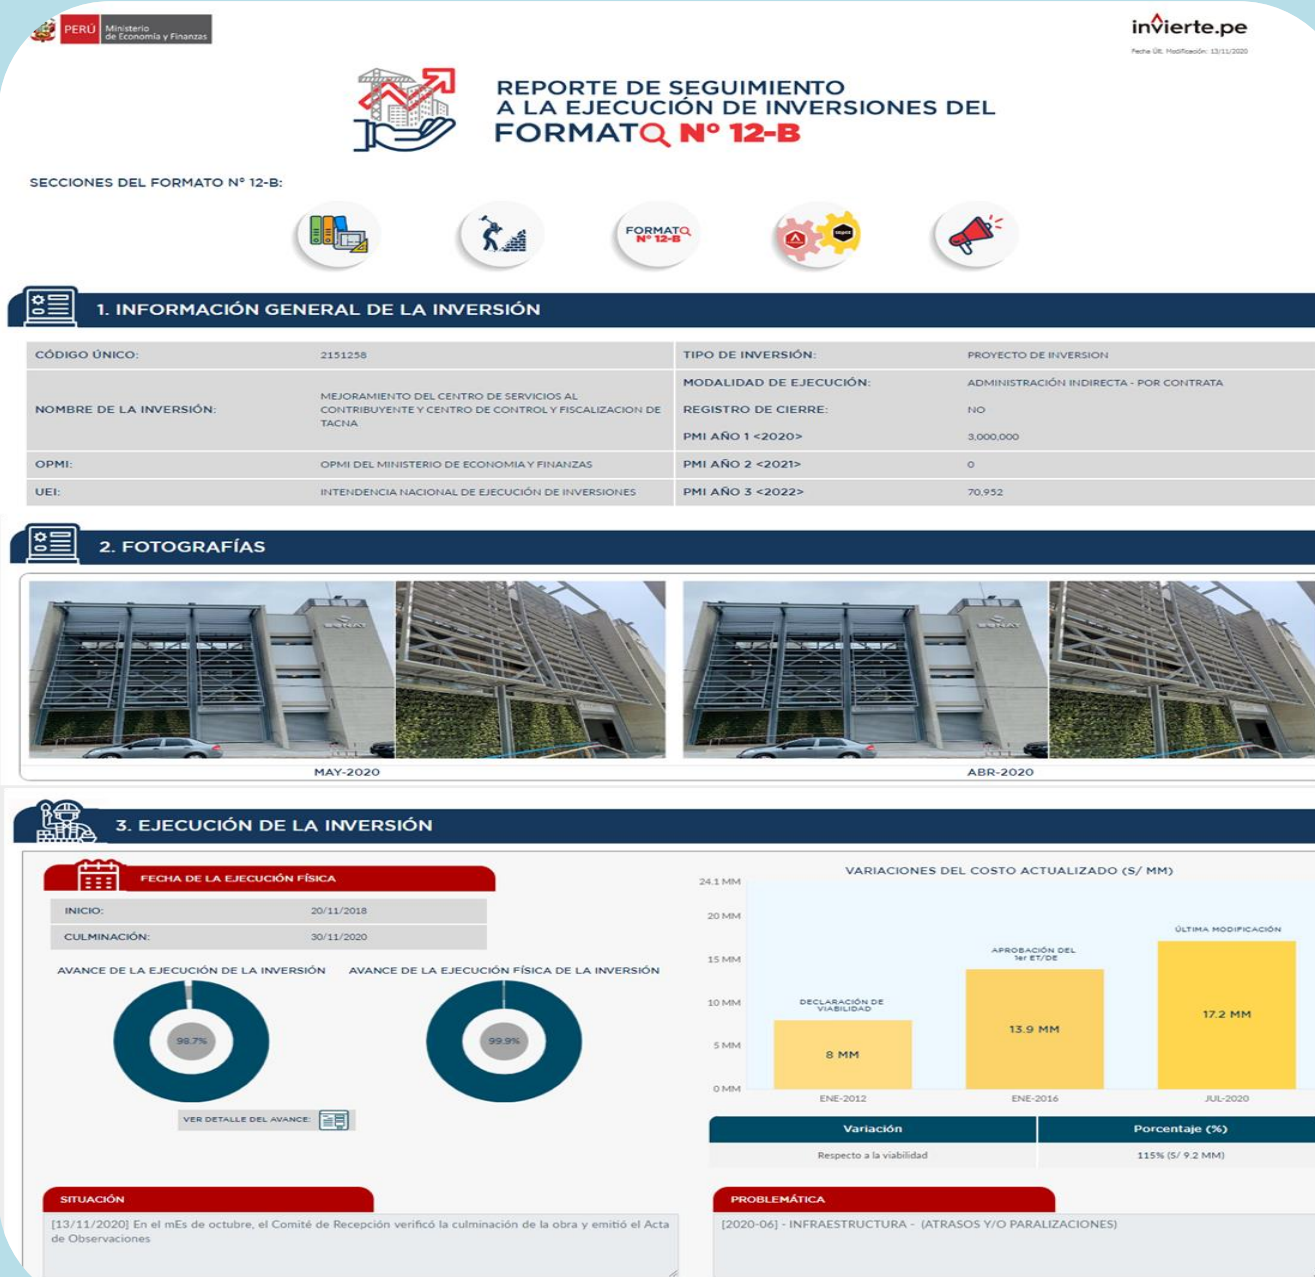

II. Acceso al Reporte


1



1

Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF”. Luego, ingresar en la primera opción resultante.

2



2

Presionar la opción “Sistema de Seguimiento Inversiones (SSI)”

II. Acceso al Reporte

3 Para acceder al Reporte, se debe ingresar al SSI

4 Dar clic en el **icono verde** 

3

☐ Código SNIP ☒ Código único de inversiones



2485224

Buscar Vista Resumen

Banco de Inversiones Contrataciones Ejecución Financiera INFObras

Código único de inversiones	2485224	Fecha de Registro	25/03/2020
Código SNIP		Tipo de inversión	INVERSIONES IOARR
Nombre PIP	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, TOMOGRAFO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC		
Cadena Funcional	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		
Unidad Formuladora (UF)	DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL APURIMAC		
Unidad Evaluadora (OPI)	-		
Beneficiarios	0	Fuente de Financiamiento:	
Situación	Aprobado	Nivel Requerido para Viabilidad	
Último Estudio y Calificación	2	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	3,950		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	0	Monto actualizado	2,866,782.2
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
¿Tiene expediente o documento equivalente registrado?		Monto carta fianza	0
¿Tiene registro de Seguimiento?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	

Haga clic aquí para ir a la página de detalles de la inversión

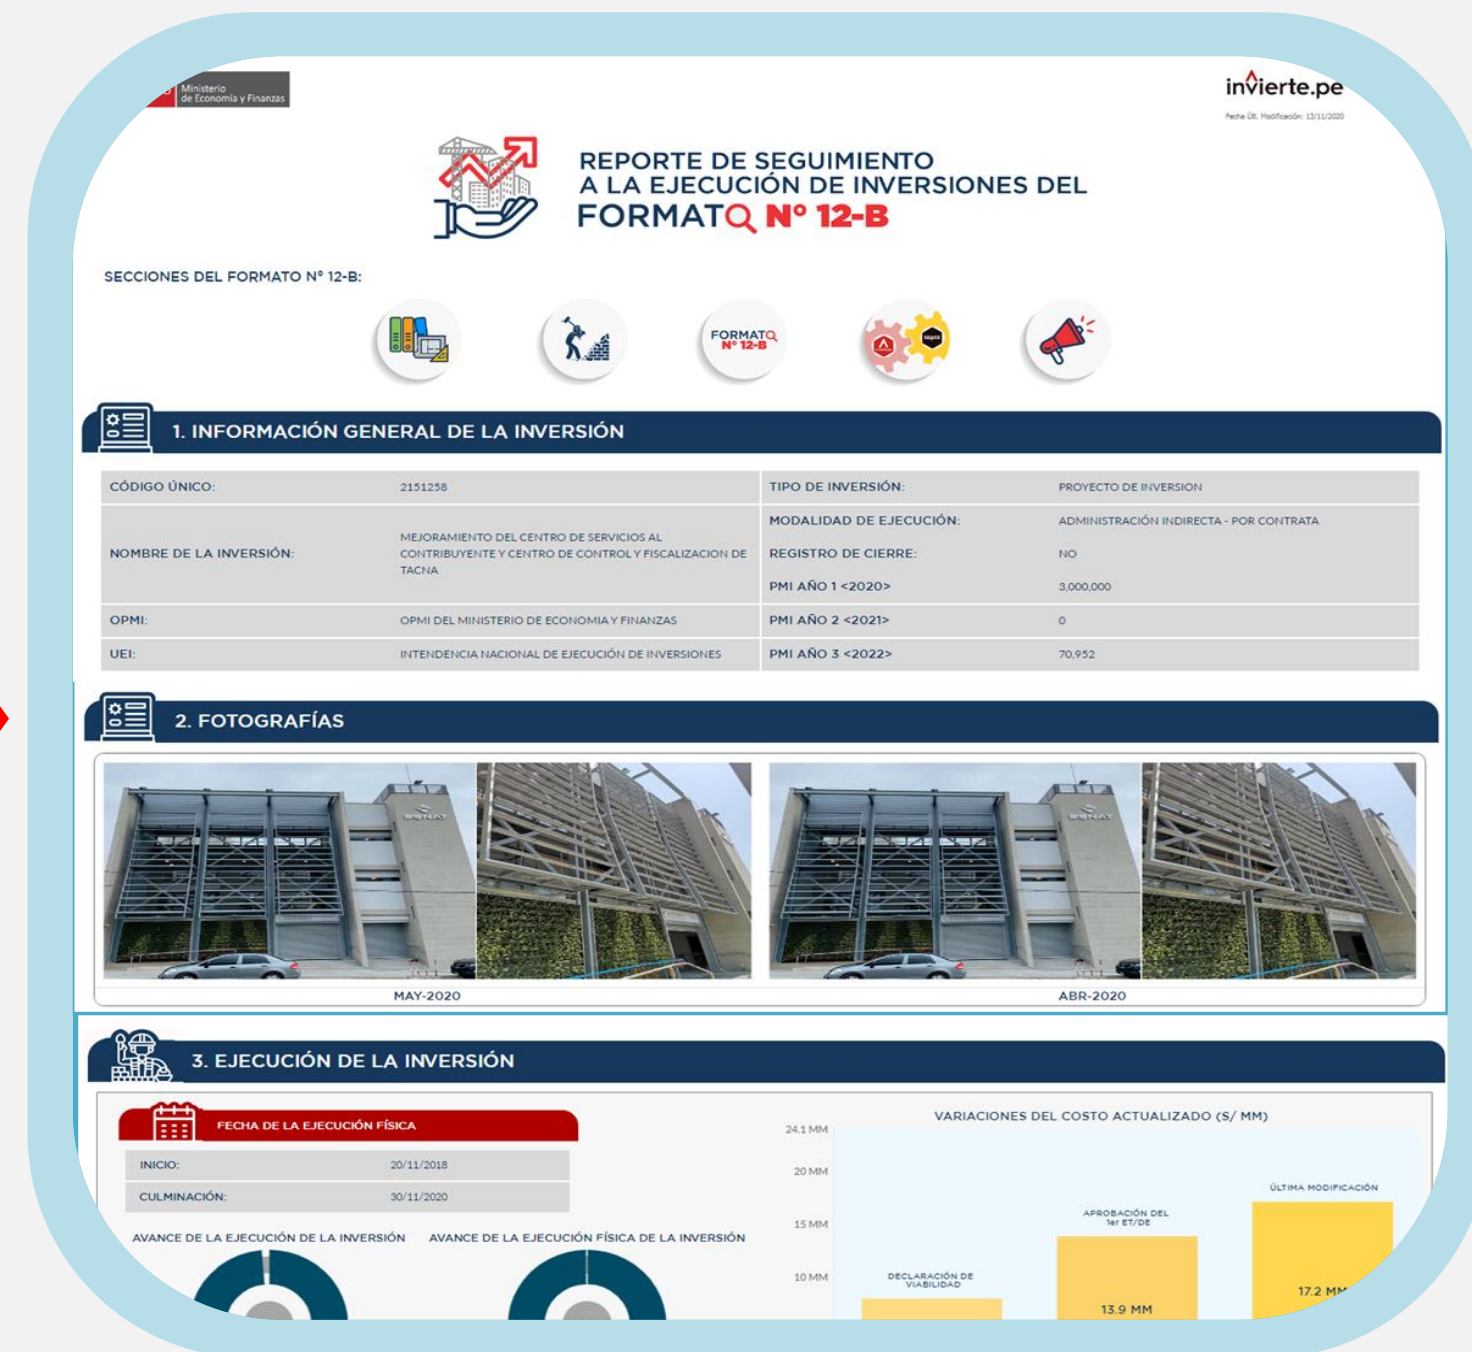

III. Objetivos



Información transparente, efectiva y eficiente de fácil acceso al público en general.

Información relevante sobre la ejecución de la inversión de una manera resumida y práctica.

Presentar los avances físicos y financieros de la inversión para una adecuada toma de decisiones en la gestión de inversiones.

IV. Estructura del Reporte



SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



Botones de acceso rápido

- Expediente Técnico/Documento Equivalente
- Avance Físico
- Formato N° 12-B
- Contrataciones
- Infobras

1. Información General de la Inversión

2. Fotografías

3. Ejecución de la Inversión

a) Avance de la inversión y avance físico


b) Variaciones del Costo Actualizado

c) Situación de la inversión

d) Problemática

1

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN			
CÓDIGO ÚNICO:	2151258	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
OPMI:	OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PMI AÑO 1 <2020>	3,000,000
		PMI AÑO 2 <2021>	0
		PMI AÑO 3 <2022>	70,952

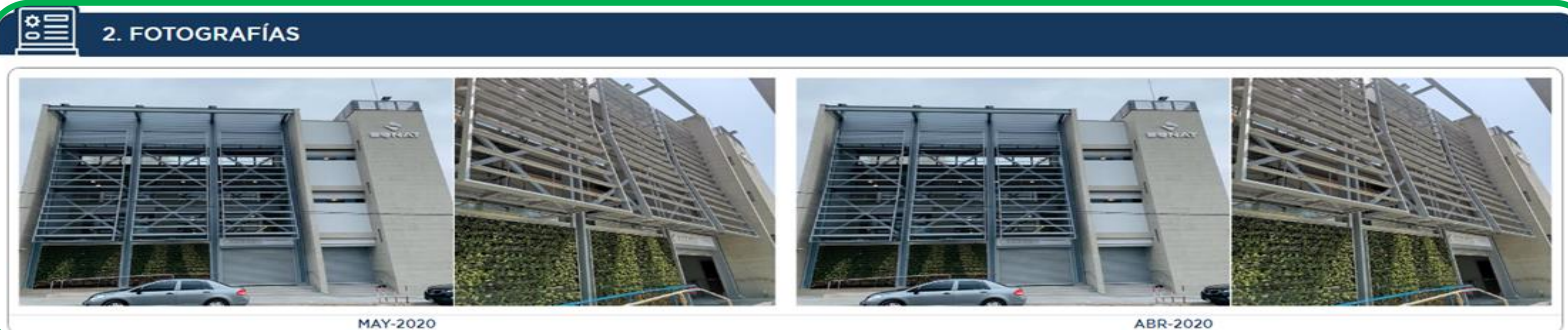

3



2

b

d

a

c

IV. Estructura del Reporte



4. Ejecución financiera

- a) Avance financiero acumulado de la inversión
- b) Histórico del devengado de la inversión
- c) Avance financiero de la inversión 2020
- d) Programación financiera acumulada
- e) Ejecución financiero 2020



Enlaces de interés

- Transparencia Económica
- Formato N° 08


V. Importancia de las secciones

1. Información General y Fotografías



V. Importancia de las secciones

2. Ejecución de la inversión



Permite conocer las **fechas de inicio y fin** de la ejecución de la inversión.

Conocer el **avance físico** de la inversión.



Muestra la **situación actual y problemática** de la inversión para una oportuna toma de decisiones.

Permite conocer las **variaciones del costo de la inversión** desde la viabilidad/aprobación hasta la ejecución.



V. Importancia de las secciones


3. Ejecución financiera de la inversión



Permite conocer el avance de la ejecución financiera del año fiscal y la acumulada. La programación financiera del año fiscal muestra el déficit o saldo presupuestal de la inversión.



Insumo para la programación presupuestal anual y sus actualizaciones.

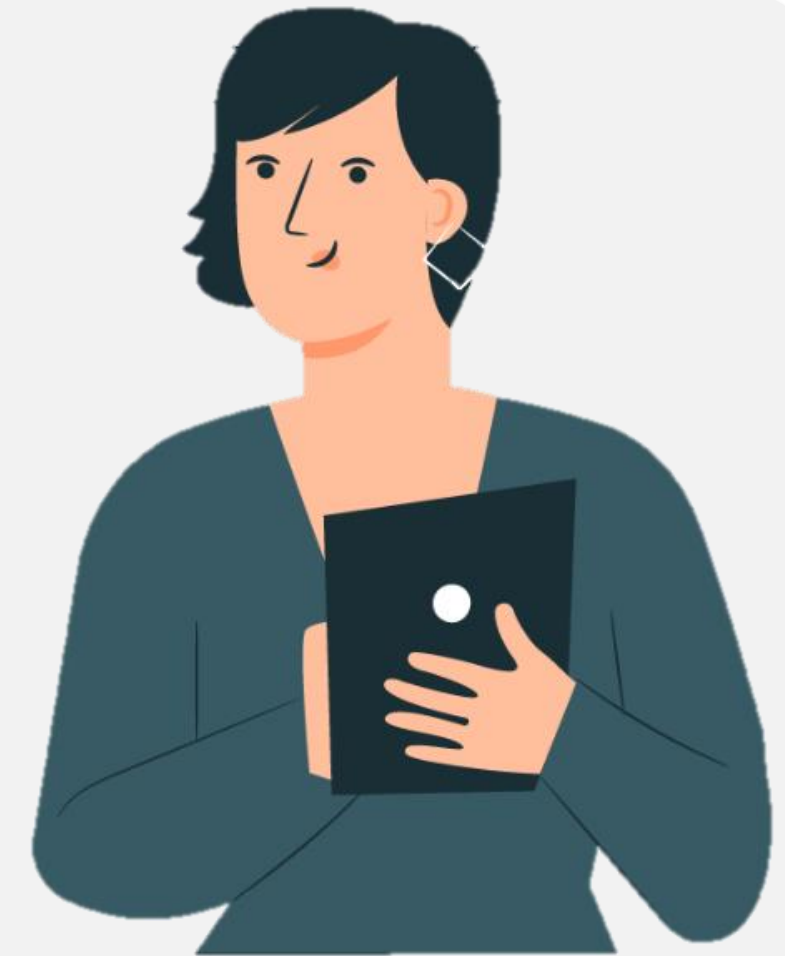

Botones de acceso rápido

EXPEDIENTE TÉCNICO/ DOCUMENTO EQUIVALENTE



Fecha Últ. Modificación: 04/11/2020




REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:




Expediente Técnico o
Documento
Equivalente



EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código Único:	2151258	Tipo de Inversión:	PIP MAYOR (SNIP)
Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA	Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

EXPEDIENTE TÉCNICO : 1

Descripción	Fecha de Registro	Modalidad de Ejecución	Ver Detalle
EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	07/10/2019	ADMINISTRACION DIRECTA	


EXPEDIENTE TÉCNICO POR AI

ETAPA	HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA ACTUALIZADA	FECHA FINAL
Elaboración de ET	Inicio	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014
Elaboración de ET	Culminación	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016
Elaboración de ET	Aprobación	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018

ESTADO SITUACIONAL DEL ET/DE

PERIODO	COMENTARIO
10/2019	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO Y APROBADO

ANTECEDENTES

COMENTARIO	DESCARGA SUSTENTO
LA INVERSION CUENTA CON 5 EXPEDIENTE TECNICOS DE LOS CUALES EL PRESENTE ET CORRESPONDE AL V	

Botones de acceso rápido

EJECUCIÓN FÍSICA




REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



FORMATO
N° 12-B



Ejecución física

invierte.pe

Fecha Últ. Modificación: 04/11/2020

EJECUCIÓN FÍSICA: FACTOR PRODUCTIVO Y ACCIÓN

Código Único: 2151258

Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA

Tipo de Inversión:



PROYECTO DE INVERSIÓN

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

PRODUCTOS / ACCIONES	TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO	UNIDAD DE PRODUCCIÓN / META	TAMAÑO / META	COSTO DE INVERSIÓN (S/)	ULTIMO PERIODO REGISTRADO	MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA (S/)	% DE AVANCE
ADECUADA INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION EN TERRENO PROPIO O CEDIDO EN USO) PARA PRESTAR LOS SERVICIOS							
OBRA DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	299,007 M2	14,766,178	2020-10	14,674,580	100 %

ADECUADA INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION EN TERRENO PROPIO O CEDIDO EN USO) PARA PRESTAR LOS SERVICIOS OBRA DE INFRAESTRUCTURA

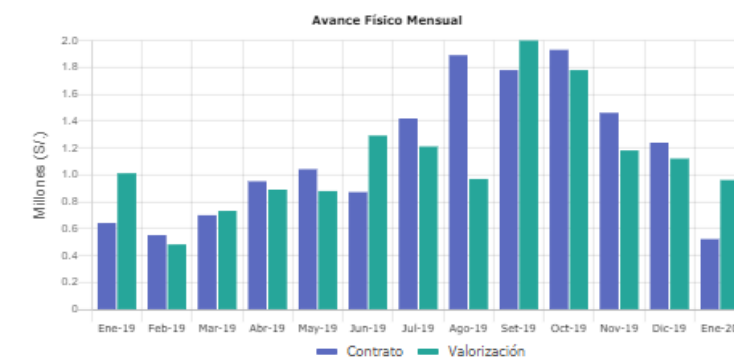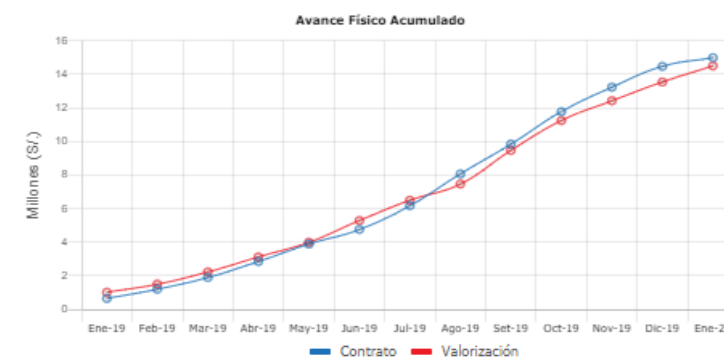

PRODUCTOS / ACCIONES	ULTIMO PERIODO REGISTRADO	MONTO DE VALORIZACIÓN ACUMULADA (S/)	% DE AVANCE	SITUACIÓN	TIPO DE PROBLEMA	EXPLICACIÓN	ACCIONES A TOMAR
ADECUADA INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION EN TERRENO PROPIO O CEDIDO EN USO) PARA PRESTAR LOS SERVICIOS							
OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2020-04	14,503,589	96.77 %	EJECUCIÓN ACUMULADA DE 96.77%.	(ATRASOS Y/O PARALIZACIONES)	LOS TRABAJOS HAN QUEDADO PARALIZADOS DEBIDO AL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO.	coordinaciones con el contratista y supervisor de obra.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2020-05	14,674,580	97.91 %	Ejecución Acumulada De 97.91%. Los Trabajos Han Quedado Paralizados Debido Al Aislamiento Social Obligatorio.	(ATRASOS Y/O PARALIZACIONES)	TRABAJOS HAN QUEDADO PARALIZADOS DEBIDO AL AISLAMIENTO	coordinaciones con el contratista y supervisor, asimismo, su REINICIO DEBERÁ ALINEARSE A LA DIRECTIVA N.º 005-2020-OSCE/CD "DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS".

invierte.pe

Botones de acceso rápido

FORMATO N° 12-B





REPORTE DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL
FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



FORMATO
N° 12-B



Formato N° 12-B



Fecha últ. Modificación: 04/11/2020

Formato N°12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones										Exportar PDF	Vista Resumen		
Código único de inversiones				2151258				Fecha de última modificación		13/11/2020 05:05:47 p.m.			
Nombre de la Inversión				MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA									
Costo actualizado				S/17,185,185.42		PIM 2020		S/1,860,359.00					
Dev. acumulado				S/16,585,685.50		Dev. 2020		S/1,331,811.25					
PMI AÑO 1 <2020>				S/3,000,000.00		PMI AÑO 2 <2021>		S/0.00		PMI AÑO 3 <2022>			
UEI				38461-INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES		Modalidad de ejecución		ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA					
I EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE													
Haga clic aquí para ver el detalle													
II EJECUCIÓN FÍSICA													
Registro más reciente en el Procedimiento de Selección													
No registra información													
Detalle de la Ejecución Física													
Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones						Según ET/DE		Según Contrato/Convenio		Según Valorización			
						Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Docto.	Foto
adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios													
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura						2019-01	S/425,690.31	2019-01	S/637,516.27	2019-01	S/1,010,144.35		
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura						2019-02	S/1,094,239.89	2019-02	S/1,186,203.93	2019-02	S/1,485,054.73		
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura						2019-03	S/1,730,267.76	2019-03	S/1,892,703.10	2019-03	S/2,221,876.63		
III EJECUCIÓN FINANCIERA													
Programación financiera						Programación financiera actualizada				Avance financiero real			
Periodo		Monto		Periodo		Monto		Periodo		Monto			
2020-01		S/140,000.00		2020-01		S/338,032.50		2020-01		S/338,032.50			
2020-02		S/400,000.00		2020-02		S/472,721.59		2020-02		S/472,721.59			
2020-03		S/600,000.00		2020-03		S/18,722.99		2020-03		S/18,722.99			
2020-04		S/700,000.00		2020-04		S/ 00		2020-04		S/ 00			
2020-05		S/610,000.00		2020-05		S/ 00							
2020-06		S/ 00		2020-06		S/227,297.43		2020-06		S/227,297.43			
2020-07		S/ 00		2020-07		S/ 00		2020-07		S/ 00			
2020-08		S/ 00		2020-08		S/21,603.45		2020-08		S/21,603.45			
2020-09		S/ 00		2020-09		S/7,887.80		2020-09		S/7,887.80			
2020-10		S/ 00		2020-10		S/ 00		2020-10		S/ 00			
2020-11		S/ 00		2020-11		S/ 00		2020-11		S/245,545.49			
2020-12		S/550,000.00		2020-12		S/ 00							
Total		S/. 3,000,000.00		Total		S/. 1,086,265.76		Total		S/. 1,331,811.25			
IV ESTADO SITUACIONAL													
Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones		Estado Situacional				Avance	Problemas						
		Periodo	Situación		Tipo de Problema		Explicación	Acciones a tomar					
adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios													
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura		2019-01	Avance Físico 6.74% Se Ha Ejecutado Trabajos Referidos A Movimiento De Tierras, Calzaduras, Iniciándose La Ejecución De Los Muros Ancrados.				6.74 %						
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura		2019-02	Avance Físico 9% Se Ha Realizado Trabajos Habilitación De Acero De Refuerzo, Encofrado Y Vaciado De Muros Secundarios Ancrados.				9.91 %						

Botones de acceso rápido

INFOBRAS


Fecha Últ. Modificación: 04/11/2020




**REPORTE DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL
FORMATQ N° 12-B**

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



Infobras



**EN PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN**

Material didáctico

INSTRUCTIVOS



- ✓ **Instructivo del avance de la inversión**
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/F12B/Instructivo_AvanceFisico.pdf
- ✓ **Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE**
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_ET.pdf
- ✓ **Instructivo de la vinculación SEACE y Banco de Inversiones**
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/seguimiento/VinculacionSeace.pdf
- ✓ **Instructivo del reportes de Inversiones para Responsables de OPMI**
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Reporte_OPMI.pdf

VIDEO-TUTORIAL



- ✓ **Videotutorial del avance de la inversión**
<https://www.youtube.com/watch?v=7fqdNQ5MbF0&t=19s>
- ✓ **Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE**
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Tutorial_ET.mp4
- ✓ **Videotutorial de la vinculación SEACE y Banco de Inversiones**
<https://www.youtube.com/watch?v=RjfodkDXluM&t=3s>
- ✓ **Videotutorial de reportes de Inversiones para Responsables de OPMI**
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Reporte_OPMI.mp4

Todas nuestras conferencias y capacitaciones las encuentras en nuestra web, en el link:

CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

<https://bit.ly/2VHzej2Capacitaciones2020>

en la sección de:



EVENTOS REALIZADOS

Material didáctico



Consultas generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://bit.ly/2VHzej2Capacitaciones2020>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos a nivel nacional y agenda tu reunión virtual.

CONECTA MEF

www.mef.gob.pe/conectamef

Muchas gracias

 **invierte.pe**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas
