



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES




-
1. ¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?
 2. Objetivos
 3. Acceso al SSI
 4. Botones de acceso
 5. Estructura

1. ¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?

Es una herramienta informática de acceso público que permite el seguimiento de inversiones públicas e integra información de las diferentes fases del ciclo de inversión:

1. Programación Multianual de Inversiones.
2. Formulación y evaluación.
3. Ejecución.
4. Funcionamiento(*)

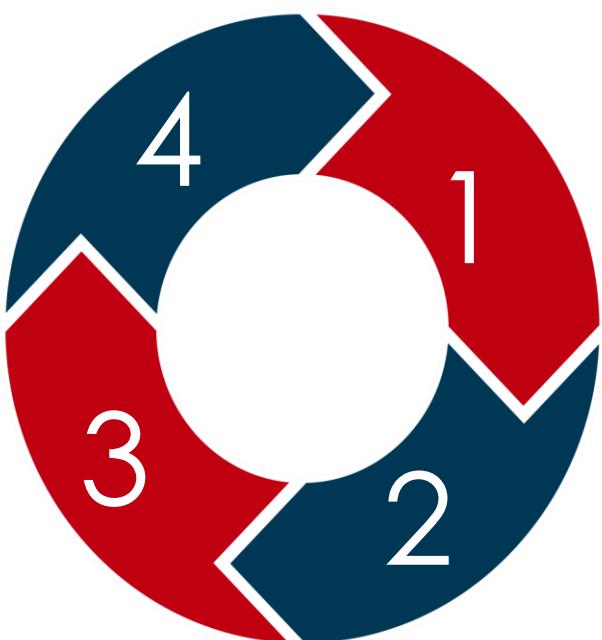


(*) En implementación


Además está vinculado con varios sistemas informáticos del Estado



2. OBJETIVOS



Mostrar información sistematizada de las inversiones, para un adecuado seguimiento.



Optimizar el tiempo de búsqueda a través de los vínculos de acceso con los formatos de las diferentes fases del ciclo de inversión.




Brindar información actualizada de las inversiones con la finalidad de facilitar la elaboración de reportes de seguimiento.



Conocer los actores que intervienen en la gestión de la Inversión pública (OPMI, UEI y UF).

3. ACCESO AL SSI

Luego de ingresar a la pagina del Ministerio de Economía y finanzas, se deberá dar clic en :

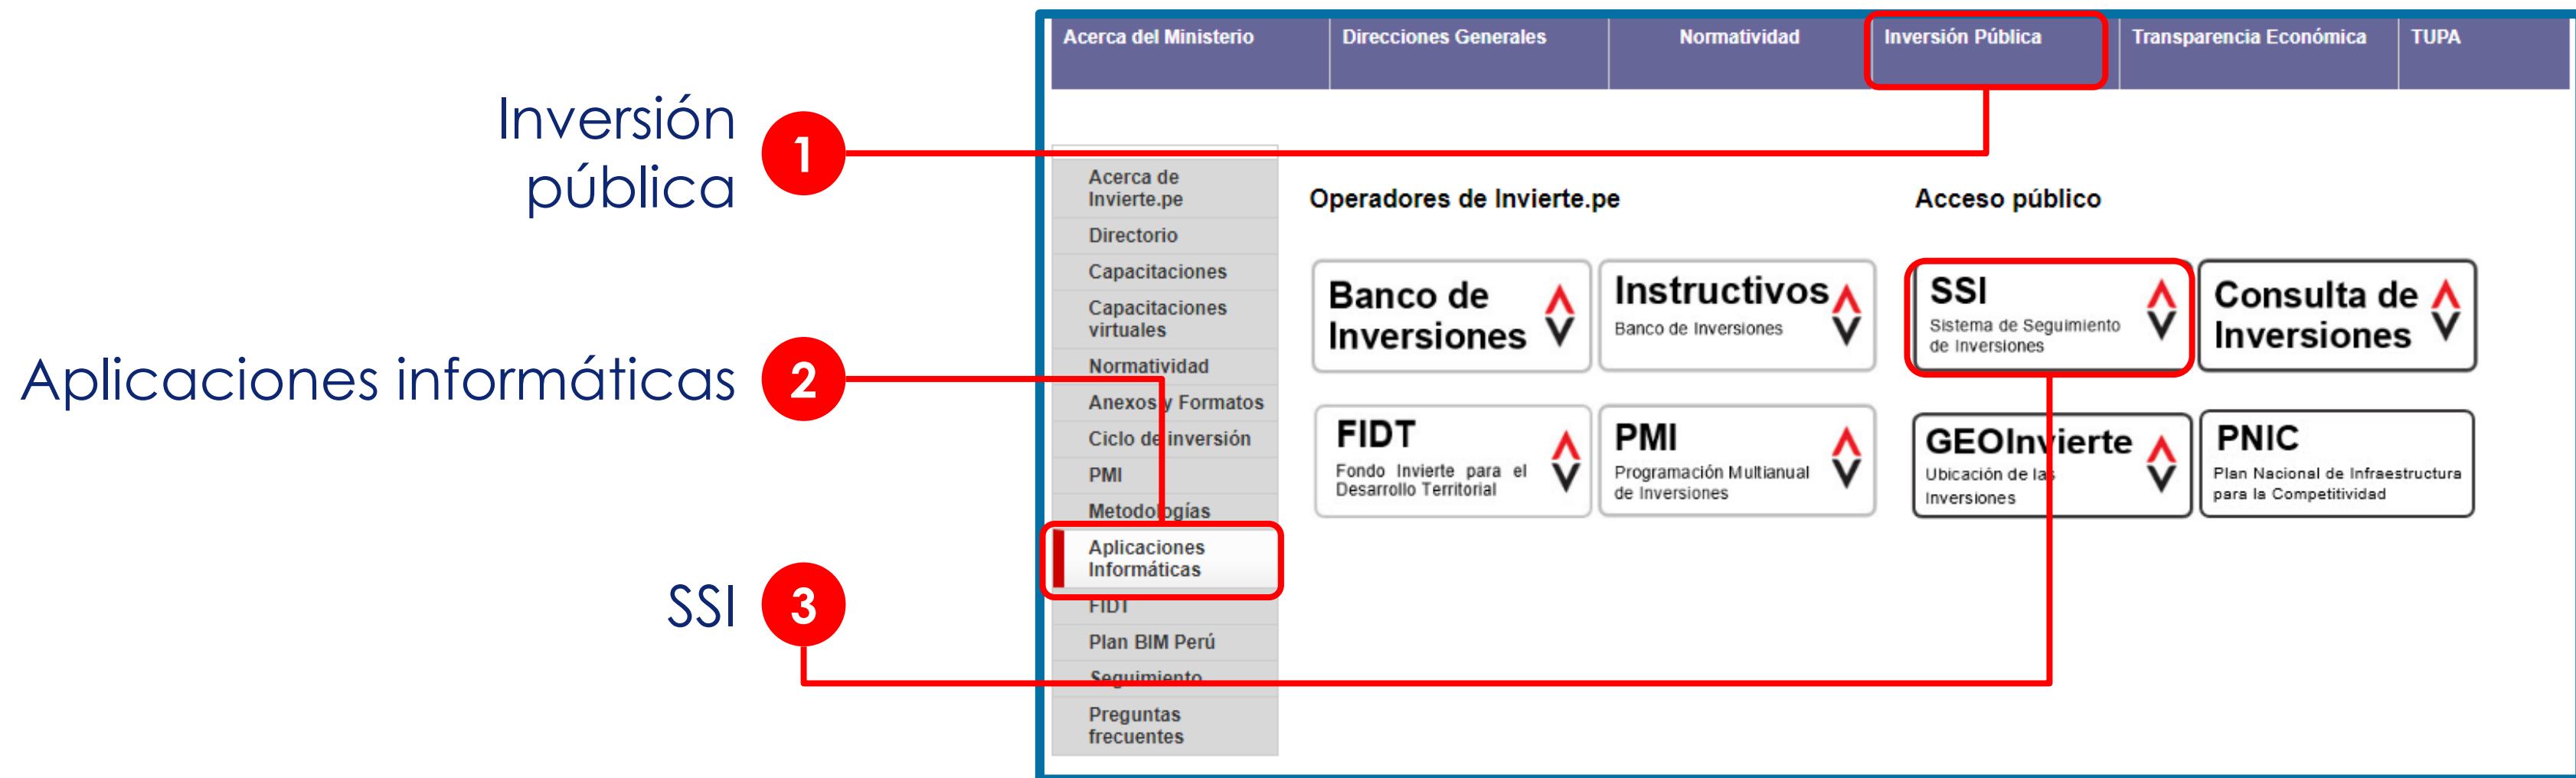

Nota: También se puede ingresar a través del siguiente link: <https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/>

4. BOTONES DE ACCESO

- 1 Acceso a operadores
- 2 Campo de búsqueda
- 3 Vista resumen



4. BOTONES DE ACCESO

1 Acceso a operadores

Este acceso es únicamente para inversiones del Sector Defensa. Para ello se deberá ingresar el usuario y contraseña asignado.



4. BOTONES DE ACCESO

2 Campo de búsqueda


La búsqueda de la inversión se realiza por Código Único de Inversiones (CUI) o Código SNIP.



4. BOTONES DE ACCESO

3 Vista resumen

Con este botón se podrá dirigir a la vista resumen imprimible donde se mostrará la información de las 4 secciones.

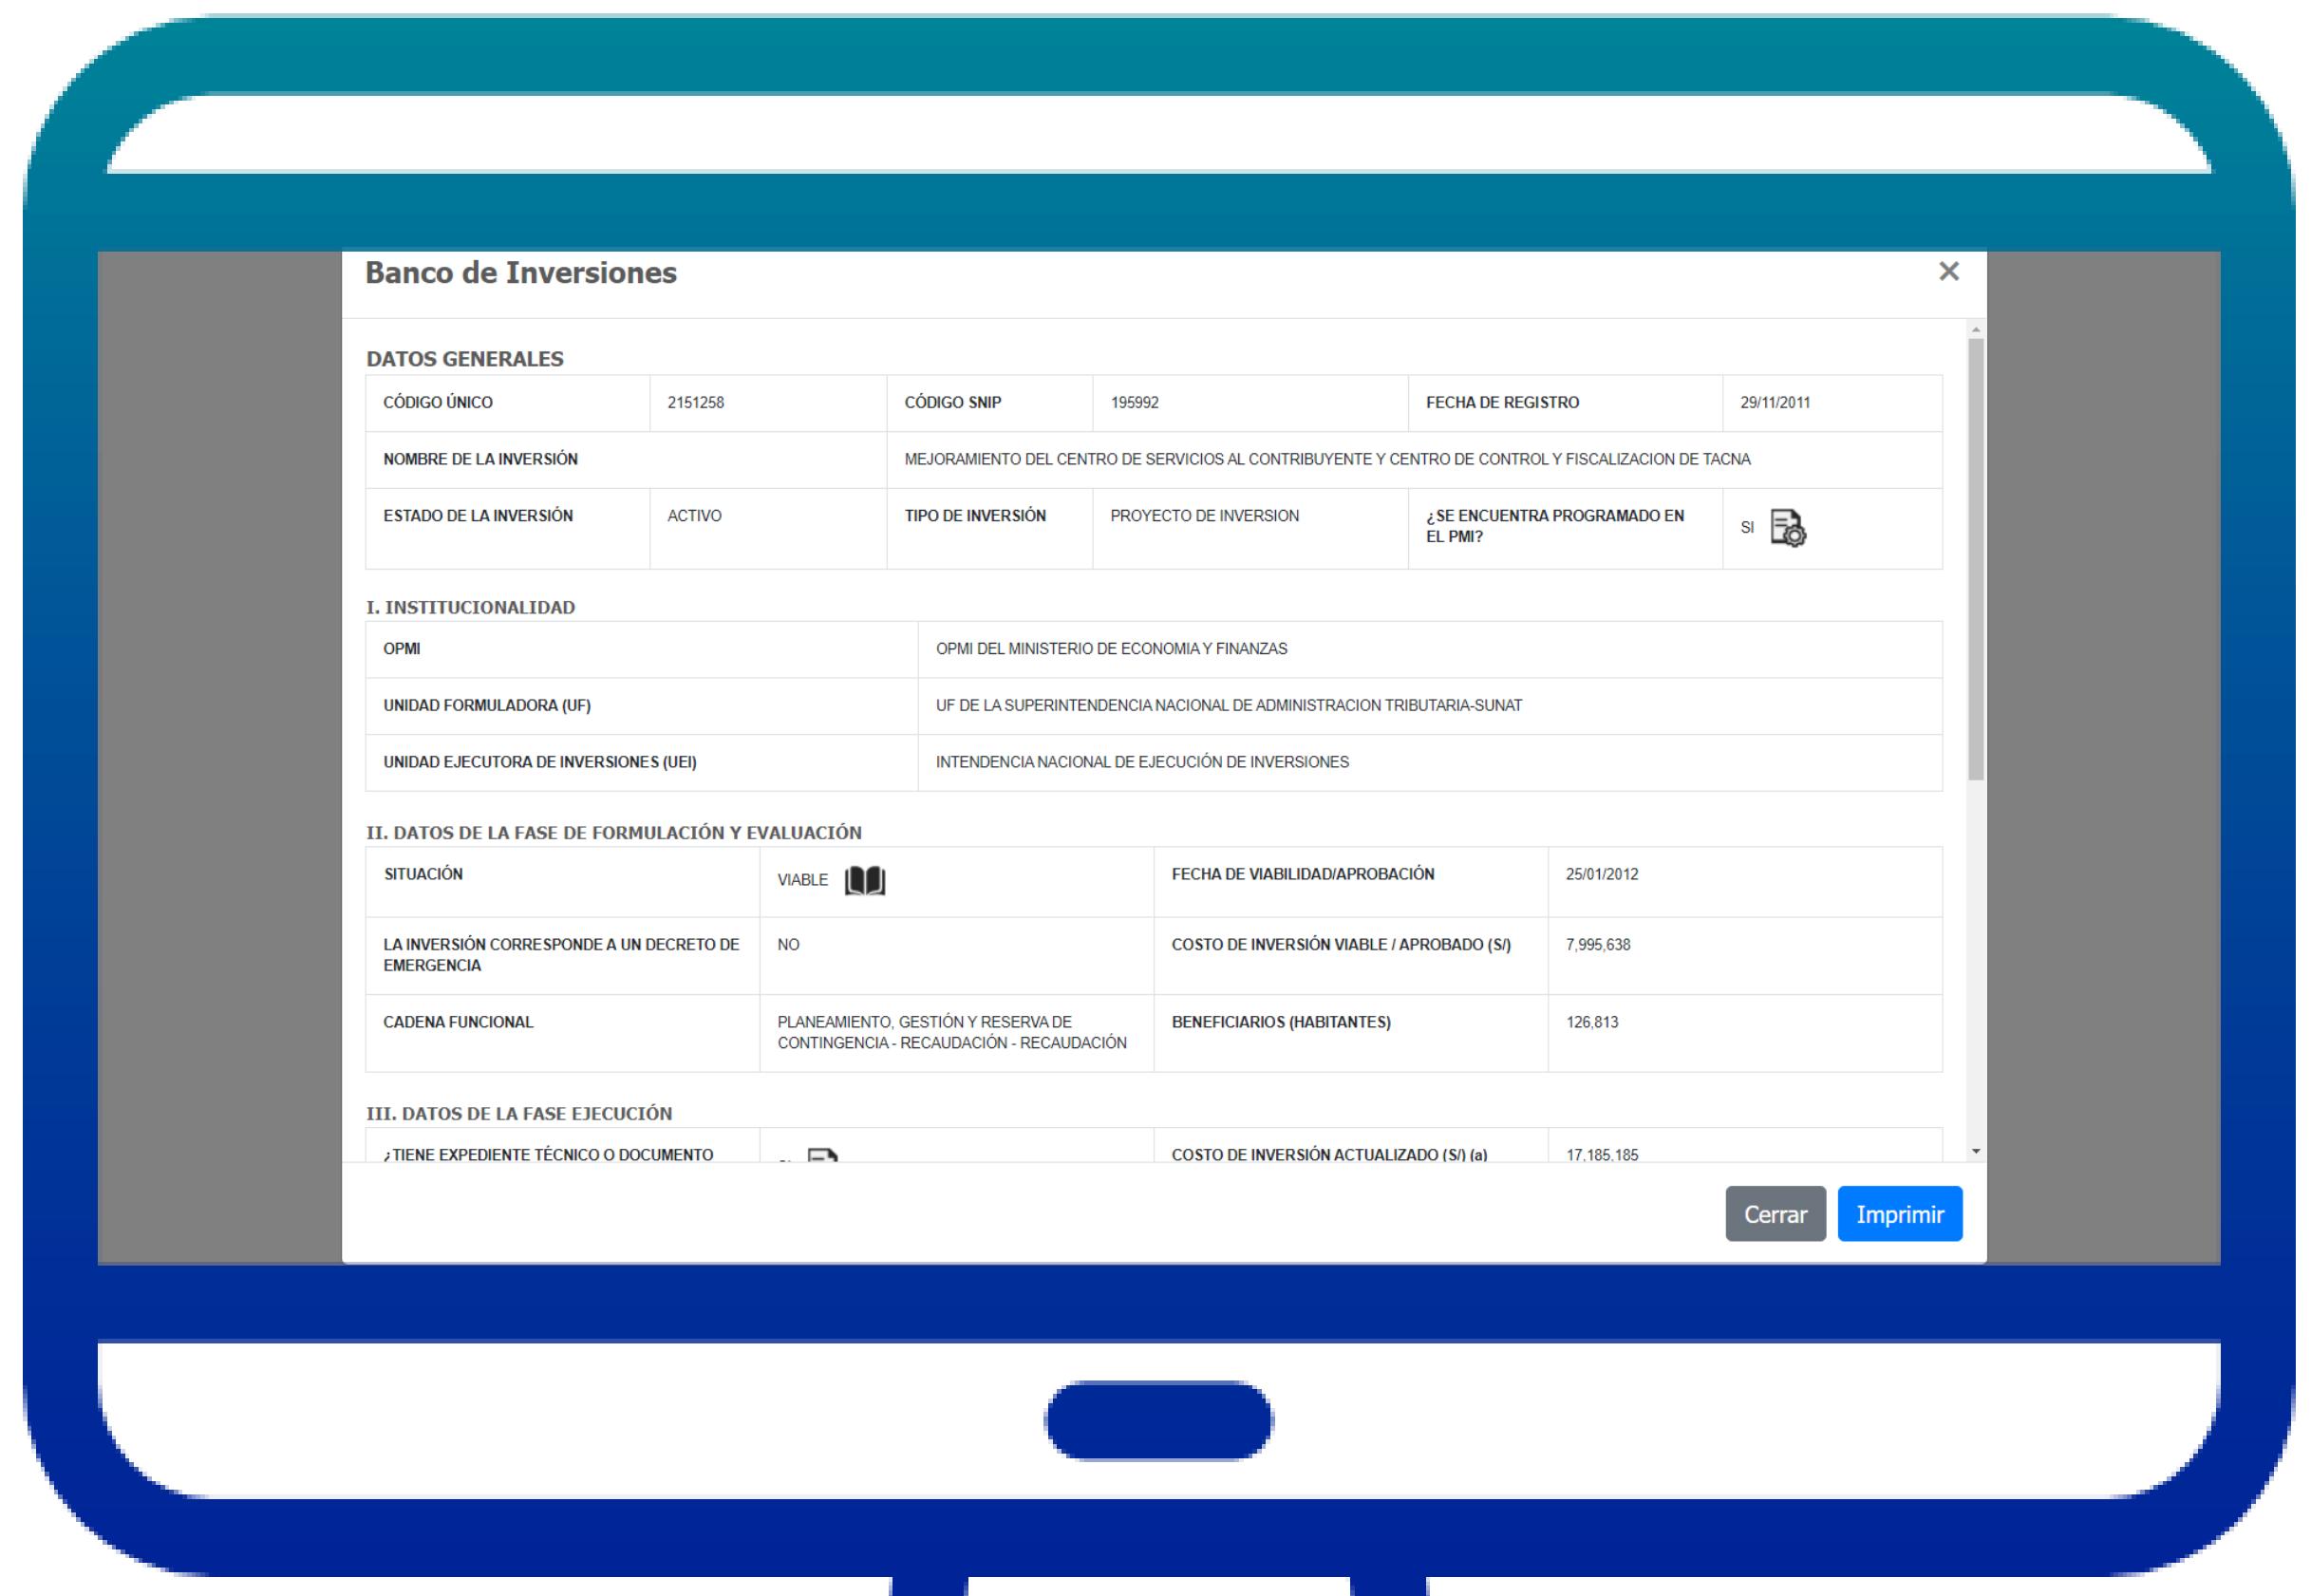

5. ESTRUCTURA



1. Datos generales

Contiene información del Banco de Inversiones sobre la Institucionalidad, la formulación y evaluación y la ejecución de la inversión, así como la convocatoria Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT (antes FONIPREL), de corresponder.

2. Ejecución financiera

Muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el avance de ejecución presupuestal del año e histórico del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), dicha información se presenta por unidad ejecutora presupuestal.

3. Contrataciones

Presenta información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de los contratos suscritos de acuerdo al objeto contractual (obras, servicios, bienes y consultorías de obras).

4. Infobras

Presenta información del contrato de obra y del avance físico por periodo de valorización por cada contrato registrado en Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) de la Contraloría General de la República.

5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

The screenshot shows the 'SSI' (Sistema de Seguimiento de Inversiones) web application. At the top left is the Peruvian flag and the text 'PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas'. To the right is the logo 'invierte.pe'. The main title 'SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES' is centered above a search bar with fields for 'Código' (SNIP) and 'Código Único de Inversiones', and a 'Buscar' button. A blue callout box labeled 'Datos generales' points to a circular icon containing a folder symbol, which is highlighted with a blue circle and a cursor icon. Below this are several status indicators: 'CÓDIGO ÚNICO' (212121), 'CÓDIGO SNIP' (195992), 'FECHA DE REGISTRO' (29/11/2011); 'NOMBRE DE LA INVERSIÓN' (MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA); 'ESTADO DE LA INVERSIÓN' (ACTIVO); 'TIPO DE INVERSIÓN' (PROYECTO DE INVERSIÓN); and a question '¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?' with the answer 'SI' and a gear icon. At the bottom, a section titled 'I. INSTITUCIONALIDAD' lists: 'OPMI' (OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS), 'UNIDAD FORMULADORA (UF)' (UF DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SUNAT), and 'UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)' (INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES).

5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

Descripción de subsección

Responsables del ciclo de inversión: OPMI, UF Y UEI

Información de la inversión de acuerdo a lo registrado en el formato de la fase de formulación y evaluación.

Información de la inversión de acuerdo a lo registrado en los formatos de la fase de ejecución.

Estado del concurso FONIPREL

CÓDIGO ÚNICO	2312139	CÓDIGO SNIP	349298	FECHA DE REGISTRO	29/02/2016
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MATACHOCO-CHECHE, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	S

I. INSTITUCIONALIDAD	
OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	
SITUACIÓN	VIABLE
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO
CADENA FUNCIONAL	SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO
	BENEFICIARIOS (HABITANTES)
	123

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN	
¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI
REGISTRO DE CIERRE	SÍ, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	22/07/2020
FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	16/02/2021
	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)
	3,326,500
	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)
	0
	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c)
	0
	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)
	3,326,500

IV. CONVOCATORIAS FONIPREL			
CONVOCATORIA	CONVOCATORIA FONIPREL 2017-I (CONCURSO REGULAR)	EXPEDIENTE	SOLI-2017-I-0212
PRESENTACIÓN	17/04/2017	PRIORIDAD	SANEAMIENTO - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
COSTO DE INVERSIÓN VIABLE (S/)	3,179,626	MONTO DEL CONFINANCIAMIENTO (S/)	3,169,626
EVALUACIÓN		GANADOR	SI

Botones con vínculos

1

2


3

4

5


5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:

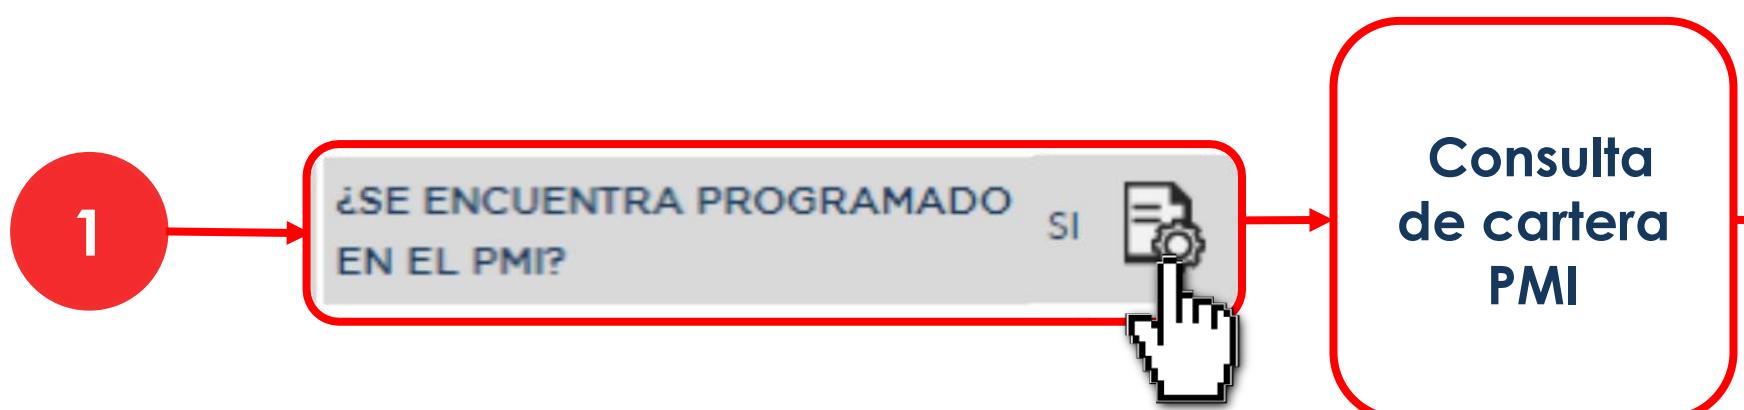

Banco de Inversiones
invierte.pe
Consulta de Cartera PMI
Criterios de búsqueda
Sector: SALUD
Código Único / Código Idea: 2354781
PBA84
Buscar, Borrar filtros, Exportar formato excel
Lista de resultados

Prioridad	Orden prelación (*)	Sector	OPMI	Nivel Gobierno	Código único	Código idea	Tipo de inversión	Nombre inversión	Costo actualizado (\$/)	Devengado acumulado (\$/) (al 31 dic. 2020)	Programación del monto de inversión (\$/)				
											PIM 2021 (\$/)	Monto año 2021 (\$/)	Monto año 2022 (\$/)	Monto año 2023 (\$/)	Monto año 2024 (\$/)
235	E	SALUD	OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD	GOBIERNO NACIONAL	2354781		PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAYA: DISTRITO DE ASCENSO, PROVINCIA DE HUANCAYA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYA	342,912,239.08	136,910,753.00	12,556,774.00	12,556,774.00	68,210,307.00	0.0	0.0

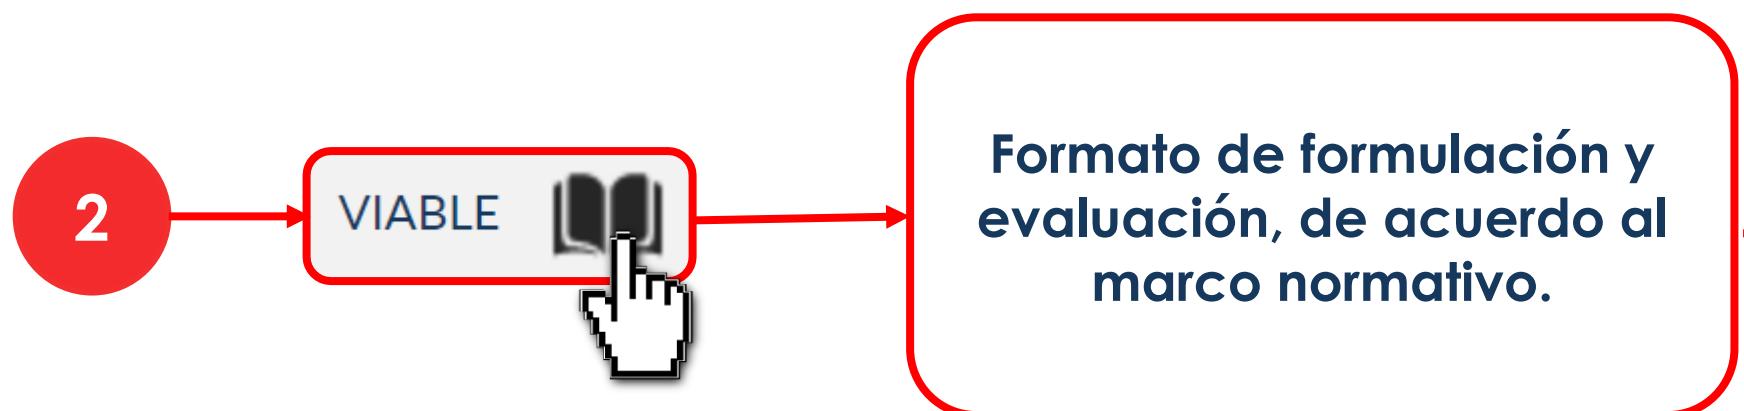

FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 17/09/2019 02:22:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/09/2019 09:38:08 p.m.
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Exportar PDF
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS Y EL APRENDIZAJE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LAS 9 PROVINCIAS DEL DE
Código único de inversiones: 2461806
El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función: 22 EDUCACIÓN
División funcional: 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional: 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable: EDUCACION
Tipología de proyecto: EDUCACIÓN SECUNDARIA

5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:

3

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?



SI

Formato de registro en la fase de ejecución

4



SI

Reporte del Formato N° 12-B

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución [Exportar PDF](#)

Fecha de registro 07/05/2018 02:34:26 p.m. Fecha de modificación: 09/02/2021 09:22:09 p.m.
ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Histórico de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	2151258
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Función	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
RECAUDACIÓN	RECAUDACIÓN	
RECAUDACIÓN	RECAUDACIÓN	
RECAUDACIÓN	RECAUDACIÓN	
..	..	

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE (CSC)	PORCENTAJE DE CSC EN CONDICIONES INADECUADAS	CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE	DEPARTAMENTAL	0.0090

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
..	..

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas [invierte.pe](#)

Fecha Últ. Modificación: 12/02/2021

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2151258	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
OPMI:	OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PMI AÑO 1 <2022>	108,858
		PMI AÑO 2 <2023>	0
		PMI AÑO 3 <2024>	0

2. FOTOGRAFÍAS

5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:



5.2. SECCIÓN: EJECUCIÓN FINANCIERA



5.2. SECCIÓN: EJECUCIÓN FINANCIERA


Descripción de subsección

Responsables del ciclo de inversión:
OPMI, UF Y UEI

Histórico del PIA, PIM, Certificación,
Compromiso anual y devengado de
toda la inversión.

Histórico del PIA, PIM, Certificación,
Compromiso anual y devengado por
Unidad Ejecutora Presupuestal y por
Fuente de Financiamiento.

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)	
COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	3,326,500
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	2,804,970
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	84.3 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	521,530
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	FEB-2019
PIM 2021 (c)	1,792,841
DEVENGADO 2021 (d)	1,271,309
AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	70.9 %
SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	521,532
FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	ENE-2021

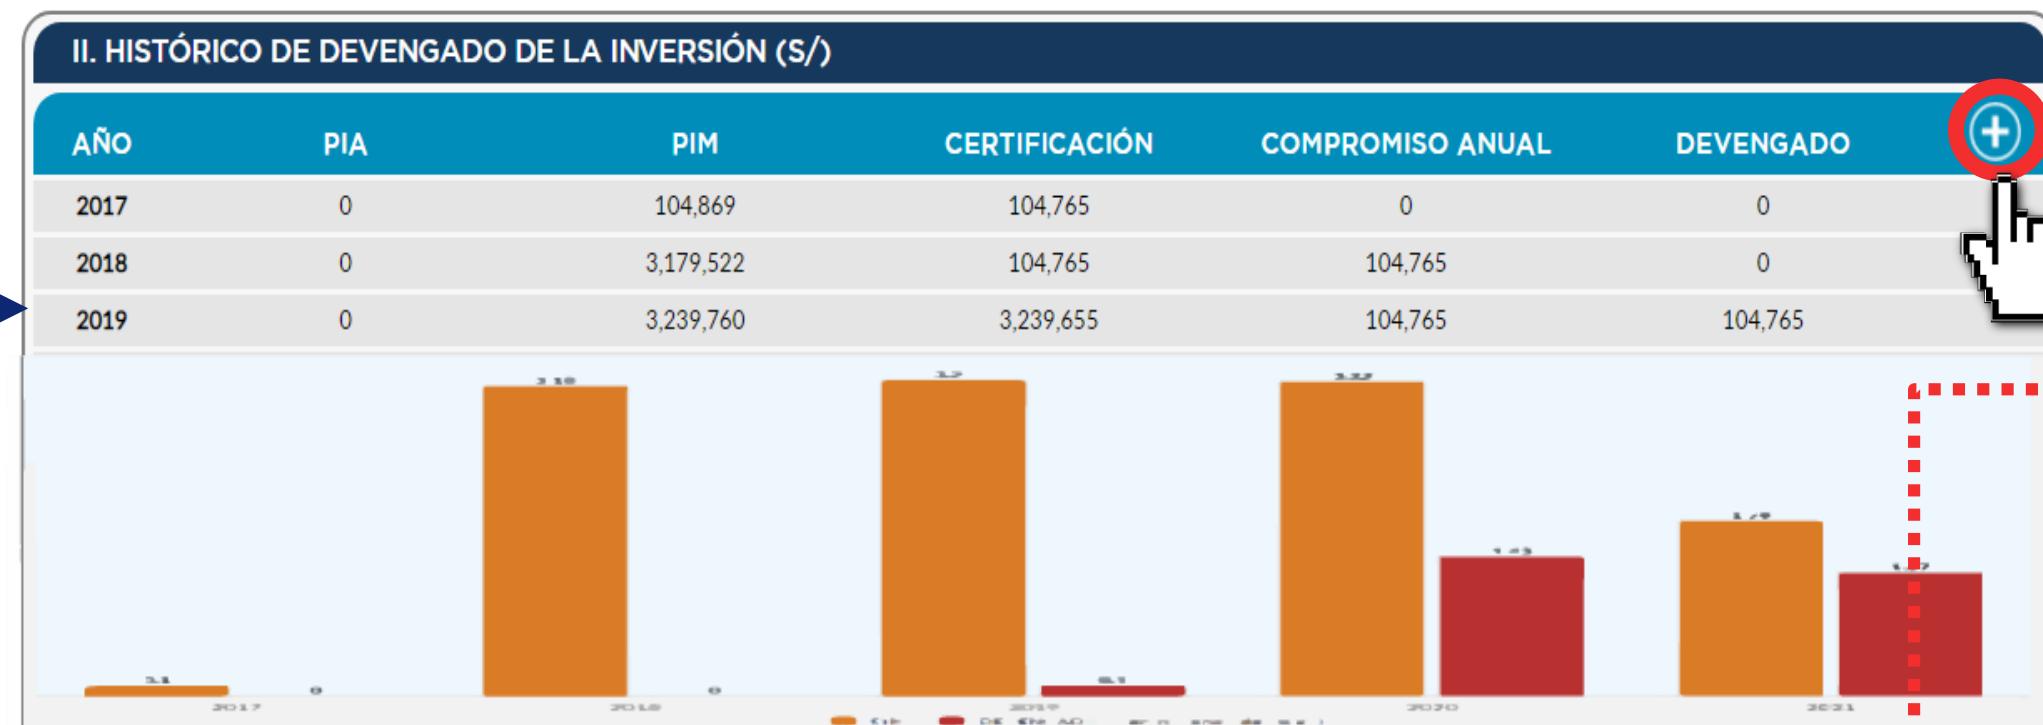

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)		
UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS	2,804,970	

Botones de
detalle


1

2

3


5.2. SECCIÓN: EJECUCIÓN FINANCIERA

En la sección “Ejecución Financiera” se muestra el siguiente detalle de los gastos financieros:



Devengado mensualizado
por año

Año	DEVENGADO MENSUALIZADO (S/)											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970	6,930
2013	0	0	0	0	1,604	6,792	12,925	7,764	454	3,500	8,720	0
2014	3,340	0	3,496	4,540	8,040	8,657	2,604	2,802	2,191	0	0	11,484
2015	3,330	4,584	23,057	4,259	0	0	153	63	0	11,210	6,160	20,270
2016	0	12,954	1,700	1,124	7,300	106	320	9,987	0	6,900	6,301	26,936
2017	0	2,235	3,950	25,530	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	431	28,153	25,481	111,339	38,279	51,509	24,084	0	0	239,783
2019	382,932	478,060	570,518	2,299,478	1,705,667	1,695,837	1,070,677	774,348	924,499	1,577,990	1,276,464	1,703,054
2020	338,033	472,722	18,723	0	0	227,297	0	21,603	7,888	0	245,545	38,964
2021	0	27,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Gasto presupuestal por
Fuente de financiamiento

FUENTE FINANCIERA	AÑO	INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)	
		PIM	DEV
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2012	312,762	9,900
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2013	130,000	40,175
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2014	138,424	47,074
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2015	211,552	72,979
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2016	173,654	73,627
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2017	1,036,851	31,535
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2018	5,257,149	519,059
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2019	14,464,639	14,459,525
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2020	1,410,359	1,370,775
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2021	451,678	27,578

5.2. SECCIÓN: EJECUCIÓN FINANCIERA

En la sección “Ejecución Financiera” se muestra el siguiente detalle de los gastos financieros:



INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)																	X
AÑO	PIA	PIM	DEV. ACUM.	DEVENGADO MENSUALIZADO												COMPROMISO ANUAL	CERTIFICACIÓN
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
2012	0	312,762	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970	6,930	0	0
2013	0	130,000	51,659	0	0	0	0	1,604	6,792	12,925	7,764	454	3,500	8,720	0	60,939	84,028
2014	7,285,738	138,424	98,813	3,340	0	3,496	4,540	8,040	8,657	2,604	2,802	2,191	0	0	11,484	18,194	2,306
2015	8,641,551	211,552	171,899	3,330	4,584	23,057	4,259	0	0	153	63	0	11,210	6,160	20,270	42,139	36,925
2016	2,183,372	173,654	245,526	0	12,954	1,700	1,124	7,300	106	320	9,987	0	6,900	6,301	26,936	77,704	77,704
2017	9,870,594	1,036,851	277,241	0	2,235	3,950	25,530	0	0	0	0	0	0	0	0	15,365	6,703,830
2018	10,763,776	5,257,149	796,300	0	0	431	28,153	25,481	111,339	38,279	51,509	24,084	0	0	239,783	147,412	1,026,386
2019	7,143,228	14,464,639	15,255,825	382,932	478,060	570,518	2,299,478	1,705,667	1,695,837	1,070,677	774,348	924,499	1,577,990	1,276,464	1,703,054	14,459,525	14,459,525
2020	3,000,000	1,410,359	16,626,600	338,033	472,722	18,723	0	0	227,297	0	21,603	7,888	0	245,545	38,964	1,494,999	1,494,999
2021	0	451,678	16,654,179	0	27,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,198	69,198

5.3. SECCIÓN: CONTRATACIONES



5.3. SECCIÓN: CONTRATACIONES

En la sección “Contrataciones” se muestran los contratos adjudicados asociados a la inversión registrados en el SEACE, de acuerdo al objeto contractual: obra, consultorías de obras, bienes y servicios.

Presenta la siguiente información de acuerdo al objeto contractual:

- Descripción de ítem
- Contratista
- Nº contrato
- Fecha de suscripción
- Monto contratado
- Monto contratado ítem total

I. OBRA						
Nº DE ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/)
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	Nº0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800
II. CONSULTORIA DE OBRA						
Nº DE ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/)
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	Nº0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800
III. SERVICIOS						
Nº DE ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/)
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	Nº0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800
IV. BIENES						
Nº DE ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/)
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCO	GUERREROS SUAREZ WUIDO	Nº0068-2019-MPT-SGA	05/06/2019	103,800	103,800

Botón de descarga del contrato suscrito



5.4. SECCIÓN: INFOBRAS

The screenshot shows the SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI) website. At the top left is the Peruvian flag and the text "PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas". To the right is the "invierte.pe" logo. The main title "SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES" is displayed prominently. Below the title is a search bar with the placeholder "Búsqueda por Código" and two radio buttons: "Código SNIP" and "Código Único de Inversiones", with the latter being selected. To the right of the search bar is a "Buscar" button and a "Vista Resumen" button. A large blue callout box labeled "Infobras" points to a circular icon containing a worker figure with a gear, which is highlighted with a blue circle and a cursor arrow. Below this icon is a table with project details:

CÓDIGO ÚNICO	2151258	CÓDIGO SNIP	195992	FECHA DE RECEPCIÓN	29/11/2011
NOMBRE DE LA INVERSIÓN		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL DE TACNA			
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI

Below the table is a section titled "I. INSTITUCIONALIDAD" with the following information:

OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SUNAT
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

5.4. SECCIÓN: INFOBRAS

Presenta la siguiente información de cada contrato:

I. OBRA 1						
1. DATOS GENERALES						
CÓDIGO INFOBRAS						
NOMBRE DE LA OBRA						
MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
UBICACIÓN DE LA OBRA						
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
ESTADO DE LA OBRA						
MONTO DE CONTRATO EN S./.		ADICIONALES-DEDUCTIVOS S./.				
PLAZO DE EJECUCIÓN (a)		AMPLIACIÓN DE PLAZO (b)		TIEMPO DE EJECUCIÓN (c=a+b)		
FECHA DE INICIO DE OBRA (d)		FECHA DE FIN DE OBRA (c+d)				
2. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA						
Nº	PERÍODO DE VALORIZACIÓN	FECHA DE REGISTRO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)		AVANCE VALORIZADO ACUMULADO (S/.)	
			PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL

Datos de la fase de ejecución contractual, desde la fecha de inicio hasta la fecha fin de la obra.

El avance físico programado y ejecutado (valorizado) acumulado de cada periodo.



Nueva sección

Capacitaciones Virtuales

Te presentamos las novedades para continuar desarrollando tus capacidades



Programación de Capacitaciones Virtuales

- Conoce los temas de las capacitaciones programadas para el mes en curso.
- Accede a los enlaces para ingresar al evento en línea y al espacio de para dejar tus consultas sobre el tema.



Capacitaciones Realizadas

- Accede a las grabaciones de las capacitaciones, conferencias y eventos, así como los materiales revisados durante su emisión.



Recursos de Aprendizaje

- Consulta los materiales de información de los diversos temas del ciclo de inversiones:

Programación Multianual de Inversiones (PMI),
Formulación y Evaluación (FyE), Ejecución y Funcionamiento.

¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos
a nivel nacional y agenda tu reunión
virtual.

CONECTA MEF

www.mef.gob.pe/conectamef



Muchas gracias

invierte.pe



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas
