



# **Mejoras en el registro de la ejecución física en el Formato N° 12-B y Reporte de Seguimiento**

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones



# **CONTENIDO**

## **I. SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA REESTRUCTURADA**

## **II. REPORTE DEL FORMATO N°12-B**


- A. Reporte de la sección Ejecución Física en el Formato N°12-B
- B. Reporte de la sección contrataciones en el Formato N°12-B  
(vinculación con el SEACE)



# I. SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA REESTRUCTURADA

# 1. INTRODUCCIÓN

Como parte de las mejoras en el Formato de Seguimiento, se encuentra habilitado la **sección reestructurada de ejecución física en el Formato N° 12-B, y el respectivo reporte, así como la vinculación Banco de Inversiones y SEACE**, con la finalidad de facilitar el seguimiento, trazabilidad y la transparencia de la información en la ejecución de inversiones.

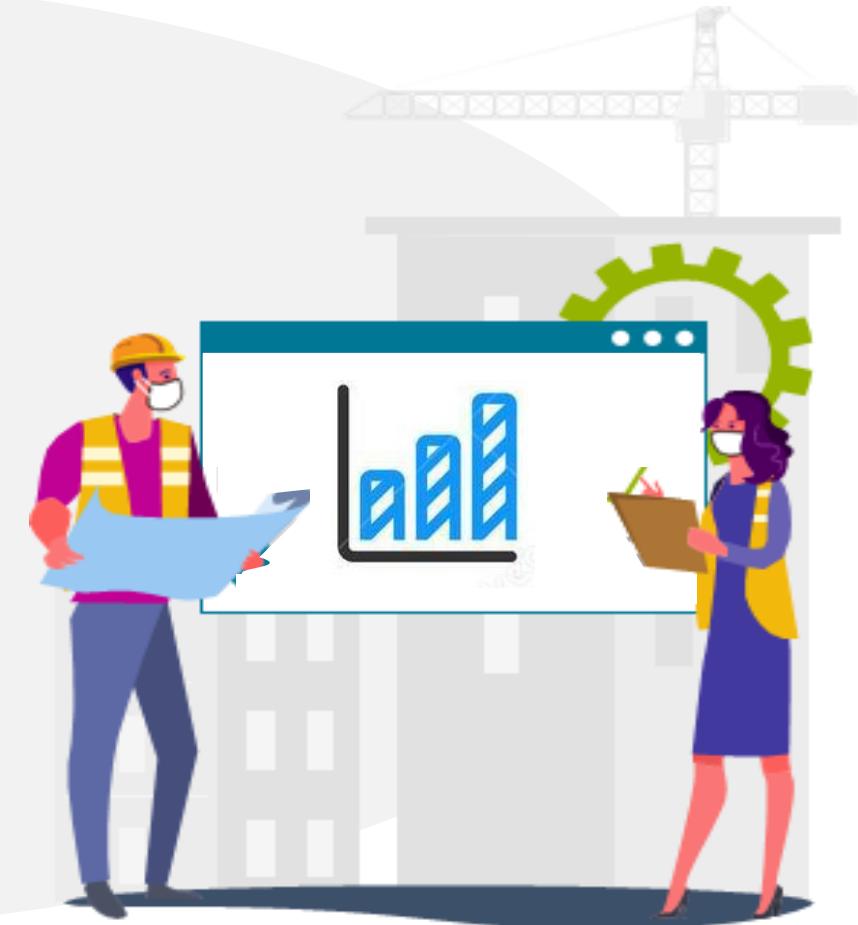


## 2. OBJETIVOS



**Facilitar el seguimiento, trazabilidad y la transparencia** de la información en la ejecución de inversiones



Realizar el seguimiento a la ejecución física a nivel de **etapas e hitos de obras, bienes y servicios de las diferentes modalidades de ejecución**



Realizar el seguimiento a las **modificaciones durante la ejecución física (plazos y montos) por objeto contractual**



**Detectar oportunamente riesgos y problemáticas** durante la ejecución física para las acciones respectivas



### 3. FUNCIONALIDADES



#### Seguimiento

- Permite registrar por etapas e hitos de las diferentes modalidades de ejecución (Administración Indirecta, Directa, Endeudamiento, OXI)



#### Cronogramas y avance físico

- Permite registrar el cronograma inicial y las modificaciones, así como las valorizaciones mensuales de la ejecución física.



#### Modificaciones del contrato

- La UEL podrá registrar las modificaciones del contrato (adicional, reducción, ampliación de plazo).



#### Vinculación con ET/DE

- Vinculación con los ET/DE de la sección Expediente Técnico del Formato N°12-B con la finalidad de contribuir el seguimiento transversal



#### Vinculación con el SEACE

- Vinculación de las fechas actualizadas de los procedimientos de selección y suscripción de contrato) para la modalidad Adm. Ind.
- Vinculación del modulo de ejecución contractual en el reporte del F12-B

# 4. SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B

## FASE DE EJECUCIÓN

### Elaboración de ET/DE

#### 1 Sección ET/DE

##### Inversión

Viable

Aprobado

Incorporado en el PMI



UEI



FORMATO  
N°12-B

##### A Descripción del ET/DE

Tipo de documento  
 Modalidad  
 Etapas e hitos

##### B Programación de fechas de hitos

Programación Inicial  
 Programación actualizada  
 Vinculación con el SEACE

#### 2 Sección Ejecución Física

### Ejecución Física

#### Reestructurada

##### A Descripción del seguimiento

Etapas e hitos  
 Programación

##### B Cronograma

Cronograma inicial  
 Cronograma modificado

##### C Avance físico y modificaciones

Valorizaciones  
 Riesgos  
 Problemática  
 Acciones a seguir

##### D Documentos de modificaciones

Adicional/Reducción  
 Ampliación de Plazo  
 Mayores Gastos  
 Generales  
 Mayores Metrados

#### 3 Sección Ejecución Financiera

Programada  
 Actualizada

#### 4 Sección Información de la inversión

Avance y situación de la inversión  
 Estimación de la inversión

Inicia el Registro del F12B, con la programación financiera.

## 5. SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA REESTRUCTURADA

A

Información general del seguimiento



Información general del seguimiento de obras, bienes y servicios a nivel de etapas e hitos

B


Cronograma



Información del plazo de ejecución física inicial y vigente

C

Información del avance físico

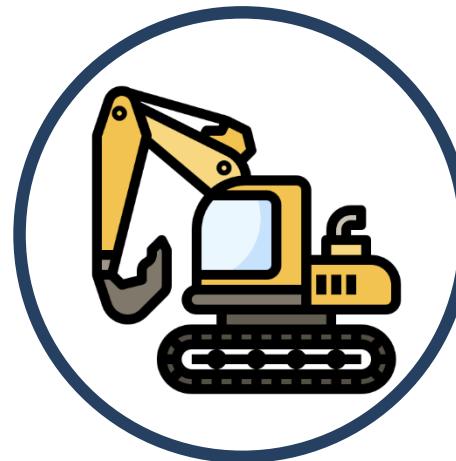

Información del avance físico de la obra programado y real

D

Información de modificaciones en ejecución física



Documentos aprobados de las modificaciones de la obra

## 5. SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA REESTRUCTURADA



A

### Información general del seguimiento

- Descripción
- Modalidad
- Objeto
- Tipo de Proceso, de corresponder
- Etapas (Actuaciones, Procedimientos de selección, ejecución física)
- Vinculación con tipo de factor productivo
- Vinculación con el ET/DE

# 5. SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA REESTRUCTURADA


B

## Cronograma

- Nombre del cronograma
- Fecha de inicio y termino
- Documento de sustento
- Periodo
- Avance acum. fisico (%)
- Avance acum. Soles (S/.)



# 5. SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA REESTRUCTURADA

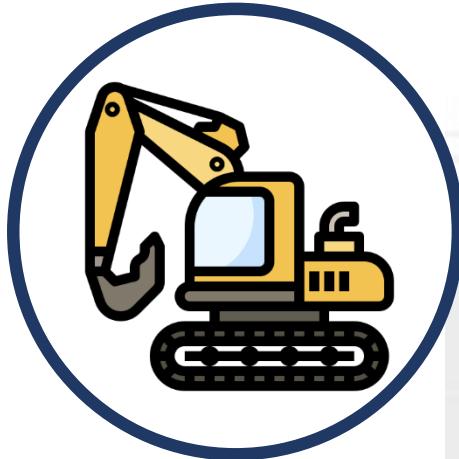

C

## Información del avance físico

- Periodo
- Valorizaciones:
  - contrato principal,
  - Adicionales,
  - Mayores Gastos Generales
  - Mayores Metrados
- Avance acum. Físico programado y real (%)
- Avance acum. Soles programado y real (S/.)
- Estado situacional, Riesgo, Problemática y Comentarios

## 5. SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA REESTRUCTURADA

D

### Información de modificaciones en ejecución física

- Adicionales,
- Ampliación de Plazo,
- Reducción,
- Mayores Gastos Generales,
- Mayores Metrados

- N° de aprobación
- Fecha de aprobación
- % aprobado respecto al contrato principal
- Monto de aprobación
- Documento de sustento



# 5. SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA REESTRUCTURADA

## CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE REGISTRAR



- Esta implementación regirá para las inversiones que inicien la fase de ejecución **a partir del 30 de abril del presente**, o aquellas que no presentan registro en la sección ejecución física.
- Las etapas e hitos están diseñados para cada modalidad de ejecución y objeto contractual.
- Los factores productivos y ET/DE que se visualizará en la sección ejecución física, proviene de la información registrada en el **Formato N°08** y **modulo de ET/DE** respectivamente.
- Para el caso de Bienes, servicios y consultorías el seguimiento se debe realizar por entregables.

# 5. SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA REESTRUCTURADA

## ESTRUCTURA DE REGISTRO



**SOBRE MODIFICACIONES**

1. Adicional/Deductivo
2. Reducción
3. Ampliaciones de Plazo
4. Mayores Gastos Generales
5. Mayores Metrados

**SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL**

1. Cronograma de Obra
2. Avance Físico
3. Valorizaciones\*\*

**PROCESO DE REGISTRO EJECUCIÓN FÍSICA**

Actuaciones Preparatorias  
Procedimiento de Selección  
Ejecución Física

**Seleccionar etapa**

(1) Las fechas actualizadas de los procedimientos de selección y suscripción de contrato provienen de la vinculación con el SEACE

\*Registrar las fechas programadas en cada Hito y las fechas actualizadas, de corresponder

\*\* Valorizaciones de las modificaciones contractuales (Adicionales, Mayores Gastos Generales, Mayores Metrados)



## **II. REPORTE DEL FORMATO N°12-B**

- A. Reporte de la sección Ejecución Física en el Formato N°12-B
- B. Reporte de la sección contrataciones en el Formato N°12-B (vinculación con el SEACE)

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

Brinda información actualizada de la ejecución física de las inversiones a nivel de etapas e hitos de obras, bienes, servicios y consultorías de las diferentes modalidades de ejecución, así como a las modificaciones contractuales.

**SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:**

- 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN**

CÓDIGO ÚNICO:	CL5155	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
OPML:	OPML DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANCIAS	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PMI AÑO 1 <2022>	105.855
OPML:	OPML DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANCIAS	PMI AÑO 2 <2023>	0
UEI:	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PMI AÑO 3 <2024>	0
- 2. FOTOGRAFÍAS**
- 3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN**

<b>FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA</b>	<b>VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/MM)</b>
INICIO: 09/11/2018 CULMINACIÓN: 21/12/2020	AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (I) 99.5% AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (I) 100%
	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 8 MM EN-2012 APROBACIÓN DEL 1er ET/DE 13.9 MM EN-2014 ULTIMA MODIFICACIÓN 17.2 MM FEB-2021 Variación Porcentaje (%)



**EJECUCIÓN FÍSICA**

Código Único: 2310861	Tipo de Inversión: PIP MAYOR (SNIP)
Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

**OBRAS : 22**

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapa - Hito	Ver
1	09/04/2021	OBRA 1_	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			
2	26/04/2021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			

**BIENES : 2**

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapa - Hito	Ver
1	26/04/2021	BIENES PARA VER COLUMNA AVANCE FÍSICO	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA		
2	03/03/2021	AIIND	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA		


**SERVICIOS : 2**

Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapa - Hito	Ver
1	26/04/2021	seguimiento a la obra de carretera oyón ambo de la provincia de pucará del departamento de cusco moquegua	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA		
2	09/04/2021	BIENES	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	CONCURSO PÚBLICO		

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## a. Acceso

- 1 Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF” y seleccionar la primera opción
- 2 Presionar el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
- 3 Digitar el Código Único de inversión y dar clic en “buscar”.

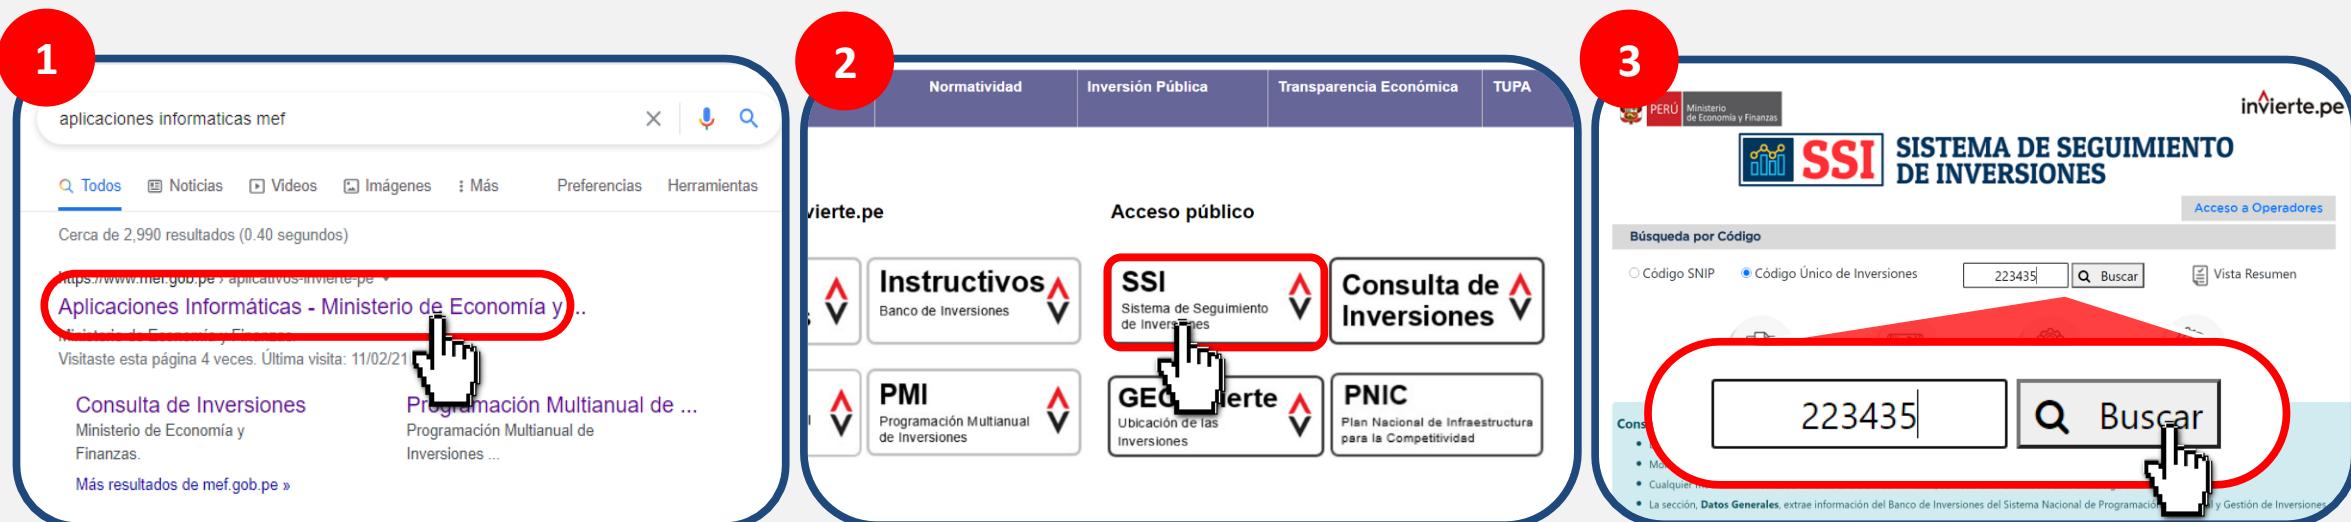

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## a. Acceso

- 4 En la sección “Datos de la fase de ejecución” presionar el icono 
- 5 En el Reporte de seguimiento presionar la pestaña de ejecución física.
- 6 Se redireccionará al modulo de ejecución física

4

DECRETO DE EMERGENCIA			APROBADO (S/)		
CADENA FUNCIONAL		TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS NACIONALES	BENEFICIARIOS (HABITACIÓN)		
<b>III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN</b>					
¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)			
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)			
REGISTRO DE CIERRE	NO 	MONTO DE CARTA FIANZA (c)			
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	10/09/2018	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	25/12/2020	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)	
Consideraciones:					

5

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
2310861	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
REGISTRO DE CIERRE:	TIPO DE PROCESO:	TIPO DE PROCESO
NO	OPRA 1...	OPRA 1...
PMI AÑO 1 <2022>	ETAPA - HITO	ETAPA - HITO
0		

6

EJECUCIÓN FÍSICA

Código Único:		Tipo de Inversión:		Modalidad de Ejecución:	
2310861		PIP MAYOR (SNIP)		ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	
<b>OBRAS :</b> 22					
Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de Proceso	Etapa - Hito
1	09/04/2021	OPRA 1...	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
2	26/04/2021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
<b>Bienes :</b> 2					
Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de Proceso	Etapa - Hito
1	26/04/2021	Bienes para ver columna avance físico	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA	
2	03/03/2021	A1IND	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA	

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## b. Módulo de Ejecución Física

6

### EJECUCIÓN FÍSICA

#### Datos generales

- Código único de Inversión
- Nombre de la inversión
- Tipo de Inversión
- Modalidad de ejecución de la inversión

Código Único:	2310861	Tipo de Inversión:	PIP MAYOR (SNIP)			
Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO					
<b>OBRAS : 24</b>						
Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapa - Hito	Ver
17	16/04/2021	AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL - SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
24	12/04/2021	ENDEUDAMIENTO	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - Endeudamiento	REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA)	ACTUACIONES PREPARATORIAS - APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	
<b>BIENES : 2</b>						
Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapa - Hito	Ver
1	26/04/2021	BIENES	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA		
<b>SERVICIOS : 2</b>						
Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapa - Hito	Ver
1	26/04/2021	seguimiento a la obra de carretera oyon ambo de la provincia de pucara del departamento de cusco moquegua	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA		
2	09/04/2021	SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	CONCURSO PÚBLICO		

#### Seguimientos registrados ordenados por objeto contractual

- Fecha de registro
- Descripción del seguimiento
- Modalidad de ejecución
- Tipo de proceso
- Etapa-Hito
- Ver detalle

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## b. Módulo de Ejecución Física

- 7 Para visualizar la información del avance físico y las modificaciones de estas, deberá presionar en “ver detalle” 

EJECUCION FISICA					
Código Único:	2310861	Tipo de Inversión:	PIP MAYOR (SNIP)		
Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA		
OBRAS : 24					
Item	Fecha de Registro	Descripción	Modalidad de Ejecución	Tipo de proceso	Etapa - Hitos
17	16/04/2021	AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	LICITACIÓN PÚBLICA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL - SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
24	12/04/2021	ENDEUDAMIENTO	ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento	REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA)	ACTUACIONES PREPARATORIAS - APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

**IMPORTANTE:**  
Para el objeto contractual de Obras se visualizara las siguientes secciones:

- ✓ Hitos
- ✓ Avance físico
- ✓ Cronograma
- ✓ Modificaciones contractuales
- ✓ Ampliación de plazo

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## b. Módulo de Ejecución Física

- 8 Se visualizara la ventana con información específica del objeto contractual, para ello se dispone de 5 secciones (Hitos del objeto, avance físico, cronograma, modificaciones contractuales y ampliación de plazo).

8

### EJECUCION FISICA

Código Único:	2310861	Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO
Descripción del seguimiento:	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA	Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
Objeto:	OBRAS - CONTRATA	Tipo de proceso:	LICITACIÓN PÚBLICA

**Secciones para el objeto obras**

**Datos generales del objeto contractual**

- Código único de inversión
- Nombre inversión de la
- Descripción seguimiento del
- Modalidad ejecución de
- Objeto contractual
- Tipo de proceso

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## c. Módulo de ejecución física

9

HITOS DEL OBJETO

### Hitos del objeto contractual

En esta sección podremos encontrar información de las etapas, hitos, fecha programada y actualizada, estado y comentarios registrados por la UEI.

9

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA ACTUALIZADO


MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

#### ETAPAS - HITOS

Etapas	Hitos	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentarios
ACTUACIONES PREPARATORIAS	REQUERIMIENTO CON ET APROBADO	08/01/2016	15/01/2016	SOLICITADO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONVOCATORIA	16/04/2016	21/09/2018		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	INTEGRACIÓN DE LAS BASES	20/05/2016	19/12/2018		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	25/06/2016	28/12/2018		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01/08/2021	16/06/2016		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	INICIO DE OBRA	19/08/2021	16/07/2020	INICIADO	
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CULMINACIÓN DE OBRA	02/09/2021	11/11/2021	RECEPCIONADA	
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	LIQUIDACIÓN	10/11/2021		CON LIQUIDACIÓN CONSENTIDA	

Programación y las fechas actualizadas por hito

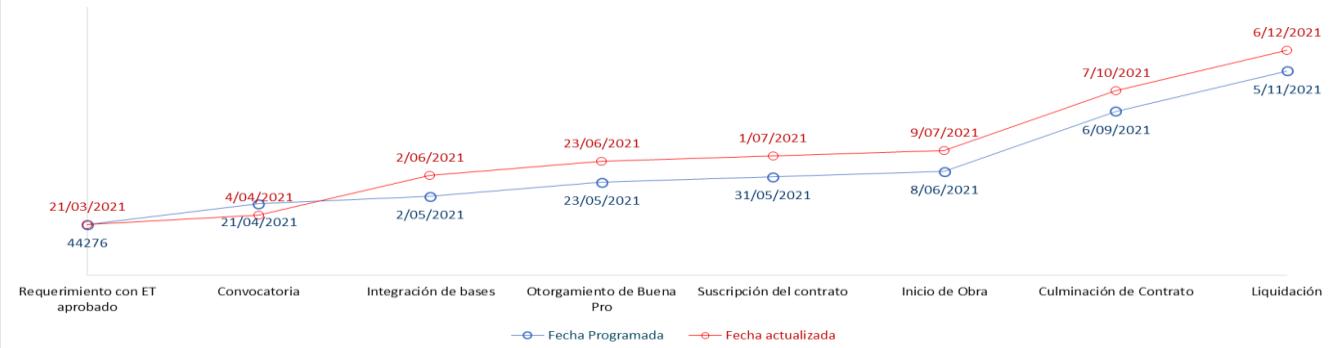

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## c. Módulo de ejecución física

10

AVANCE FÍSICO

### Avance físico

Esta sección brinda información registrada por la UEI sobre valorizaciones (principal, adicional, mayores gastos generales y mayores metrados), el estado situacional, comentarios y riesgos/problemáticas asociados al periodo.

Del mismo modo, se puede realizar descargas de las valorizaciones y fotografías.

10

RESUMEN DE VALORIZACIONES										
Periodo (año-mes)	Obra Principal				Adicional	Mayores Metrados	Mayores Gastos Generales	Estado Situacional	Comentarios	Ver riesgos y Problemáticas
	Programado Acumulado		Real Acumulado							
	(%)	(S/)	(%)	(S/)	Aprobado Acumulado	(S/)	(S/)	(S/)		
2021-10	96.53%	14,468,103.45	90.35%	13,541,379.02	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		
2021-09	92.27%	13,828,610.81	84.37%	12,645,115.09	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-08	88.28%	13,231,374.11	82.83%	12,414,304.64	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-07	78.55%	11,773,431.49	74.81%	11,212,291.8	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
<u>2021-06</u>	65.68%	9,843,530.1	63.13%	9,461,729.47	0.00	0.00	350,000.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-05	53.79%	8,061,219.48	49.76%	7,457,875.15	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		
2021-04	41.14%	6,166,534.00	43.28%	6,486,672.76	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-03	31.72%	4,753,433.85	35.23%	5,280,163.62	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-02	25.88%	3,878,511.51	26.62%	3,989,723.4	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática
2021-01	18.95%	2,839,540.39	20.76%	3,111,444.7	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		No se identifica Riesgo/Problemática

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## c. Módulo de ejecución física

- 11 Para ver el detalle del Adicional, Mayores gastos Generales y Mayores metrados, dar clic en el periodo.

HITOS DEL OBJETO		AVANCE FÍSICO		ESTADO ACTUALIZADO		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		AMPLIACIÓN DE PLAZO		
RESUMEN DE VALORIZACIONES										
Periodo (año-mes)	Obra Principal			Adicional	Mayores Metrados	Mayores Gastos Generales	Estado Situacional	Comentarios	Ver riesgos y Problematiques	
	Programado Acumulado		Real Acumulado							Aprobado Acumulado
	(%)	(S/)	(%)	(S/)						(S/)
2021-10	97.00%	14,468,103.00	90.00%	13,541,379.00 	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		
2021-09	92.00%	13,828,611.00	84.00%	12,645,115.00 	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		
2021-08	88.00%	13,231,374.00	83.00%	12,414,305.00 	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)		
2021-07	79.00%	11,773,431.00	75.00%	11,212,292.00 	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		
<a href="#"><u>2021-06</u></a>	65.00%	9,843,530.00	63.00%	9,461,729.00 	0.00	0.00	350,000.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		
2021-05	54.00%	8,061,219.00	50.00%	7,457,875.00 	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)		

**10** 

**11**

ADICIONAL						
Periodo	Programado Acumulado		Real Acumulado		Número de modificación	Comentarios
	(%)	(S/)	(%)	(S/)		
2020-01	1.00 %	3.00	2.00 %	4.00 	DEDUCTIVO N° 15	
2020-01	100.00 %	100.00	100.00 %	100.00 	ADICIONAL DE OBRA N° 1	

MAYORES METRADOS				
Periodo	Monto Acumulado (S/)		Número de modificación	Comentarios
2020-01	80.00 		MAYORES METRADOS N° 1	
2020-01	100.00 		MAYORES METRADOS N° 10	

MAYORES GASTOS GENERALES				
Periodo	Monto Acumulado (S/)		Número de modificación	Comentarios
2020-01	100,000,000.00 		MAYORES GASTOS GENERALES N° 2	
2020-01	15.00 		MAYORES GASTOS GENERALES N° 3	

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## c. Módulo de ejecución física


12 Para visualizar la valorización y fotografía registrada, dar clic en   respectivamente

10

12



Periodo (año-mes)	Obra Principal			Aprobado Acumulado	Mayores Metrados	Mayores Gastos Generales	Estado Situacional	Comentarios	Ver riesgos y Problemáticas
	Programado		Real Acumulado						
	(%)	(S/.)	(S/.)						
2021-10	97.00%	14,468,103.00	13,541,379.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < 5% - 20%		

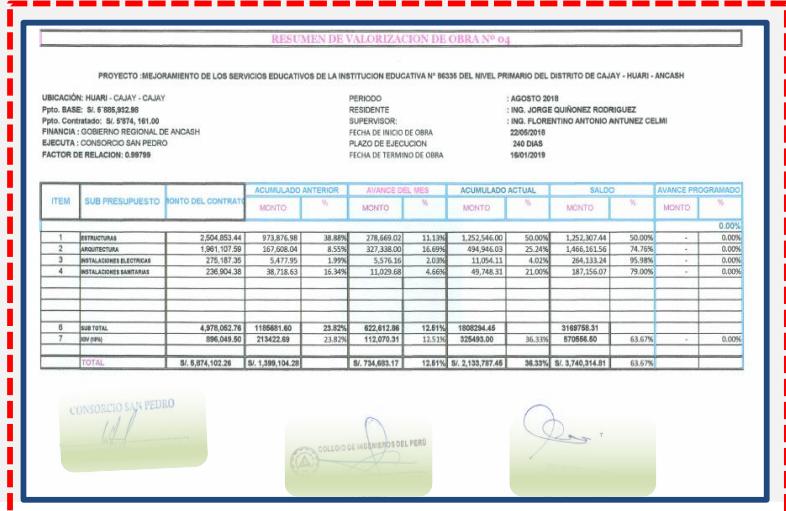

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 04

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86335 DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH

UBICACION: HUARI - CAJAY PERÍODO: AGOSTO 2018

Ppto. BASE: S/ 1,885,932.88 RESIDENTE: ING. JORGE QUIRÓNEZ RODRÍGUEZ

Ppto. Contratado: S/ 1,974,161.00 SUPERVISOR: ING. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI

FINANCI: GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH FECHA DE INICIO DE OBRA: 22/05/2018

EJECUTA: CONSORCIO SAN PEDRO PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DIAS

FECHA DE TERMINO DE OBRA: 19/07/2019

FACTOR DE RELACION: 0.99799

ITEM	SUB PRESUPUESTO	BONITO DEL CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE DEL MES	ACUMULADO ACTUAL	SALDO	AVANCE PROGRAMADO	
			MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
1	RESTRUCTURA	2,504,883.44	973,876.98	38.48%	278,649.02	11.19%	1,252,946.00	50.00%
2	ARQUITECTURA	1,961,107.59	167,608.04	8.55%	327,338.00	16.69%	494,946.03	25.24%
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	275,187.35	5,477.95	1.99%	5,576.16	2.03%	11,054.11	4.02%
4	INSTALACIONES SANITARIAS	236,904.38	38,718.63	16.34%	11,029.68	4.66%	49,748.31	21.00%
5							187,156.07	79.00%
6	SUB TOTAL	4,970,063.76	118,688.60	23.82%	822,612.86	12.61%	1808294.49	50.00%
7	99% BONO	996,049.50	213,422.69	23.82%	112,070.31	12.51%	325495.00	36.33%
TOTAL		S/ 5,974,102.26	S/ 1,399,104.29		S/ 734,005.17	13.61%	S/ 2,130,787.48	36.33%
							S/ 3,746,314.81	63.67%

CONSORCIO SAN PEDRO 

COLLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 





# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## c. Módulo de ejecución física

13 Para ver el riesgo/problemática presionar el icono



RESUMEN DE VALORIZACIONES								
Periodo (año-mes)	Obra Principal			Adicional		Mayores Metrados	Mayores Gastos Generales	Estado Situacional
	Programado Acumulado		Real Acumulado		Aprobado Acumulado			
	(%)	(S/)	(%)	(S/)	(S/)			
2021-10	97.00%	14,468,103.00	90.00%	13,541,379.00  	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)
2021-09	92.00%	13,828,611.00	84.00%	12,645,115.00  	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)
2021-08	88.00%	13,231,374.00	83.00%	12,414,305.00  	0.00	0.00	0.00	CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)
2021-07	79.00%	11,773,431.00	75.00%	11,212,292.00  	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)
2021-06	66.00%	9,843,530.00	63.00%	9,461,729.00  	0.00	0.00	350,000.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)
2021-05	54.00%	8,061,219.00	50.00%	7,457,875.00  	0.00	0.00	0.00	CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)

RIESGOS Y/O PROBLEMÁTICAS		
Periodo	Riesgo/Problemática	
2021-10	Problemática	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
	Ambito	FACTORES EXTERNOS
	Descripción	DEMORA EN LLEGADA DE ASCENSOR
	Medidas de mitigación	MONITOREAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN
	Entidad Responsable	GOBIERNO REGIONAL
	Comentarios	GR INFRAESTRUCTURA MONITOREAR ADQUISICIÓN

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## c. Módulo de ejecución física

14

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

### Cronograma actualizado

Esta sección brinda información registrada por la UEI sobre los cronogramas de la obra (descripción, fecha de inicio, fecha de término, la descarga del cronograma y un enlace para ver el detalle del cronograma).

14

CRONOGRAMA ACTUALIZADO



# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## c. Módulo de ejecución física

15

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

### Modificaciones contractuales

Esta sección brinda información de:

- A. Resumen de las modificaciones durante la ejecución contractual.
- B. El detalle de las modificaciones aprobadas, las causales, fecha de aprobación, % de aprobación respecto al contrato principal, Monto en soles y la descarga de documentos.

15

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

RESUMEN		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		AMPLIACIÓN DE PLAZO	
Nº DE ADICIONALES/DEDUCTIVOS :	1	MONTO TOTAL DE ADICIONAL/DEDUCTIVO :	1,500,000.00		
Nº DE REDUCCIONES :	0	MONTO TOTAL DE REDUCCIONES :	0.00		
Nº DE MAYORES GASTOS GENERALES :	1	MONTO TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES :	125,000.00		
Nº DE MAYORES METRADOS :	1	MONTO TOTAL DE MAYORES METRADOS :	15,000.00		
ADICIONALES/DEDUCTIVOS					
Nº adicional	Tipo de adicional/Deductivo	Causales	Fecha de Aprobación	% respecto al contr. principal	Monto S/
1	ADICIONAL DE OBRA	POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	27/08/2020	15.00 %	1,500,000.00
Descarga del documento aprobado					
MAYORES GASTOS GENERALES					
Nº de Mayores Gastos Generales	Fecha de Aprobación		Monto S/	Descarga	
2	09/04/2021		125,000.00	PDF	
MAYORES METRADOS					
Nº de Mayores Metrados	Fecha de Aprobación		Monto S/	Descarga	
1	10/12/2020		15,000.00	PDF	

# A. REPORTE DE LA SECCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA

## c. Módulo de ejecución física

16

AMPLIACIÓN DE PLAZO

### Ampliación de plazo

Esta sección brinda información de:

- A. Resumen de las ampliaciones de plazo.
- B. Detalle sobre las ampliaciones aprobadas, causales, fecha de aprobación, N° de días, fecha de término, nueva fecha de término y la descarga de documentos.

16

AMPLIACIÓN DE PLAZO



RESUMEN						
HITOS DEL OBJETO	AVANCE FÍSICO	CRONOGRAMA ACTUALIZADO	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	AMPLIACIÓN DE PLAZO		
Nº DE AMPLIACIONES:	6		FECHA DE INICIO (b):		17/03/2021	
Nº TOTAL DE DIAS (a):	51		FECHA DE TERMINO (c):		21/04/2021	
PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE EN DIAS ((c-b) + a):	86		NUEVA FECHA DE TERMINO:		01/05/2021	
AMPLIACIONES DE PLAZO						
Nº de ampliación	Causales		Fecha de Aprobación	Nº de días	Fecha de término	Nueva fecha de término
52	OTROS		17/03/2021	10	20/03/2021	29/03/2021
49	ATRASOS Y/O PARALIZACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRESTACIONES POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD		17/03/2021	1	20/03/2021	20/03/2021
53	OTROS		17/03/2021	10	20/03/2021	30/03/2021
51	CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL		17/03/2021	10	20/03/2021	29/03/2021
54	ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA		20/03/2021	10	20/03/2021	30/03/2021
59	CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL		21/04/2021	10	21/04/2021	01/05/2021



## **II. REPORTE DEL FORMATO N°12-B**

- A. Reporte de la sección Ejecución Física en el Formato N°12-B
- B. Reporte de la sección contrataciones en el Formato N°12-B (vinculación con el SEACE)

# B. REPORTE DE LA SECCIÓN CONTRATACIONES

En esta sección se podrá encontrar información detallada sobre los procedimientos de selección y contratos asociados a la inversión, ordenados por objeto contractual (obras, bienes, servicios y consultorías), así como a las modificaciones contractuales.

**REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN**

CÓDIGO ÚNICO:	015155	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FOCALIZACIÓN DE TACNA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATO
OPML:	OPAC DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANCIAS	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PMI AÑO 1 <2022>	105.855
OPML:	OPAC DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANCIAS	PMI AÑO 2 <2023>	0
UEI:	INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	PMI AÑO 3 <2024>	0

**2. FOTOGRAFÍAS**

**3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN**

**FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

INICIO:	09/11/2018
CULMINACIÓN:	21/12/2020

**AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (%)**

**AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (%)**

**VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/MM)**

FECHA	VARIACIÓN (\$/MM)	PERCENTAJE (%)
08-2012	8 MM	
08-2014	13.9 MM	
08-2021	17.2 MM	

**CONTRATACIONES**

Código Único	Nombre de la Inversión	Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución
2015918	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ	PIP MAYOR (SNIP)	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATO

**PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN** [\[Excel\]](#)

**EJECUCIÓN CONTRACTUAL** [\[Excel\]](#)

● Continuidad en el procedimiento    ● Con modificación en el cronograma    ● Sin continuidad en el procedimiento

**OBRAS :** 3

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (\$/.)	Ver Detalle
Adjudicación Simplificada	AS-SM-25-2016-MTC/20-1	Servicio de Implementación de Monitoreo Arqueológico, PMA, Proyecto Integral Vial Tacna - La Paz, Tramo Tacna - Colpa, Sub Tramo Km. 146+180-KM 187+404	1	18/07/2016	Contratado	230,183	<a href="#">[Calendario]</a>

**BIENES :** 5

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (\$/.)	Ver Detalle
Adjudicación Simplificada	AS-SM-26-2016-MTC/20-1	Servicio de Implementación de Monitoreo Arqueológico, PMA, Proyecto Integral Vial Tacna - La Paz, Tramo Tacna-Colpa, Sub Tramo Km. 143+610-KM 94+000	1	18/07/2016	Contratado	223,929	<a href="#">[Calendario]</a>


**SERVICIOS :** 3

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (\$/.)	Ver Detalle
Adjudicación Simplificada	AS-SM-27-2016-MTC/20-1	Servicio de Implementación de Monitoreo Arqueológico PMA Proyecto Integral Vial Tacna - La Paz, Tramo Tacna-Colpa, Sub Tramo KM 94+000-KM 144+262.38	1	18/07/2016	Contratado	117,879	<a href="#">[Calendario]</a>	

# B. REPORTE DE LA SECCIÓN CONTRATACIONES



## VINCULACIÓN DEL BANCO DE INVERSIONES Y SEACE (I Y II ETAPA)

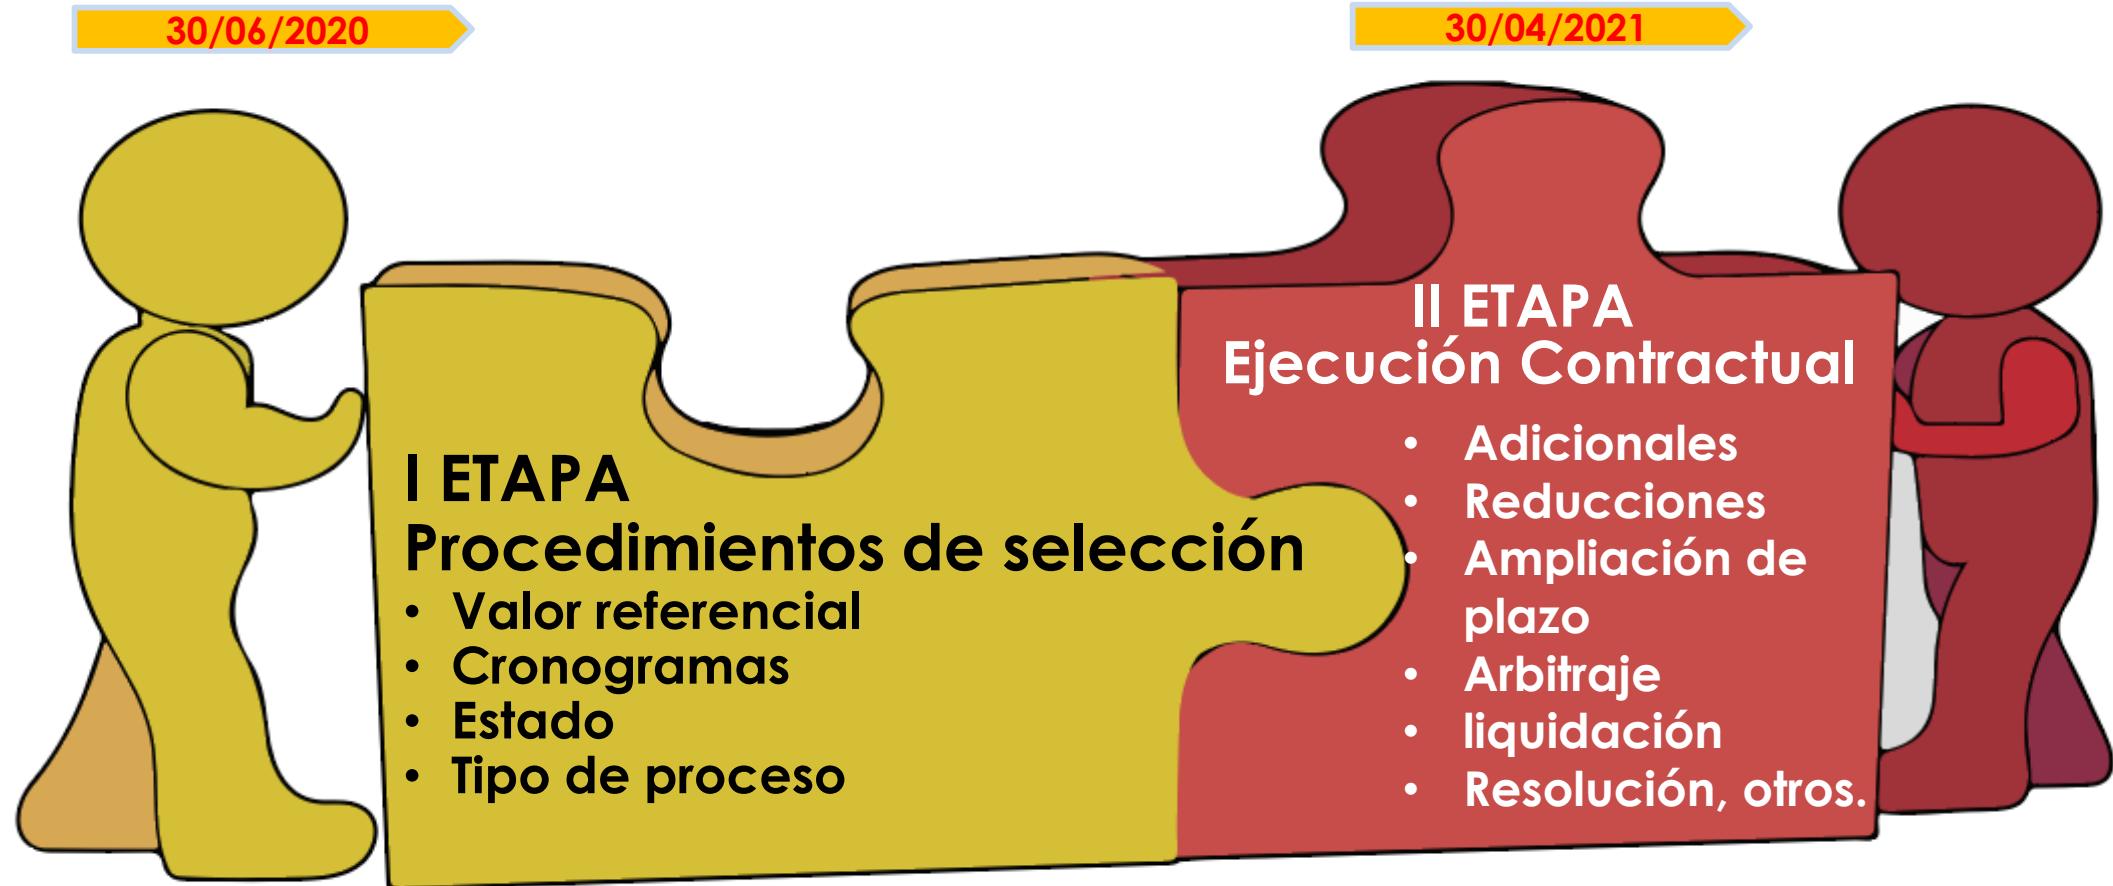

**NUEVA IMPLEMENTACIÓN**

# B. REPORTE DE LA SECCIÓN CONTRATACIONES

## a. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (PRIMERA ETAPA)

**CONTRATACIONES**

**1**

**2**

**PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN**

**EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

**Leyenda**

● Continuidad en el procedimiento ● Con modificación en el cronograma ● Sin continuidad en el procedimiento

**BIENES : 55**

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle

**SERVICIOS : 34**

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle

**Ver Detalle**

Dar clic en la sección de procedimientos de selección.

Luego dar clic en el encabezado de “Ver detalle” para desplegar las convocatorias.

# B. REPORTE DE LA SECCIÓN CONTRATACIONES

## a. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (PRIMERA ETAPA)


- 3 Se desplegarán toda la información de las convocatorias asociados a la inversión.
- 4 Para visualizar el cronograma de la convocatoria, dar clic en “Ver detalle”

BIENES : 55

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S.)	Ver Detalle
		DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAPAMPA.	DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAPAMPA.					
Licitación Pública	LP-SM-1-2020-COPESCO/GRC-1	ADQUISICIÓN DE VOLQUETES DE 15 M3 PARA LAS METAS: 0021 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO; Y META 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAPAMPA.	ADQUISICIÓN DE VOLQUETES DE 15 M3 PARA LAS METAS: 0021 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO; Y META 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAPAMPA.	1	13/11/2020	Nulo	1,358,250	
Comparación de Precios	COMPRE-SM-2-2020-COPESCO/GRC-1	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES DE MOTOR PARA LA META 09 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-CCORCA-HUAYLLAPAMPA, ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO".	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES DE MOTOR PARA LA META 09 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-CCORCA-HUAYLLAPAMPA, ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO".	1	06/10/2020	Contratado	63,190	
Adjudicación Simplificada	AS-SM-21-2020-COPESCO/GRC-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTIL, PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO CCORCA HUAYLLAPAMPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTILES PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAPAMPA	1	28/08/2020	Retrotraído por resolución	67,201	
Adjudicación Simplificada	AS-SM-21-2020-COPESCO/GRC-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTIL, PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO CCORCA HUAYLLAPAMPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTILES PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAPAMPA	1	28/08/2020	Contratado	67,201	

CONTRATACIONES: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Convocatoria	Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
13/11/2020	Convocatoria	13/11/2020	13/11/2020
13/11/2020	Formulación de consultas y observaciones	14/11/2020	27/11/2020
13/11/2020	Registro de participantes	14/11/2020	21/12/2020
13/11/2020	Integración de las Bases	07/12/2020	07/12/2020
13/11/2020	Absolución de consultas y observaciones	07/12/2020	07/12/2020
13/11/2020	Presentación de propuestas	22/12/2020	22/12/2020
13/11/2020	Calificación y Evaluación de propuestas	23/12/2020	23/12/2020
13/11/2020	Otorgamiento de la Buena Pro	23/12/2020	23/12/2020

34

# B. REPORTE DE LA SECCIÓN CONTRATACIONES

## a. EJECUCIÓN CONTRACTUAL (SEGUNDA ETAPA)

CONTRATACIONES

Código Único: 2380087

Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Tipo de Inversión: PROYECTO DE INVERSIÓN

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATOS ASOCIADOS : 49

BIENES : 34

Número de Item	Descripción de Item	Contratista	Nº Contrato	Fecha Suscripción	Monto Contratado Total (S/.)	Monto Contratado Item (S/.)	Ver Contrato	Arbitraje	Información contractual
1	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES DE MOTOR PARA LA META 09 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-CCORCA-HUAYLLAPAMPA, ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO".	GAP MAQUINARIAS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GAP MAQUINARIAS PERU E.I.R.L.	610-2020	19/10/2020	63,190	63,190	 	NO REGISTRA INFORMACIÓN	 
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTILES PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	RALEON CORPORATION S.R.L.	676-2020	03/11/2020	77,999	77,999	 	NO REGISTRA INFORMACIÓN	 

5 Dar clic en la sección de ejecución contractual.

6 Dar clic en el encabezado de "información contractual", para desplegar los contratos.

7 Dar clic en "Ver contrato" para descargar el documento en pdf.

8 Dar clic en el icono SE@CE

# B. REPORTE DE LA SECCIÓN CONTRATACIONES

## b. EJECUCIÓN CONTRACTUAL (SEGUNDA ETAPA)

### CONTRATACIONES

Código Único:	2234355	Tipo de Inversión:	PIP MAYOR (SNIP)						
Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA						
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN		EJECUCIÓN CONTRACTUAL							
SERVICIOS : 23									
Número de Item	Descripción de Item	Contratista	Nº Contrato	Fecha Suscripción	Monto Contratado Total (S/.)	Monto Contratado Item (S/.)	Ver Contrato	Arbitraje	Información contractual
1	SERVICIO DE DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE 98 VIVIENDAS AFECTADAS POR LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO II: DESVÍO CERRO DE PASCO (PROGR. KM. 181+000) - DESVÍO CHACAYAN (PROG. KM. 230+000).	MUÑOZ SAENZ DANIEL MAURICIO	103-2020-MTC-20-22-4	21/09/2020	338,623	338,623			
1	SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA LAS GESTIONES DE ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO III: DV. CAHCAYÁN - AMBO.	LINO RUIZ DAVID DALAMBERT	070-2020-MTC/20.22.4	23/04/2020	76,700	76,700			

### Buscador de Contratos del Estado

OSCE Sistema de Operación de Selección de Contratistas del Estado SE@CE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

Opciones de búsqueda:

- Mapa interactivo
- Búsqueda avanzada

Inicio < Búsqueda avanzada < Ver detalle del contrato

Atrás

Ver detalle del contrato

contrato 2.Ítems del contrato 3.Garantías del contrato 4.Acciones del contrato 5.Datos del proyecto

No existe resultado de la búsqueda de Garantías del contrato

Fuente: SEACE-Contratos correspondientes a los Procedimientos de Selección bajo la Ley N° 30225 y otros Regímenes Especiales de contratación tal como el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción por Cambios, entre otros.

### CONTRATACIONES: EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Código Único:	2234355	Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO
Objeto:	063-2020-MTC/20.22.4 Servicio legal especializado para las gestiones en la liberación y adquisición de predios (trato directo o expropiación o transferencia interestatal) para la ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Tramo II: Desvío Cerro de Pasco - Desvío Chacayán.		
Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA		
ADICIONALES / REDUCCIONES			
ADICIONALES:			
Nº Adicional	Descripción	Fecha Aprob.	Monto S/.
REDUCCIONES:			
Nº Reducción	Descripción	Fecha Aprob.	Monto S/.
DESCARGA			

# B. REPORTE DE LA SECCIÓN CONTRATACIONES

## b. EJECUCIÓN CONTRACTUAL (SEGUNDA ETAPA)

01 de enero  
2013

11 de setiembre  
2020



Información de la situación de los contratos antes de la vigencia del nuevo módulo de ejecución contractual del SEACE.

**CONTRATACIONES: EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Código Único:	2234355	Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO		
Objeto:	Servicio				
Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA				
<a href="#">ADICIONALES / REDUCCIONES</a> <a href="#">AMPLIACIÓN DE PLAZO</a> <a href="#">ARBITRAJE</a> <a href="#">LIQUIDACIÓN</a> <a href="#">RESOLUCIÓN</a> <a href="#">COMPLEMENTARIOS</a> <a href="#">PRORROGA</a>					
<b>ADICIONALES:</b>					
Nº Adicional	Descripción	Fecha Aprob.	Monto S/.	Descarga	
<b>REDUCCIONES:</b>					
Nº Reducción	Descripción	Fecha Aprob.	Monto S/.	Descarga	

**Buscador de Contratos del Estado**

[Inicio](#) < [Búsqueda avanzada](#) < [Ver detalle del contrato](#)

[Atrás](#) [Ver detalle del contrato](#)

No existe resultado de la búsqueda de Garantías del contrato

**Central de Consultas del SEACE:**  
(01) 614 3636 - Opción 2

Fuente: SEACE-Contratos correspondientes a los Procedimientos de Selección bajo la Ley N° 30225 y otros Regímenes Especiales de contratación tal como el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción por Cambios, entre otros.

# B. REPORTE DE LA SECCIÓN CONTRATACIONES


## b. EJECUCIÓN CONTRACTUAL (SEGUNDA ETAPA)

### Inversión (CUI)



### SEACE

#### Contratos



Obras



Bienes



Servicios



consultorías

#### Modificaciones

Adicionales/Reducciones

Ampliación de plazo

Arbitraje

Liquidación

Resolución y otros

# ¿Aún tienes dudas?



## Consultas generales

Envía tu consulta a:

[invierte.pe@mef.gob.pe](mailto:invierte.pe@mef.gob.pe)



## Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos a nivel nacional y agenda tu reunión virtual.

**CONECTA MEF**  
[www.mef.gob.pe/conectamef](http://www.mef.gob.pe/conectamef)



Muchas gracias.

invierte.pe



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas
