



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe



“ACTUALIZACIÓN DEL F8 Y F12-B PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES ”

Capacidad

Orientar al operador en el registro, actualización y seguimiento de Formato 8 y Formato 12-B para la Programación Multianual de Inversiones




Contenidos

1. El PMI y su vinculación con los Formatos del Invierte.pe
2. Formato N° 08 (Fase de ejecución de las inversiones)
3. Formato N° 12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones



El PMI y su vinculación con los Formatos del Invierte.pe

Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe

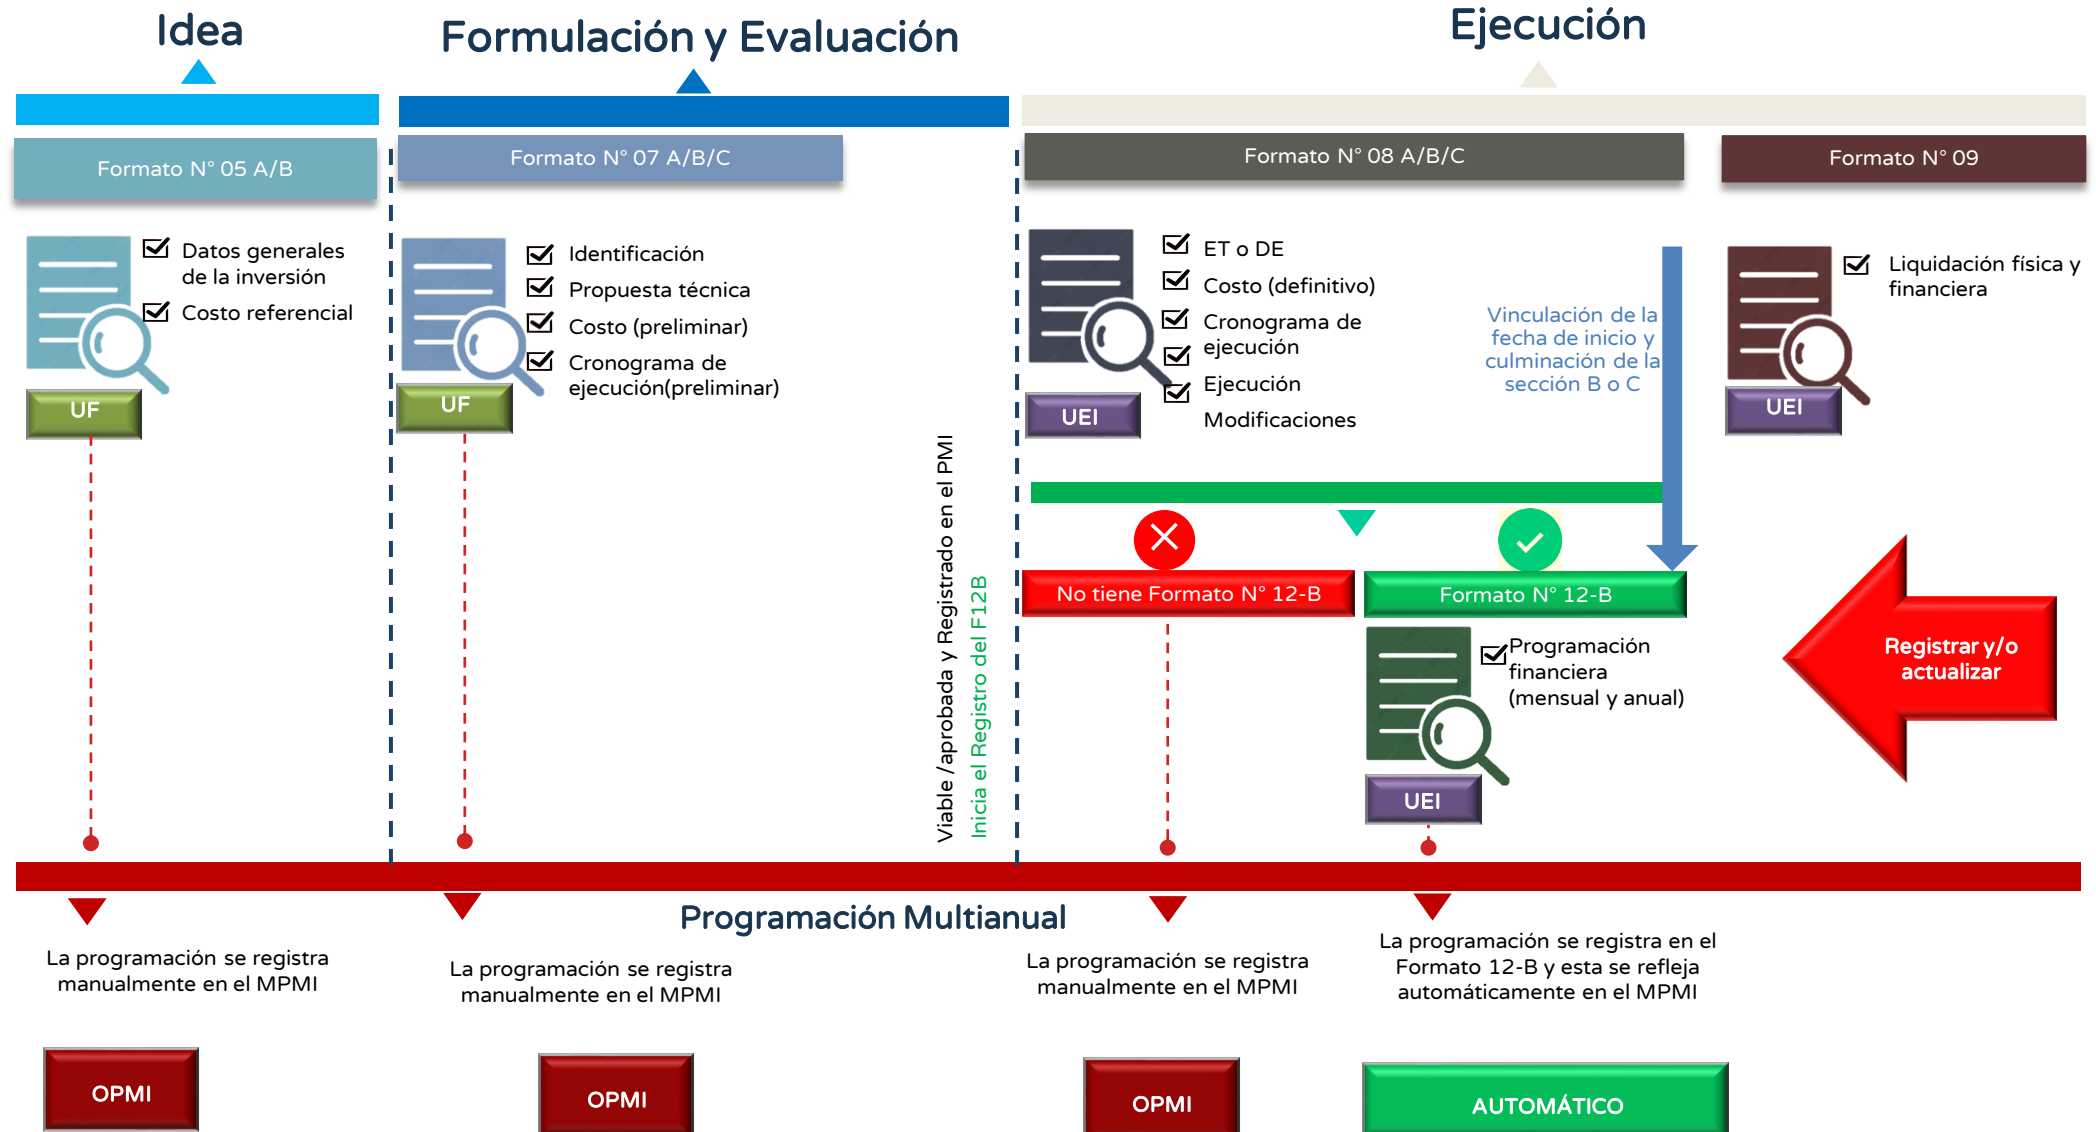

Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe

Cuando la inversión tiene Formato N° 12-B

MPMI

Costo Inversión	<input type="text" value="34,942,465"/>	Dev. Acu. Año Ant.	<input type="text" value="11,812,958"/>
Monto Laudo	<input type="text" value="0"/>	PIM Año Actual	<input type="text" value="0"/>
Monto Carta Fianza	<input type="text" value="0"/>	SALDO A PROGRAMAR:	23,129,507
Inicio Ejecución.	<input type="text" value="Diciembre"/> - <input type="text" value="2014"/>	Fin Ejecución Previsto.	<input type="text" value="Agosto"/> - <input type="text" value="2018"/>

PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN (Campos se habilitan según fecha fin ejecución)

2023	2024	2025
<input type="text" value="2,268,954"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Se requiere que la UEI actualice el Formato 12-B de la inversión.



El MPMI obtendrá la programación correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025 de dicho formato.



Cualquier modificación que requiera realizarse en la programación de estas inversiones para los años 2023, 2024 y 2025, tendrá que efectuarse en el Formato 12-B y consecuentemente la actualización de esta información se visualizará en el MPMI.



Cuando se tenga previsto culminar la ejecución de la inversión en el presente año (2022), y se tiene como fecha "fin de ejecución previsto" en el año 2022, el MPMI mostrará monto cero en los 3 años y permitirá guardar dicho registro.

Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe

Cuando la inversión tiene Formato N° 12-B

Formato N° 12-B

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal:

Año: 2021 PIM: S/19,169,709.00

Ejecutora presupuestal: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

Programación Financiera (mensual) Programación Financiera (anual)

Costo Actualizado	Devengado acumulado (al año anterior)	PIM	Saldo
103,376,376.23	25,722,240.57	19,169,709.00	58,484,426.66

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2022	8969848.2
TOTAL:	S/8,969,848.20

Guardar

Se habilita de acuerdo al registro de la Programación de ejecución de inversiones del Formato N°8A

Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe

Cuando la inversión tiene Formato N° 12-B

Formato N° 8

1 Modificaciones durante la ejecución física										
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
INFRAESTRUCTURA										
CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO :	INFRAESTRUCTURA	10777.03 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	10777.03 METROS LINEALES	15,286,750.29	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	04/02/2020	10/01/2022	09/02/2022	UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
CONSTRUCCION DE PTAR :	INFRAESTRUCTURA	425.50 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	425.50 M2	46,477,237.51	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	04/02/2020	10/01/2022	09/02/2022	UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
CONSTRUCCION DE EQUIPO ELECTRICO :	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1 METROS LINEALES	33,470,695.19	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	04/02/2020	10/01/2022	09/02/2022	UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	INTANGIBLES	1 N° DE INFORMES		852,380.37	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	04/02/2020	10/01/2022	09/02/2022	UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	1,518,346.51					UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMPHAL002	
SUBTOTAL: S/.				97,605,409.87						
GESTION DEL PROYECTO: S/				1,231,767.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	03/02/2020	27/07/2021		MGIRONCH@HOT	INFORME 427-2020-MPH/GDUR (17/06/2020)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				208,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA				MGIRONCH@HOT	
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/				0.00					UEIMPHAL001	
SUPERVISIÓN: S/				4,331,199.16	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/08/2018	10/01/2022		UEIEMAPA01	CARTA N° 261-2020-EMAPA HUARAL S.A./GG/GOM (16/12/2020)
SUPERVISIÓN COVID: S/				0.00					UEIMPHAL001	
LIQUIDACIÓN: S/				0.00					UEIMPHAL001	
MONTO ACTUALIZADO: S/.				103,376,376.23						

Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe

Cuando la inversión no tiene Formato N° 12-B

MPMI

Costo Inversión	<input type="text" value="7,722,070"/>	Dev. Acu. Año Ant.	<input type="text" value="7,518,053"/>
Monto Laudo	<input type="text" value="0"/>	PIM Año Actual	<input type="text" value="0"/>
Monto Carta Fianza	<input type="text" value="0"/>	SALDO A PROGRAMAR:	204,017
Inicio Ejecución.	<input type="text" value="Marzo"/> - <input type="text" value="2010"/>	Fin Ejecución Previsto.	<input type="text" value="Diciembre"/> - <input type="text" value="2023"/>

PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN (Campos se habilitan según fecha fin ejecución)

2023	2024	2025
<input type="text" value="204,017"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>



El MPMI permitirá el registro de la programación correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025, según corresponda.



Los casilleros correspondientes a la programación de cada año se habilitarán de acuerdo con las fechas de “inicio y fin de ejecución previsto”.



El monto total programado en los tres años de programación debe ser mayor a cero y menor o igual al saldo a programar.



Cuando se haya previsto culminar la ejecución de la inversión en el presente año (2022), se deberá tener como fecha “fin de ejecución previsto” el año 2022, en ese caso se habilitará la opción “la inversión culminará el presente año”, la cual deberá ser marcada.

Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe

Cuando la inversión no tiene Formato N° 12-B

MPMI



La fecha de “**Inicio de ejecución**” y la fecha de “**Fin de ejecución previsto**” de la inversión.

The screenshot shows a light blue rounded rectangle containing two date selection fields. The first field is labeled 'Inicio Ejecución.' and has a dropdown menu set to 'Marzo' and a year dropdown set to '2010'. The second field is labeled 'Fin Ejecución Previsto.' and has a dropdown menu set to 'Diciembre' and a year dropdown set to '2023'.



Si la inversión se encuentra en ejecución, la fecha de “**Inicio de ejecución**” no es modificable, se mostrará el mes y año en el que se realizó el primer devengado.



Si la inversión no se encuentra en ejecución, la fecha de “**Inicio de ejecución**” y la fecha de “**Fin de ejecución previsto**” de la inversión podrán ser actualizadas en el MPMI.



La fecha “**Fin de ejecución previsto**” tampoco podrá ser modificada en el MPMI, cualquier actualización que se requiera deberá ser registrada en el Formato N° 8, según corresponda.

Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe

Cuando la inversión no tiene Formato N° 12-B



Formato N° 8

1 Modificaciones durante la ejecución física										
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
INFRAESTRUCTURA										
CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO :	INFRAESTRUCTURA	10777.03 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	10777.03 METROS LINEALES	15,286,750.29	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	04/02/2020	10/01/2022	09/02/2022	UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
CONSTRUCCION DE PTAR :	INFRAESTRUCTURA	425.50 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	425.50 M2	46,477,237.51	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	04/02/2020	10/01/2022	09/02/2022	UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
CONSTRUCCION DE EQUIPO ELECTRICO :	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1 METROS LINEALES	33,470,695.19	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	04/02/2020	10/01/2022	09/02/2022	UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	INTANGIBLES	1 N° DE INFORMES		852,380.37	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	04/02/2020	10/01/2022	09/02/2022	UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	1,518,346.51					UEIMPHAL002	CARTA N° 039-2020-MPH/GDUR (04/09/2020)
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMPHAL002	
SUBTOTAL: S/.				97,605,409.87						
GESTION DEL PROYECTO: S/				1,231,767.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	03/02/2020	27/07/2021		MGIRONCH@HOT	INFORME 427-2020-MPH/GDUR (17/06/2020)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				208,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA				MGIRONCH@HOT	
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/				0.00					UEIMPHAL001	
SUPERVISIÓN: S/				4,331,199.16	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/08/2018	10/01/2022		UEIEMAPA01	CARTA N° 261-2020-EMAPA HUARAL S.A./GG/GOM (16/12/2020)
SUPERVISIÓN COVID: S/				0.00					UEIMPHAL001	
LIQUIDACIÓN: S/				0.00					UEIMPHAL001	
MONTO ACTUALIZADO: S/.				103,376,376.23						

Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe

Verificar la actualización del Formato N° 12-B y Formato N° 8

En el reporte de Excel se puede verificar la fecha de actualización del **Formato N° 12-B** y las fechas de inicio y fin registradas en el **Formato N° 8**.



Formato 12-B

Formato 08

CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2023 - 2025																			
OPMI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																			
Fecha de generación de último reporte de cartera: 24/01/2022 17:19:50																			
PRIORIDAD	CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO IDEA	NOMBRE INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	CICLO DE INVERSIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN	PUNTAJE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (\$/)	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/2021 (\$/)	PIM 2022 (\$/)	SALDO PROGRAMABLE (\$/)	PROGRAMACIÓN 2023 (\$/)	PROGRAMACIÓN 2024 (\$/)	PROGRAMACIÓN 2025 (\$/)	SALDO PENDIENTE (\$/)	PROGRAMO F12-B	FECHA ACTUALIZACIÓN F12-B	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCIÓN
1	2195496		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	95.000	34,942,465.00	11,812,958.00	0.00	23,129,507.00	2,268,954.00	0.00	0.00	20,860,553.00	SI	15/01/2021	03/12/2014	28/08/2018
2	2234847		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	92.000	23,793,918.00	10,512,824.00	1,104,407.00	12,176,687.00	288,870.00	0.00	0.00	11,887,817.00	SI	15/01/2021	01/06/2014	29/01/2019
4	2274395		CREACION D	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	76.420	18,189,772.00	10,608,400.00	257,536.00	7,323,836.00	428,222.00	0.00	0.00	6,895,614.00	SI	22/01/2021	01/06/2015	24/03/2023
5	2194402		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	76.420	11,510,335.00	5,162,115.00	207,000.00	6,141,220.00	207,000.00	206,497.00	0.00	5,727,723.00	SI	21/01/2021	30/10/2015	23/10/2020
6	2284960		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	73.920	18,854,214.00	8,192,764.00	393,000.00	10,268,450.00	393,000.00	278,520.00	0.00	9,596,930.00	SI	21/01/2021	01/10/2015	31/12/2020
7	2145605		CONSTRUCCI	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	72.000	19,400,095.00	19,224,549.00	0.00	175,546.00	4,908,284.00	0.00	0.00	-4,732,738.00	SI	15/01/2021	01/09/2013	30/06/2015
8	2270500		INSTALACION	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	71.920	15,350,824.00	7,324,959.00	319,999.00	7,705,866.00	500,000.00	149,509.00	0.00	7,056,357.00	SI	22/01/2021	01/06/2015	24/03/2023
9	2094332		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	Z	70.000	7,722,070.00	7,518,053.00	0.00	204,017.00	204,017.00	0.00	0.00	0.00	NO		01/03/2010	01/12/2023
10	2194958		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	70.000	25,706,841.00	2,226,041.00	1,559,692.00	21,921,108.00	0.00	0.00	0.00	21,921,108.00	SI	15/01/2021	01/06/2016	29/01/2021
11	2177135		CONSTRUCCI	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	70.000	43,994,562.00	29,901,282.00	1,431,104.00	12,662,176.00	0.00	0.00	0.00	12,662,176.00	SI	14/12/2020	24/11/2013	13/02/2019
12	2251684		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	70.000	11,716,531.00	329,900.00	0.00	11,386,631.00	500,000.00	0.00	0.00	10,886,631.00	SI	15/01/2021	20/07/2018	28/02/2021
13	2042747		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	70.000	10,391,840.00	9,871,262.00	0.00	520,578.00	415,675.00	0.00	0.00	104,903.00	NO		01/01/2009	01/01/2023
14	2466073		ADQUISICION	INVERSIONE	EJECUCIÓN	E	70.000	5,263,313.00	0.00	0.00	5,263,313.00	294,653.00	0.00	0.00	4,968,660.00	SI	22/01/2021	15/09/2020	24/07/2021
15	2397817		CONSTRUCCI	INVERSIONE	EJECUCIÓN	E	70.000	844,806.00	79,445.00	0.00	765,361.00	1.00	0.00	0.00	765,360.00	SI	14/12/2020	01/11/2017	01/01/2018
16	2359411		REMODELACI	INVERSIONE	EJECUCIÓN	E	70.000	1,168,089.00	0.00	89,027.00	1,079,062.00	0.00	0.00	0.00	1,079,062.00	SI	15/01/2021	02/12/2019	31/03/2020
17	2234521		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	68.000	16,027,400.00	11,848,381.00	0.00	4,179,019.00	793,038.00	0.00	0.00	3,385,981.00	SI	14/12/2020	01/02/2014	30/12/2020
18	2160312		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	65.000	14,493,102.00	10,131,636.00	0.00	4,361,466.00	1,212,367.00	0.00	0.00	3,149,099.00	SI	15/01/2021	13/11/2012	21/12/2019
19	2235505		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	65.000	31,072,332.00	2,548,396.00	491,067.00	28,032,869.00	2,167,226.00	0.00	0.00	25,865,643.00	SI	15/01/2021	01/12/2016	30/06/2020
20	2189354		MEJORAMIE	PROYECTO	EJECUCIÓN	E	65.000	23,979,105.00	14,447,983.00	0.00	9,531,122.00	2,019,934.00	0.00	0.00	7,511,188.00	SI	15/01/2021	01/03/2014	31/12/2020

Vinculación del MPMI y los Formatos del Invierte.pe

Verificar la actualización del Formato N°12-B

A través de la consulta web de inversiones se puede verificar la última fecha de modificación del Formato N° 12-B.

invierte.pe Banco de Inversiones
Consulta de Inversiones

Consulta de Inversiones

Criterios de búsqueda

Por código único:
2359411

Por nombre:
DIGITE EL NOMBRE O ALGUNA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

CSL1L

Refrescar

Buscar Borrar filtros

Lista de resultados

Código único	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Monto de la inversión	Monto actualizado	Fase de ejecución	Registro de cierre
2359411	--	ACTIVO	REMODELACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD PUERTO MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	IOARR	APROBADO	3,000,000.00	Ver ficha de seguimiento		

Formato N°12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones

Exportar PDF

Vista Resumen

Código único de inversiones	2310861	Fecha de última modificación	01/02/2022 12:00:00 a.m.
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO		



2 Formato 08 (registro en la fase de ejecución de las inversiones)

Formato N° 08 (Fase de ejecución de las inversiones)

¿Qué es el F-08?

Es una herramienta de gestión que permite realizar los registros que se requieran hacer después que el proyecto de inversión fuera declarado viable o que la IOARR fuera aprobada. Nos permite actualizar la información registrada en los formatos 07-A.



Finalidad

Formato N°08-A

Con este instrumento se registra la información siguiente:

- ✓ Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del ET o DE El resultado de la elaboración del ET o DE.
- ✓ Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del PI

Formato N°08-C

Con este instrumento se registra la información siguiente:

- ✓ El resultado de la elaboración del ET o DE.
- ✓ Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del PI

Estructura del formato N°08-A

El Formato N°08-A tiene tres secciones:

SECCIÓN A: Información de la fase de Formulación y Evaluación, consistencia

- Se registra las modificaciones de la fase de formulación y evaluación antes de la aprobación del ET/DE
- Aprobación de consistencia.

↑
UF

SECCIÓN B: Información de la fase de Ejecución, ET o DE y programación

- Registro de documentos de aprobación del resultado del ET/DE aprobado.
- Programación del PI.
- Señalar si la ejecución será con mas de un ET.

↑
UEI

SECCIÓN C: Información de la fase de Ejecución durante la Ejecución física

- Registra las modificaciones durante la ejecución física. (Toda modificación debe ser sustentada).

↑
UEI

Estructura del formato N°08-C



El Formato N°08-C tiene dos secciones :

Activos
estratégicos

SECCIÓN B: Información de la fase de Ejecución, ET o DE y programación

- Registro de documentos de aprobación del resultado del ET/DE aprobado.
- Programación del PI.
- Señalar si la ejecución será con mas de un ET.

↑
UEI

SECCIÓN C: Información de la fase de Ejecución durante la Ejecución física

- Registra las modificaciones durante la ejecución física. (Toda modificación debe ser sustentada).

↑
UEI

Requisitos para el inicio de Consistencia

Contar con el Formato N°08 – A o Formato N°08 – C Actualizado

En la fase de ejecución podrá actualizar la fecha de inicio, fecha de termino y costo de inversión de la ejecución de la inversión

DATOS DEL EXPEDIENTE TECNICO-PROGRAMACIÓN

Ver acciones eliminadas

Descripción de productos/acciones/activo				Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de Inversiones								
Acción	Activo	Acción sobre activo			Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (\$)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio vigente	Fecha de término vigente	Fecha de entrega del activo a responsable de O y M	UB	Documento de aprobación
+ Producto: Producto 1													
CONSTRUC	AULA	CONSTRUCCIÓN DE AULA		INFRAESTRUCTUR	30	1250	9,600,000.00	ADMINISTF	29/08/19	25/04/2022	10/05/2020		

Responsable: --SELECCIO--
--SELECCIONE--
EXPEDIENTE N°90
089-2019-G-
EXPEDIENTE TECNICO N° 089

Nota: En los casos donde aun no exista ejecución física y estén en la sección B del Formato 08-A se debe actualizar la fecha de término en el cuadro de programación de la ejecución de las inversiones

Registro de la programación de las inversiones (sección B)

32.5 Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI registra en el Banco de Inversiones la información de dichos documentos mediante el Formato N° 08-A: para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: para IOARR

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión		Programación de ejecución de inversiones						
Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
	Construcción de aula : AULAS PEDAGÓGICAS	INFRAESTRUCTURA	2,739,393.63	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/03/22	4/11/22	4/04/23	UEI-ELVIS
	Construcción de ambiente administrativo : AMBIENTES ADMINISTRATIVOS	INFRAESTRUCTURA	744,644.66	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/03/22	4/11/22	4/04/23	UEI-ELVIS
	Construcción de aula de innovación pedagógica : AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA	INFRAESTRUCTURA	674,699.98	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/03/22	4/11/22	4/02/23	UEI-ELVIS
	Construcción de laboratorio cta : LABORATORIO	INFRAESTRUCTURA	1,105,644.38	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/03/22	4/11/22	4/04/23	UEI-ELVIS
	Construcción de biblioteca escolar : BIBLIOTECA ESCOLAR	INFRAESTRUCTURA	452,643.25	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/03/22	4/11/22	4/04/23	UEI-ELVIS
	Construcción de taller de educación para el trabajo : TALLER DE EDUCACION PARA EL TRABAJO	INFRAESTRUCTURA	645,632.55	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/03/22	4/11/22	4/02/23	UEI-ELVIS
	Construcción de sala de usos múltiples : SALA DE USOS MULTIPLES	INFRAESTRUCTURA	542,633.54	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/03/22	4/11/22	4/04/23	UEI-ELVIS
	Construcción de topico : AMBIENTES PARA TOPICO Y PSICOLOGIA	INFRAESTRUCTURA	345,688.10	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/03/22	4/11/22	4/04/23	UEI-ELVIS
	Construcción de taller de arte : TALLER DE ARTE	INFRAESTRUCTURA	849,643.25	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/03/22	4/11/22	4/02/23	UEI-ELVIS
	Adquisición de equipamiento	Equipam.	400,000	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	4/09/22	4/12/22	4/02/23	UEI-ELVIS

Registro de la programación de las inversiones (sección C)

33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión.

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física										
1 Modificaciones durante la ejecución física										
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S./)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO										
CONSTRUCCION DE AULA : Aulas	INFRAESTRUCTURA	36 AULAS	2016 M2	3,503,150.90	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	28/10/2020	01/08/2023	29/11/2023	UEIPRONIED1	N°276-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED (22/12/2021)
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : Administración, SS.HH., depósitos, sala de profesores, departamento de educación física, escalera, SUM, biblioteca CRT, cafetería, cuarto de limpieza, kiosco, laboratorio de ciencias, limpieza y maestranza y tópic, taller multifuncional, departamento de educación física, cerco perimétrico, ingreso tipo primaria y secundaria, espacios de circulación horizontal, patios, losas deportivas, botaderos, cisterna, zona de estacionamiento, jardinería, módulos de vigilancia.	INFRAESTRUCTURA	41 AMBIENTES	7006.04 M2	11,388,379.51	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	28/10/2020	01/08/2023	29/11/2023	UEIPRONIED1	N°276-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED (22/12/2021)
OTRAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO : Equipamiento	EQUIPAMIENTO	170 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO		1,214,660.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/03/23	5/08/23	9/11/23	UEIPRONIED1	
OTRAS ACCIONES DE MOBILIARIO : Mobiliario	MOBILIARIO	2692 NÚMERO DE MOBILIARIO		857,518.73	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/03/23	5/08/23	9/11/23	UEIPRONIED1	
Gastos Generales por Covid - 19 : Por concepto de Gastos y Costos incurridos	INFRAESTRUCTURA	0	0	63,100.72					UEIPRONIED3	N°276-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED (22/12/2021)

Ejecución con más de 01 ET/DE (Ejecución inició en el marco del SNIP)

Datos generales del proyecto o inversión						
Código único de inversiones	2222399					
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS BARRIOS PROGRESO, TUPAC AMARU, CESAR VALLEJO Y URBANIZACION ROMEP DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO					
Monto de la inversión	S/. 2,565,000.00					
Monto actualizado	S/. 4,382,166.32					

Lista de modificaciones en Fase de Ejecución						
Fecha de última modificación	Monto actualizado S/	Comentarios	Usuario	Tipo de documento	¿Es histórico?	Ver
14/12/2021 03:07:23 p.m.	S/. 4,382,166.32	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - INVIERTE	UF: UFMPPSGF / UEI: UEIGIMP		NO	 
08/05/2015 06:55:50 p.m.	S/. 512,203.71		OPIMPPUNO	(F15)	NO	
08/05/2015 06:48:02 p.m.	S/. 657,002.65		OPIMPPUNO	RESE	NO	

**Formato
N° 08**

- **SECCIÓN A:** Información de la fase de Formulación y Evaluación, consistencia
- **SECCIÓN B:** documentos referidos al ET o DE y la programación del PI.
- **SECCIÓN C:** Información durante la Ejecución física

Ejecución con más de 01 ET/DE (Ejecución inició en el marco del SNIP)

Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

CONSISTENCIA_ROMEP.pdf

Datos de la fase de Ejecución

Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el plan viable

Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución				Según expediente técnico			
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (\$/)	Expediente técnico o documento equivalente
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Ducto 1: CALZADA DE VÍAS EN BUENAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR							
Construcción de pista : Jr. Inca Garcilazo de la Vega cuadra 2	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	764.14	203,739.85	RGM N°159-2015-MPP/GM (11/05/2015)
Construcción de pista : Jr. 1ro. de Mayo cuadra 8	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	497.50	132,647.83	RGM N°159-2015-MPP/GM. (11/05/2015)
Construcción de pista : Jr. Villa del Lago cuadra 2	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	1102.25	242,227.69	RGM N°884-2012-MPP/GM (14/12/2012)
Construcción de pista : Jr. Capitán Morante cuadra 4	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	1245.45	296,056.08	RGM N°884-2012-MPP/GM (14/12/2012)
Acción 1.5 construcción de pistas jr. dante nava :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	948	M2	1264.61	335,509.50	RGM 875-2017 MPB DANTE NAVA.PDF (05/12/2017)
Construcción de pista : Jr. Pradera cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	459.86	143,079.53	RGM N° 883-2020-MPP-GM (13/11/2020)
Construcción de pista : Jr. Villa Sol cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	466.14	176,298.18	RGM N° 883-2020-MPP-GM (13/11/2020)
Construcción de pista : Jr. Montesinos cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	448	166,758.11	RGM N° 883-2020-MPP-GM (13/11/2020)
Construcción de pista : Jr. Pilcuyo cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	910.30	240,546.37	RGM N° 883-2020-MPP-GM

Ejecución con más de 01 ET/DE (Ejecución inició en el marco del SNIP)

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: Producto 1: CALZADA DE VÍAS EN BUENAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR							
Construccion de pista : Jr. Inca Garcilazo de la Vega cuadra 2	INFRAESTRUCTURA	203,739.85	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	18/05/2015	15/08/2015	30/08/2015	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. 1ro. de Mayo cuadra 8	INFRAESTRUCTURA	132,647.83	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	18/05/2015	15/08/2015	30/08/2015	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Villa del Lago cuadra 2	INFRAESTRUCTURA	242,227.69	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/02/2012	31/03/2012	15/04/2012	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Capitán Morante cuadra 4	INFRAESTRUCTURA	296,056.08	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/02/2012	31/03/2012	15/04/2012	UEIGIMP
Acción 1.5 construccion de pistas jr. dante nava :	INFRAESTRUCTURA	335,509.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Pradera cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	143,079.53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Villa Sol cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	176,298.18	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Montesinos cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	166,758.11	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Pilcuyo cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	240,546.37	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Oroya cuadra 2	INFRAESTRUCTURA	440,390.53	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Clorinda Matto cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	137,676.05	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Cipreces cuadra 4	INFRAESTRUCTURA	134,057.71	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Claveles cuadra 4	INFRAESTRUCTURA	140,788.85	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Inca Garcilazo de la Vega cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	332,566.78	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP
Construccion de pista : Jr. Inca Garcilazo de la Vega cuadra 1	INFRAESTRUCTURA	332,566.77	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20/01/21	20/09/22	20/01/23	UEIGIMP

Actualización de la fecha inicio-fin




Ampliación
de plazo



Cambio de
supervisor de
obra

CRONOGRAMA

Resolución de
contrato



Cambio de
residente de
obra



3

Formato N° 12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones

¿Qué es el F12-B?

Es una herramienta de gestión que permite el **seguimiento a la ejecución de las inversiones**, en base a la información registrada por la UEI en el Banco de Inversiones y a la información de los sistemas administrativos vinculados, facilitando una adecuada toma de decisiones para una eficiente gestión de inversiones.



Objetivos



Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de inversiones y brindar información de la **situación actual** y los riesgos asociados de las inversiones en la fase de ejecución.




Mostrar los avances en la ejecución propiciando una adecuada toma de decisiones de los involucrados en la gestión de inversiones.



Registrar la trazabilidad de las inversiones vinculando la información de los sistemas administrativos, lo cual facilita el seguimiento de las inversiones.

¿Qué beneficios tiene?



Marco legal del Formato N° 12-B



Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (DL N° 1252)

Numeral 11.3*

Incorporado

Las UEI registra y actualiza la información del avance físico y financiero de todos los componentes de las inversiones en el formato de seguimiento del aplicativo informático del Banco de Inversiones, de manera mensual...

Dentro de los primeros (10) días del mes siguiente al vencimiento del periodo.

Directiva General del Invierte.pe (Directiva N° 001-2019-EF/63.01)

Numeral 45.3


- ✓ ¿Quién registra?
La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).
- ✓ ¿Qué se registra?
Información sobre la ejecución de cada inversión de la entidad.
- ✓ ¿Plazo de registro?

Formato N° 12-B

A. Secciones

Inversión

- Viable
- Aprobado
- Incorporado en el PMI



UEI

Inicia el Registro del F12B, con la programación financiera.



Nota: B, C y D de la sección ejecución física no corresponde para bienes y servicios.

Registro del Formato N° 12-B

B. Ingreso al aplicativo de registro del Formato N° 12-B

Banco de Inversiones
© Ministerio de Economía y Finanzas

Acceso al Sistema


Usuario (*)
NOMBRE DE USUARIO

Contraseña (*)
CONTRASEÑA

SP7E6 CAPTCHA
Refrescar

Ingresar

Olvidé mi contraseña →



El responsable de la UEI Ingresar con sus credenciales al Banco de Inversiones

Registro del Formato N° 12-B

B. Ingreso al aplicativo de registro del Formato N° 12-B

The screenshot displays the 'Banco de Inversiones 1.0' web application. The top navigation bar includes the system name, a clock showing 'Tiempo restante 00:55:02', and a user profile for 'UEI'. The left sidebar menu is expanded, with 'Registro a la ejecución de inversiones' highlighted in a red box. A red arrow points from this menu item to the 'Total de Proyectos' dashboard card. The dashboard features four main cards: 'Total de Proyectos' (blue), 'Proyectos Programables' (green), 'Proyectos No Programables' (red), and 'Proyectos Pendientes' (orange). Below these cards is a chart titled 'Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Brechas (Alineado a funciones básicas complementarias: Educación, Salud, Saneamiento, Seguridad ciudadana)'. The breadcrumb navigation shows 'Sistema > Inicio > Banco de Inversiones'.

Registro del Formato N° 12-B

B. Ingreso al aplicativo de registro del Formato N° 12-B

Banco de Inversiones 1.0 | Tiempo restante: 00:59:45 | Bienvenido, UEI

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones | Usuario : UEI | Entidad : UEI

Seguimiento > Inversiones en ejecución

Seguimiento

Lista de inversiones en ejecución Avance

Mostrar 10 registros

	Código único	Descripción
	2064724	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARIA
	2064725	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MONTEVIDEO
	2089262	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
	2089266	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Ingrese el criterio de búsqueda

Hacer clic en el ícono para iniciar el registro

Ingresar el código de la inversión

Registro del Formato N° 12-B

C. Registro de la Ejecución Financiera

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:58:51

Bienvenido, 2019COPESCO

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI

Entidad : UEI

Registro del seguimiento de inversiones >> Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

2438679 - CREACION DEL BIEN PUBLICO DE SOCOS DEL DISTRITO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Información de la inversión

Expediente técnico

Ejecución Financiera

BIM

Seguimiento Físico (Hitos)

Volver



IMPORTANTE:

El registro de la ejecución financiera es requisito previo para el ingreso de información del avance físico.

Registro del Formato N° 12-B

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2022

Ejecutora presupuestal: REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL

PIM: S/14,177,990.00

Programación Financiera (mensual) | Programación Financiera (anual)

Periodo	Monto (Soles)
2022-01	0
2022-02	0
2022-03	0
2022-04	0
2022-05	0
2022-06	0
2022-07	0
2022-08	0
2022-09	0
2022-10	0
2022-11	0
2022-12	0
TOTAL:	S/0.00

Guardar

a) **Programación financiera (soles):** Programar PIA/PIM asignado a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.), es decir como se estima gastar el presupuesto asignado en el año. Se registra por única vez.

Guarda la información registrada

Guardar

⚠ Información del sistema

Requisitos mínimos:
El monto total del avance financiero programado no debe superar el PIM.



Registro del Formato N° 12-B

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal:

Año: 2022 PIM: S/14,177,990.00

Ejecutora presupuestal: REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL

Programación Financiera (mensual) Programación Financiera (anual)

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2022-01	0
2022-02	0
2022-03	0
2022-04	0
2022-05	0
2022-06	0
2022-07	0
2022-08	0
2022-09	0
2022-10	0
2022-11	0
2022-12	0
TOTAL:	S/0.00

Programación Financiera Actualizada

Periodo	Monto (Soles)
2022-01	0
2022-02	2005890.37
2022-03	1753512.6
2022-04	257417.05
2022-05	49500
2022-06	49500
2022-07	49500
2022-08	10500
2022-09	0
2022-10	0
2022-11	0
2022-12	0
TOTAL:	S/4,175,820.02

Guardar

b) **Programación financiera ACTUALIZADA (soles):** Se registran las reprogramaciones financieras a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.) cada vez que se requiera.

¿Qué puedo actualizar?

- Reprogramación de saldos por ejecutar.
- La programación de presupuesto incorporado.
- La programación del nuevo PIM, después de efectuado un recorte presupuestal.



IMPORTANTE:

Se puede reprogramar montos mayores al PIM

Guarda la información registrada

Guardar

Registro del Formato N° 12-B

c) Programación financiera anual (soles): Programar el saldo de la inversión a nivel de devengados anuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.), posterior al registro de la programación financiera mensual (soles).

FORMATO N°08

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones		
		Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término
CONSTRUCCIÓN DE VÍA PAVIMENTADA - tramo II				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO :	INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/06/2020	27/05/2024
CONSTRUCCION DE DRENAJE LONGITUDINAL : (CUNETAS)	INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/06/2020	27/05/2024
CONSTRUCCION DE DRENAJE TRANSVERSAL : (ALCANTARILLAS,BADENES)	INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/06/2020	27/05/2024
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN :	INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/06/2020	27/05/2024
IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRÁFICO :	INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/06/2020	27/05/2024

FORMATO N°12-B

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2022 PIM: S/8,836,297.00

Ejecutora presupuestal: REGION HUANUCO-TRANSPORTES

Programación Financiera (mensual) **Programación Financiera (anual)**

Costo Actualizado	Devengado acumulado (al año anterior)	PIM	Saldo
79,748,213.12	12,242,207.98	8,836,297.00	58,669,708.14

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2023	19400000
2024	39,669,708.14
TOTAL:	58,669,708.14

Guardar

La visualización de los años de la programación financiera (anual), se encuentra vinculados a los plazos de la programación de ejecución de la inversión registrados en el Formato N° 08

Registro del Formato N° 12-B

La lista desplegable de las Unidades ejecutoras Presupuestales que se muestra en la sección del avance financiero del Formato N° 12-B, corresponden a información de la consulta amigable (SIAF) que presentan asignación presupuestal en el año fiscal.

SSI	
IV. UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)	
UNIDADES EJECUTORAS	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA	2022 0.00 56,951.00
ADMINISTRACION - INAIGEM	632,494.01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	5,316,924.09
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	144,228.00
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	0.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU	1,401,604.02
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI	469,749.5
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	325,431.62
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	179,676.64
INICTEL- UNI	1,886,645.06

FORMATO N°12-B

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2022

Ejecutora presupuestal:

- UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
- UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
- ADMINISTRACION - INAIGEM
- OFICINA DE ADMINISTRACION-IMARPE
- INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP
- UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
- UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA- F
- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
- UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Programación Financiera (mensua

Programación

Periodo

TOTAL:

Guardar

Cancelar

Registro del Formato N° 12-B

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2022

Ejecutora presupuestal:

PIM: 0

Programación Financiera (mensual) | Programación Financiera (anual)

Programación Financiera	
Periodo	Monto (Soles)
TOTAL:	S/.

Guardar

Programación Financiera Actualizada	
Periodo	Monto (Soles)
2022-01	0
2022-02	922542.43
2022-03	197701.27
2022-04	190073.68
2022-05	176587.12
2022-06	169955.21
2022-09	0
2022-10	0
2022-11	0
2022-12	0
TOTAL:	S/1,959,970.53

Guardar

Inversiones sin PIA/PIM 2022 se registran la programación financiera actualizada a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.) cada vez que se requiera.

Guarda la información registrada

IMPORTANTE:
Se puede reprogramar montos mayores al PIM

Guardar

¡No te lo pierdas!



Capacitaciones virtuales



Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas



Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.



Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el Ciclo de Inversión Pública



¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>

¡No te dejes engañar!

Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>



Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

¡Mantente atento y contácta a los verdaderos especialistas !





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe



Siempre
con el pueblo

¡Muchas gracias!
