



Ministerio  
de Economía y Finanzas

invierte.pe



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

# Seguimiento a la ejecución de inversiones - Formato N° 12-B



# Capacidad

---

Promover el uso del SSI y Reporte del Formato N° 12-B, para el seguimiento a la ejecución de inversiones.

# Contenidos

---

1. Seguimiento de inversiones

Formato N°12-B seguimiento a la ejecución de inversiones

2. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

3. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B



## **Seguimiento de inversiones**

---

# 1. Seguimiento de inversiones

## ¿QUÉ ES SEGUIMIENTO?

El seguimiento es una función continua que utiliza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores especificados para proporcionar a los administradores y a las partes interesadas principales de una intervención para el desarrollo, indicaciones sobre el avance y el logro de los objetivos<sup>1</sup>.

## ¿CUÁL ES SU OBJETO?

Tiene por objeto el seguimiento y evaluación del avance y cumplimiento del cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios de la cartera de inversiones, a la ejecución y entrega de servicios a la población, la retroalimentación para la mejora continua de la aplicación del ciclo de inversiones y a la rendición de cuentas de los recursos públicos de inversión<sup>2</sup>.



<sup>1</sup>Según el glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados de la OCDE 2002.

<sup>2</sup>DL N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Artículo 11, Numeral 11.1

# 1. Seguimiento de inversiones

## Formato N°12-B seguimiento a la ejecución de inversiones

### Definición

Es una herramienta de gestión que permite el seguimiento a las inversiones, en base a la información proporcionada por la UEI y los sistemas administrativos vinculados a la toma de decisiones.

### Finalidad

Brindar información de la situación actual de las inversiones en la fase de Ejecución.

### ¿Quién registra?


La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

### ¿Qué se registra?

Información sobre la ejecución de cada inversión de la entidad.

### ¿Plazo de registro?

Dentro de los primeros (10) días del mes siguiente al vencimiento del periodo.

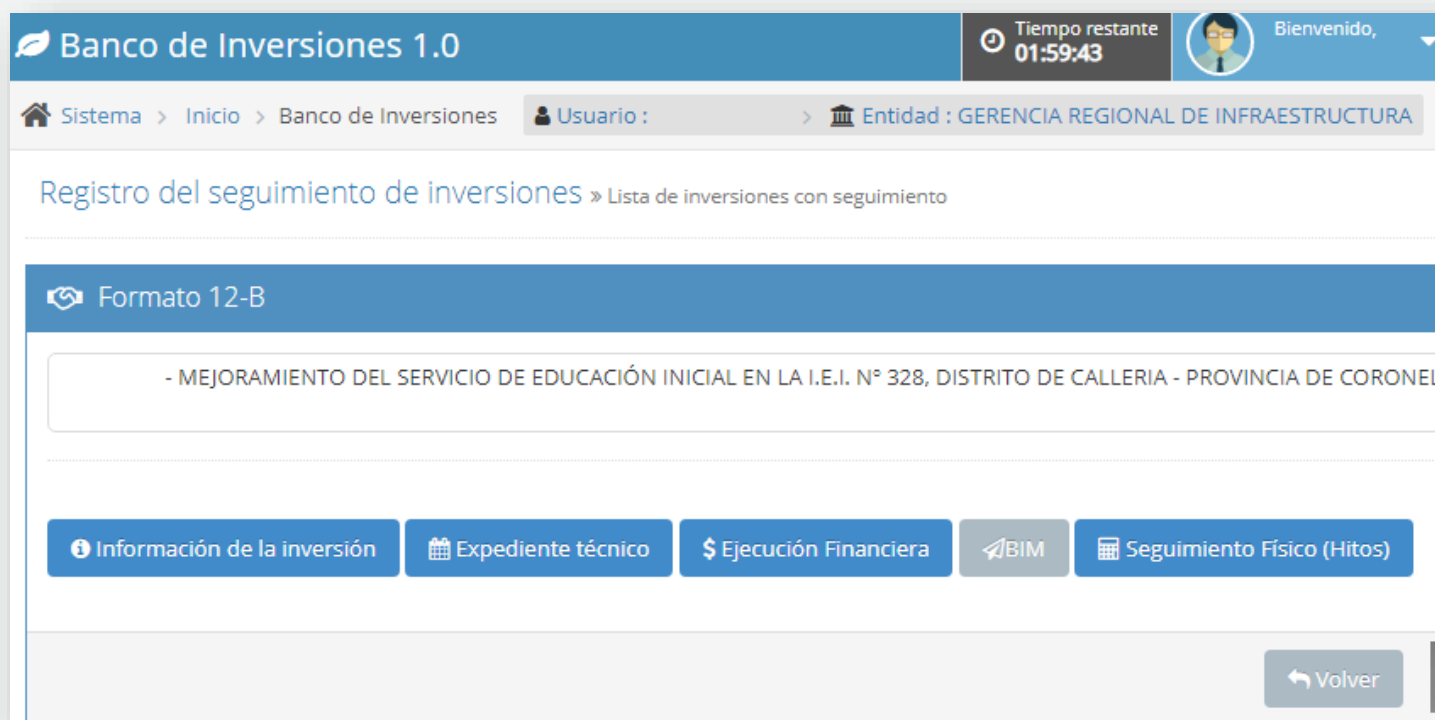

The screenshot displays the 'Banco de Inversiones 1.0' web application. The top header bar is blue and contains the title 'Banco de Inversiones 1.0', a clock showing 'Tiempo restante 01:59:43', and a user profile icon with the text 'Bienvenido,'. Below the header, a breadcrumb trail reads 'Sistema > Inicio > Banco de Inversiones'. To the right of the breadcrumbs, it shows 'Usuario : ' followed by a dropdown arrow, and 'Entidad : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA'. The main content area is titled 'Registro del seguimiento de inversiones' with a link to 'Lista de inversiones con seguimiento'. Below this, a blue bar indicates 'Formato 12-B'. A text box contains the investment description: '- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N° 328, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL'. At the bottom, there is a row of five buttons: 'Información de la inversión' (with an info icon), 'Expediente técnico' (with a document icon), 'Ejecución Financiera' (with a dollar sign icon), 'BIM' (with a 3D icon), and 'Seguimiento Físico (Hitos)' (with a calendar icon). A 'Volver' button with a back arrow is located in the bottom right corner.

# 1. Seguimiento de inversiones

## Formato N°12-B seguimiento a la ejecución de inversiones (secciones)



**Nota:** B, C y D de la sección ejecución física no corresponde para bienes y servicios.





## **Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B**

---

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B


## ¿Qué es el reporte de Seguimiento?

Es una **herramienta de seguimiento de acceso público** que brinda información consolidada de la inversión en fase de ejecución, así como el avance físico y financiero, situación, riesgos y/o problemáticas asociados a la inversión. Cabe mencionar que la información es registrada por la UEI.

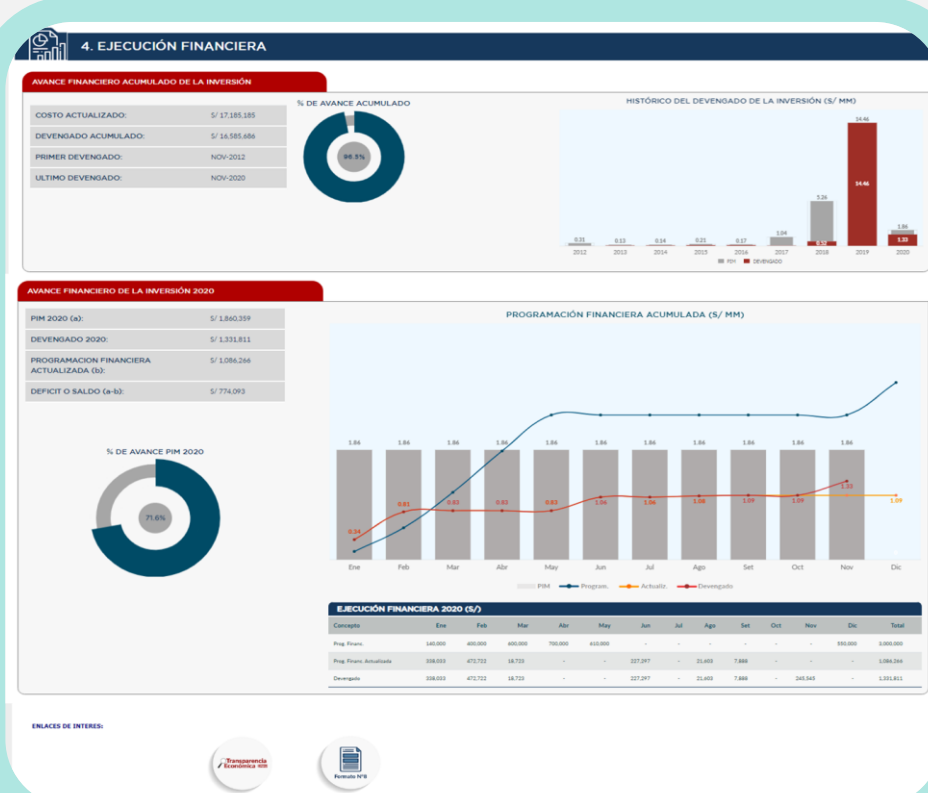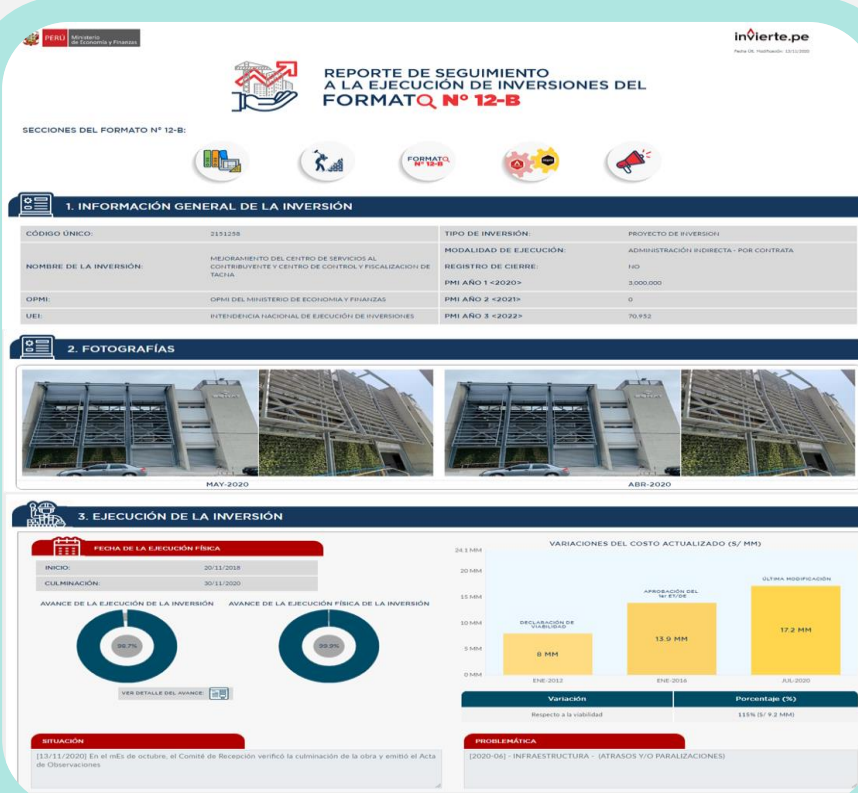


## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Acceso al reporte



1

Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF”. Luego, ingresar en la primera opción resultante.



2

Presionar la opción “Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)”

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Acceso al reporte

- 3 Ingresar el CUI, nombre o ubicación de la inversión.
- 4 Hacer clic en el icono verde

3

 **SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES**

Opciones de búsqueda







 Vista Resumen









|                        |         |   |                       |                                     |
|------------------------|---------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO ÚNICO           | 2515199 | CÓDIGO SNIP   | 2515199               | FECHA DE REGISTRO                   |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN |         | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CUZCO ENTRE LOS JIRONES DE ORCOTUNA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN |                       |                                     |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN | ACTIVO  | TIPO DE INVERSIÓN   | PROYECTO DE INVERSIÓN | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? |

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

|  |  |   |             |
|--|--|---|-------------|
| ¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE? | SI  | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a) | 1,047,538.2 |
| ¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?                    | SI  | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)      | 0.00        |
| REGISTRO DE CIERRE                                 | NO   | MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c)          | 0.00        |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN                       | 01/07/2021   | FECHA DE EJECUCIÓN                      | 04/05/2022  |
|  |  | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)   | 1,047,538.2 |



**REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B**

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

|                         |   |                         |   |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| CÓDIGO ÚNICO:           | 2354781   | TIPO DE INVERSIÓN:      | PROYECTO DE INVERSIÓN   |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN: | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAYEL; DISTRITO DE ASCENSION. PROVINCIA DE HUANCAYEL Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYEL | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADMINISTRACIÓN DIRECTA ADMINISTACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA |
| OPMI:                   | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAYEL  | PMI AÑO 1 <2023>        | 76,061,435  |
|                         |   | PMI AÑO 2 <2024>        | 3,300,000   |

2. FOTOGRAFÍAS



3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

08/07/2019

CULMINACIÓN:

21/01/2023

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (I)

35.5%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (I)

35.4%

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (S/ MM)

|                           |                          |                     |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| DECLARACIÓN DE VIABILIDAD | APROBACIÓN DEL 1er ET/DE | ÚLTIMA MODIFICACIÓN |
| 2811 MM                   | 315 MM                   | 342.9 MM            |
| JUN-2017                  | OCT-2018                 | JUL-2020            |

Variación

Porcentaje (%)

Desviación a la viabilidad

77% (S/ A1.1)

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Objetivos



Brindar información transparente, efectiva y eficiente de fácil acceso al público en general.

Proporcionar Información relevante sobre la ejecución de la inversión (avances físicos y financieros de la inversión) de una manera resumida y práctica.

Contribuir a mejorar la gestión de la ejecución de las inversiones.

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Estructura del reporte



### Botones de acceso rápido

- Expediente Técnico/Documento Equivalente
- Avance Físico
- Formato N° 12-B
- Contrataciones
- Infobras (en implementación)

### 1. Información General de la Inversión


### 2. Fotografías

### 3. Ejecución de la Inversión

- Avance de la inversión y avance físico
- Variaciones del Costo Actualizado
- Situación de la inversión y el histórico
- Problemática

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Estructura del reporte

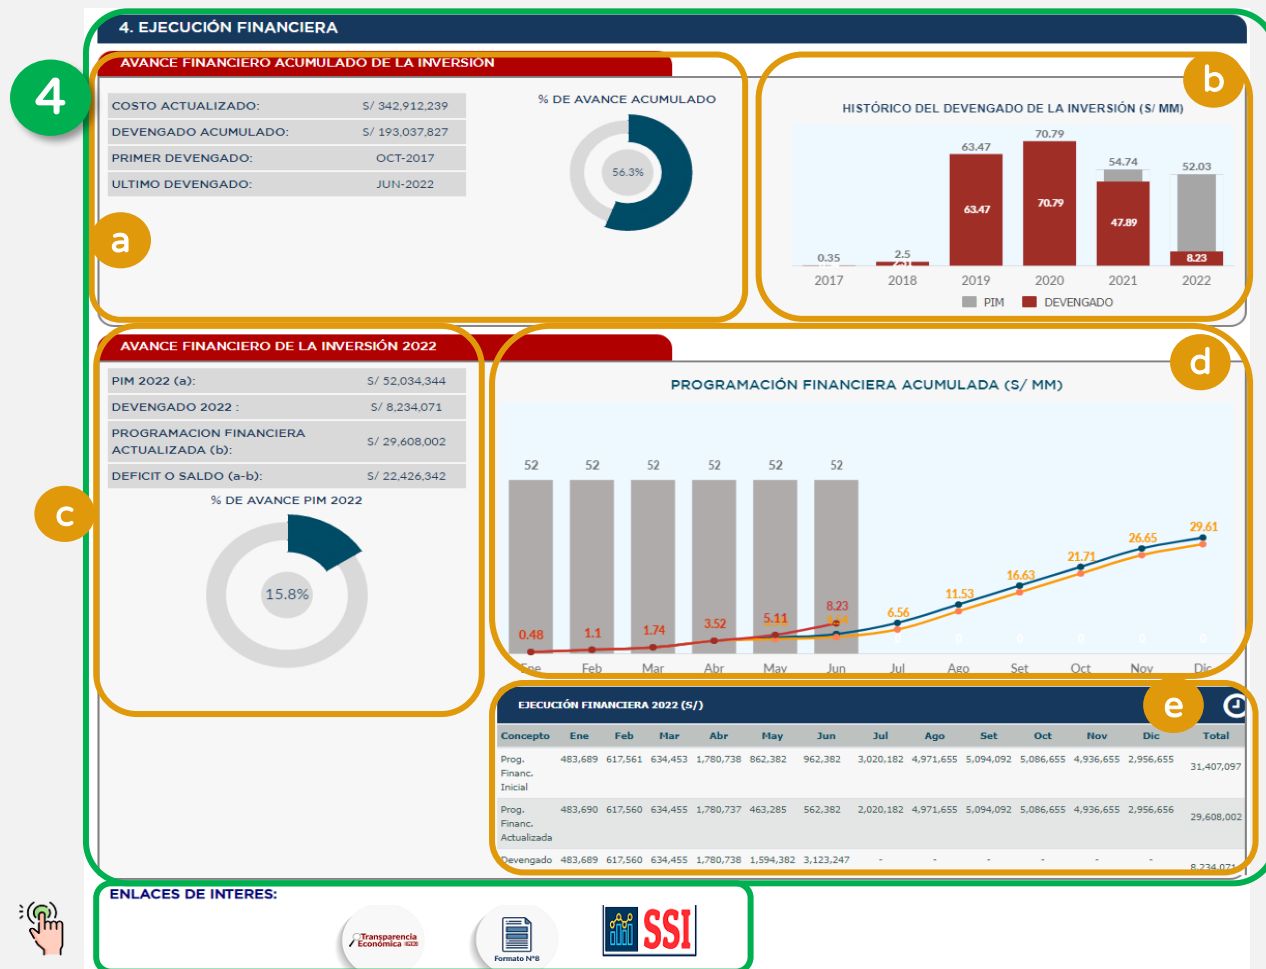

### 4. Ejecución financiera

- a) Avance financiero acumulado de la inversión
- b) Histórico del devengado de la inversión
- c) Avance financiero de la inversión 2022
- d) Programación financiera acumulada
- e) Ejecución financiero 2022

### Enlaces de interés

- Formato N° 08
- SSI

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Botones de acceso rápido

### EXPEDIENTE TÉCNICO/ DOCUMENTO EQUIVALENTE



Fecha Últ. Modificación: 04/11/2020



REPORTE DE SEGUIMIENTO  
A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL  
**FORMATO N° 12-B**

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



Expediente Técnico o  
Documento Equivalente

EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código Único:

2151258

Tipo de Inversión:

PIP MAYOR (SNIP)

Nombre de la Inversión:

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

EXPEDIENTE TÉCNICO : 1

EXPEDIENTE TÉCNICO POR AI

ESTADO SITUACIONAL DEL ET/DE

ANTECEDENTES

COMENTARIO


DESCARGA SUSTENTO

LA INVERSION CUENTA CON 5 EXPEDIENTE TECNICOS DE LOS CUALES EL PRESENTE ET CORRESPONDE AL V



# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Expediente técnico / Documento equivalente

- 1
- Se visualiza el reporte de los múltiples ET/DE.
- 2
- Seleccionar  para ver el detalle del registro de ET/DE.

Código Único:

2310861

Nombre de la Inversión:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO

Tipo de Inversión:

PIP MAYOR (SNIP)

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

1

EXPEDIENTE TÉCNICO : 6

| Descripción   | Fecha de Registro | Modalidad de Ejecución                           | Ver Detalle            |
|---|-------------------|--|------------------------|
| ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL TRAMO III                      | 25/07/2020        | ADMINISTRACION INDIRECTA - IGUAL O MENOR A 8 UIT | <div><div></div></div> |
| OBRAS CON LA EMPRESA Y LA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO III | 25/07/2020        | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS   | <div><div></div></div> |
| EXPEDIENTE TÉCNICO ENDEUDAMIENTO  | 24/07/2020        | ADMINISTRACION INDIRECTA - ENDEUDAMIENTO         | <div><div></div></div> |
| EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA TRAMO I                                | 24/07/2020        | ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATACION DIRECTA  | <div><div></div></div> |
| EXPEDIENTE TÉCNICO DEL TRAMO III  | 24/07/2020        | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                           | <div><div></div></div> |
| EXPEDIENTE TECNICO DEL TRAMO I  | 17/07/2020        | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                           | <div><div></div></div> |

1

| Tipo de Documento         | Descripción                       | Fecha de Registro | Modalidad de Ejecución                          | Ver Detalle            |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|------------------------|
| Especificaciones Técnicas | CONTRATACIÓN DIRECTA DEL TRAMO IV | 25/07/2020        | ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATACION DIRECTA | <div><div></div></div> |
| Especificaciones Técnicas | SALDO DE OBRA DEL TRAMO II        | 17/07/2020        | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                          | <div><div></div></div> |

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Expediente técnico / Documento equivalente

- 3 Se visualiza el estado situacional del ET/DE registrado, hacer clic en el ícono  para descargar la información detallada.

EXPEDIENTE TECNICO

Código Único:2310861

Nombre de la Inversión:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO

Descripción:EXPEDIENTE TÉCNICO ENDEUDAMIENTO

ADMINISTRACION INDIRECTA - ENDEUDAMIENTO

3

| ETAPA                      | HITO                                | FECHA PROGRAMADA | FECHA ACTUALIZADA | ESTADO   | COMENTARIO   |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------|--|
| ACTIVIDADES PREVIAS        | Inicio de actividades Previas       | 01/07/2020       | 02/07/2020        |          | INICIO DE ACTIVIDADES PREVIAS                            |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Publicidad                          | 01/07/2020       | 02/07/2020        |          | SE PRESENTO EL REQUERIMIENTO AL AREA ENCARGADA           |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Recepción de expresiones de interés | 02/07/2020       | 04/08/2020        |          | SE RECIBIERON LAS SOLICITUDES EN LA OFICINA DE LOGISTICA |
| ELABORACIÓN DEL ET         | Entregable 1                        | 01/07/2020       | 02/07/2020        | APROBADO | ENTREGABLE 1 APROBADO                                    |
| ELABORACIÓN DEL ET         | Entregable 2                        | 02/07/2020       | 03/07/2020        | APROBADO | ENTREGABLE 2 APROBADO                                    |
| ELABORACIÓN DEL ET         | Entregable 3                        | 03/07/2020       | 04/07/2020        | APROBADO | ENTREGABLE 3 APROBADO                                    |
| ELABORACIÓN DEL ET         | Entregable 4                        | 04/07/2020       | 05/07/2020        | APROBADO | ENTREGABLE 4 APROBADO                                    |

PROBLEMÁTICA

| FECHA      | TIPO DE PROBLEMA | COMENTARIO              |
|------------|------------------|-------------------------|
| 27/07/2020 | OTROS            | PROBLEMAS CON CONSULTOR |

ANTECEDENTES

COMENTARIO

DESCARGA SUSTENTO

LA INVERSION CUENTA CON 5 EXPEDIENTE TECNICOS DE LOS CUALES EL PRESENTE ET CORRESPONDE AL V



## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

Botones de acceso rápido

### EJECUCIÓN FÍSICA




Fecha Últ. Modificación: 04/11/2020



REPORTE DE SEGUIMIENTO  
A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL  
FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:





EJECUCION FISICA


|                         |   |                         |   |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| Código Único:           | 2324655   | Tipo de Inversión:      | PIP MAYOR (SNIP)                        |
| Nombre de la Inversión: | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACION DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL | Modalidad de Ejecución: | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA |

BIENES : 15

| Item | Fecha de Registro | Descripción   | Modalidad de Ejecución                   | Tipo de proceso                       | Etapas - Hito   | Ver |
|------|-------------------|---|--|---------------------------------------|---|-----|
| 1    | 15/06/2021        | 1. RENOVACIÓN DE EQUIPOS PKI - STORAGE SAN - LOTE 01 - P07  | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | EJECUCIÓN FÍSICA - INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN                 |     |
| 2    | 15/07/2021        | 7. RENOVACIÓN DE EQUIPOS PKI - SERVICIO DE IMPLEMENTACION ONLINE CERTIFICATE STATUS PROTOCOL (OSCP) - LOTE 07 - P07                   | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | EJECUCIÓN FÍSICA - CULMINACIÓN DE CONTRATO                      |     |
| 3    | 15/07/2021        | 6. RENOVACIÓN DE EQUIPOS PKI - SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE TIME STAMPING (TSA) EN ALTA DISPONIBILIDAD - LOTE 06 - P07                 | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | EJECUCIÓN FÍSICA - CULMINACIÓN DE CONTRATO                      |     |
| 4    | 14/07/2021        | 4. RENOVACIÓN DE EQUIPOS PKI - SERVICIO DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO PARA CENTRO DE DATOS - LOTE 04 - P07 | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | EJECUCIÓN FÍSICA - CULMINACIÓN DE CONTRATO                      |     |
| 5    | 14/07/2021        | 5. RENOVACIÓN DE EQUIPOS PKI - EQUIPOS CRIPTOGRAFICOS - LOTE 05 - P07   | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | EJECUCIÓN FÍSICA - CULMINACIÓN DE CONTRATO                      |     |
| 6    | 08/07/2021        | 3. RENOVACIÓN DE EQUIPOS PKI - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES EN ALTA DISPONIBILIDAD - LOTE 03 - P07                        | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | EJECUCIÓN FÍSICA - INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN                 |     |
| 7    | 13/08/2021        | 9. RENIEC CON SERVIDORES RENOVADOS PARA EL SOPORTE INFORMÁTICO - P20  | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | EJECUCIÓN FÍSICA - ENTREGABLE 4                                 |     |
| 8    | 12/08/2021        | 8. OFICINAS DE RENIEC Y EQUIPOS ITINERANTES CON LOGÍSTICA ADECUADA (P06 -P14)   | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | EJECUCIÓN FÍSICA - CULMINACIÓN DE CONTRATO                      |     |
| 9    | 14/10/2021        | 10. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE ATENCIÓN (P05)  | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) |   |     |
| 10   | 15/10/2021        | 16. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL RENIEC (P11)   | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | ACTUACIONES PREPARATORIAS - APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |     |

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Ejecución física

- 1 Para visualizar la información del avance físico y las modificaciones de estas, deberá presionar en “ver detalle” 

EJECUCION FISICA

Código Único:

2310861

Tipo de Inversión:

PIP MAYOR (SNIP)

Nombre de la Inversión:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

OBRAS :

2

| Item | Fecha de Registro | Descripción  | Modalidad de Ejecución                   | Tipo de proceso                       | Etapa - Hito1   | Ver   |
|------|-------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|
| 1    | 16/04/2021        | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA – I ETAPA  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA  | LICITACIÓN PÚBLICA                    | EJECUCIÓN CONTRACTUAL - SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                |  |
| 2    | 12/04/2021        | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA – II ETAPA | ADMINISTRACION INDIRECTA - Endeudamiento | REGIMEN ESPECIAL (LICITACIÓN PÚBLICA) | ACTUACIONES PREPARATORIAS - APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |

**IMPORTANTE:**  
Para el objeto contractual de Obras se visualizara las siguientes secciones:

- ✓ Hitos
- ✓ Avance físico
- ✓ Cronograma
- ✓ Modificaciones contractuales
- ✓ Ampliación de plazo

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Ejecución física

2

Se visualizara la ventana con información específica del objeto contractual, para ello se dispone de 5 secciones (Hitos del objeto, avance físico, cronograma, modificaciones contractuales y ampliación de plazo).

2

EJECUCION FISICA

|                              |  |                         |  |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| Código Único:                | 2310861                                  | Nombre de la Inversión: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO |
| Descripción del seguimiento: | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA IE 001 | Modalidad de Ejecución: | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA  |
| Objeto:                      | OBRAS - CONTRATA                         | Tipo de proceso:        | LICITACIÓN PÚBLICA   |

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

Datos generales del objeto contractual

- ✓ Código único de inversión
- ✓ Nombre de la inversión
- ✓ Descripción del seguimiento
- ✓ Modalidad de ejecución
- ✓ Objeto contractual
- ✓ Tipo de proceso

Secciones para el objeto obras

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Ejecución física

3

HITOS DEL OBJETO

Hitos del objeto contractual

En esta sección podremos encontrar información de las etapas, hitos, fecha programada y actualizada, estado y comentarios registrados por la UEI.

3

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA ACTUALIZADO


MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

ETAPAS - HITOS

| Etapas                     | Hitos                         | Fecha Programada | Fecha Actualizada | Estado                   | Comentarios |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| ACTUACIONES PREPARATORIAS  | REQUERIMIENTO CON ET APROBADO | 01/06/2021       | 01/06/2021        | NO SOLICITADO            |             |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | CONVOCATORIA                  | 15/06/2021       | 15/06/2021        |                          |             |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | INTEGRACIÓN DE LAS BASES      | 01/07/2021       | 01/07/2021        |                          |             |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  | 16/08/2021       | 16/08/2021        |                          |             |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL      | SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO      | 25/09/2021       | 25/09/2021        |                          |             |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL      | INICIO DE OBRA                | 01/10/2021       | 01/10/2021        | EN PROCESO               |             |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL      | CULMINACIÓN DE OBRA           | 31/03/2022       | 31/03/2022        | SIN RECEPCIONAR          |             |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL      | LIQUIDACIÓN                   | 30/04/2022       | 30/04/2022        | PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN |             |

LINEA DE TIEMPO



## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Ejecución física

4

#### AVANCE FÍSICO

### Avance físico

Esta sección brinda información registrada por la UEI sobre valorizaciones (principal, adicional, mayores gastos generales y mayores metrados), el estado situacional, comentarios y riesgos/problemáticas asociados al periodo.

Del mismo modo, se puede realizar descargas de las valorizaciones y fotografías.

4

| HITOS DEL OBJETO          |                         | AVANCE FÍSICO |                | PROGRAMA ACTUALIZADO |                       | MODIFICACIONES CONTRACTUALES |                             | AMPLIACIÓN DE PLAZO                          |             |   |
|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------|---|
| RESUMEN DE VALORIZACIONES |                         |               |                |                      |                       |                              |                             |  |             |   |
| Periodo<br>(año-mes)      | Obra Principal          |               |                |                      | Adicional             | Mayores<br>Metrados          | Mayores Gastos<br>Generales | Estado Situacional                           | Comentarios | Ver riesgos y<br>Problemáticas          |
|                           | Programado<br>Acumulado |               | Real Acumulado |                      | Aprobado<br>Acumulado |                              |                             |  |             |   |
|                           | (%)                     | (\$/)         | (%)            | (\$/)                | (\$/)                 |                              |                             |  |             |   |
| 2021-10                   | 96.53%                  | 14,468,103.45 | 90.35%         | 13,541,379.02        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                        | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)               |             |   |
| 2021-09                   | 92.27%                  | 13,828,610.81 | 84.37%         | 12,645,115.09        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                        | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)               |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-08                   | 88.28%                  | 13,231,374.11 | 82.83%         | 12,414,304.64        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                        | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)               |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-07                   | 78.55%                  | 11,773,431.49 | 74.81%         | 11,212,291.8         | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-06                   | 65.68%                  | 9,843,530.1   | 63.13%         | 9,461,729.47         | 0.00                  | 0.00                         | 350,000.00                  | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-05                   | 53.79%                  | 8,061,219.48  | 49.76%         | 7,457,875.15         | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             |   |
| 2021-04                   | 41.14%                  | 6,166,534.00  | 43.28%         | 6,486,672.76         | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-03                   | 31.72%                  | 4,753,433.85  | 35.23%         | 5,280,163.62         | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-02                   | 25.88%                  | 3,878,511.51  | 26.62%         | 3,989,723.4          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-01                   | 18.95%                  | 2,839,540.39  | 20.76%         | 3,111,444.7          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Ejecución física

5 Para ver el detalle del Adicional, Mayores gastos generales y Mayores metrados, hacer clic en el periodo.

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

PROGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

RESUMEN DE VALORIZACIONES

| Periodo<br>(año-mes) | Obra Principal          |               |                |               | Adicional             | Mayores<br>Metrados | Mayores Gastos<br>Generales | Estado Situacional                        | Comentarios | Ver riesgos y<br>Problemáticas |
|----------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------|--------------------------------|
|                      | Programado<br>Acumulado |               | Real Acumulado |               | Aprobado<br>Acumulado |                     |                             |   |             |                                |
|                      | (%)                     | (S/)          | (%)            | (S/)          | (S/)                  |                     |                             |   |             |                                |
| 2021-10              | 97.00%                  | 14,468,103.00 | 90.00%         | 13,541,379.00 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)            |             |                                |
| 2021-09              | 92.00%                  | 13,828,611.00 | 84.00%         | 12,645,115.00 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)            |             |                                |
| 2021-08              | 88.00%                  | 13,231,374.00 | 83.00%         | 12,414,305.00 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)            |             |                                |
| 2021-07              | 79.00%                  | 11,773,431.00 | 75.00%         | 11,212,292.00 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) |             |                                |
| 2021-06              | 5.84%                   | 9,843,530.00  | 63.00%         | 9,461,729.00  | 0.00                  | 0.00                | 350,000.00                  | CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) |             |                                |
| 2021-05              | 54.00%                  | 8,061,219.00  | 50.00%         | 7,457,875.00  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%) |             |                                |

ADICIONAL

| Periodo | Programado Acumulado |        | Real Acumulado |        | Numero de modificación | Comentarios |
|---------|----------------------|--------|----------------|--------|------------------------|-------------|
|         | (%)                  | (S/)   | (%)            | (S/)   |                        |             |
| 2020-01 | 1.00 %               | 3.00   | 2.00 %         | 4.00   | DEDUCTIVO N° 15        | 444         |
| 2020-01 | 100.00 %             | 100.00 | 100.00 %       | 100.00 | ADICIONAL DE OBRA N° 1 | GVHB,JK     |

MAYORES METRADOS


| Periodo | Monto Acumulado (S/) | Numero de modificación | Comentarios |
|---------|----------------------|------------------------|-------------|
| 2020-01 | 80.00                | MAYORES METRADOS N° 1  | GCHGV       |
| 2020-01 | 100.00               | MAYORES METRADOS N° 10 | VH          |

MAYORES GASTOS GENERALES

| Periodo | Monto Acumulado (S/) | Numero de modificación        | Comentarios  |
|---------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| 2020-01 | 100,000,000.00       | MAYORES GASTOS GENERALES N° 2 | KVDSFKLFDAMV |
| 2020-01 | 15.00                | MAYORES GASTOS GENERALES N° 3 | MM3          |

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Ejecución física

6 Para visualizar la valorización y fotografía registrada, hacer clic en   respectivamente

HITOS DEL OBJETO

**AVANCE FÍSICO**

PROGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

RESUMEN DE VALORIZACIONES

| Periodo<br>(año-mes) | Obra Principal          |               |                |               | Adicional<br>Aprobado<br>Acumulado<br>(S/) | Mayores<br>Metrados<br>(S/) | Mayores Gastos<br>Generales<br>(S/) | Estado Situacional             | Comentarios | Ver riesgos y<br>Problemáticas  |
|----------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|---|
|                      | Programado<br>Acumulado |               | Real Acumulado |               |  |                             |                                     |                                |             |   |
|                      | (%)                     | (S/)          | (%)            | (S/)          |  |                             |                                     |                                |             |   |
| 2021-10              | 97.00%                  | 14,468,103.00 | 90.00%         | 13,541,379.00 | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00                                | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%) |             |  |



| RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 04  |                          |                    |   |        |                |        |                  |        |                  |        |                   |
|--|--------------------------|--------------------|---|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|
| PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8639 DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH |                          |                    |   |        |                |        |                  |        |                  |        |                   |
| UBICACIÓN: HUARI - CAJAY - CAJAY   |                          |                    | PERIODO : AGOSTO 2018                             |        |                |        |                  |        |                  |        |                   |
| PRO. BASE: SI: 8'188,812.81  |                          |                    | RESIDENTE : ING. JORGE QUIRÓNEZ RODRIGUEZ         |        |                |        |                  |        |                  |        |                   |
| PRO. CORRECTOR: SI: 8'187,141.00   |                          |                    | SUPERVISOR: ING. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI |        |                |        |                  |        |                  |        |                   |
| FINANCIA : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH   |                          |                    | FECHA DE INICIO DE OBRA : 22/05/2018              |        |                |        |                  |        |                  |        |                   |
| EJECUTORA : CONSORCIO SAN PEDRO  |                          |                    | PLAZO DE EJECUCION : 340 DIAS                     |        |                |        |                  |        |                  |        |                   |
| FACTOR DE RELACION: 0.88789  |                          |                    | FECHA DE TERMINO DE OBRA : 18/01/2019             |        |                |        |                  |        |                  |        |                   |
| ITEM   | SUB PRESUPUESTO          | MONTO DEL CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR                                |        | AVANCE DEL MES |        | ACUMULADO ACTUAL |        | SALDO            |        | AVANCE PROGRAMADO |
|  |                          |                    | MONTO   | %      | MONTO          | %      | MONTO            | %      | MONTO            | %      |                   |
| 1  | ESTRUCTURAS              | 2,504,051.44       | 978,676.98  | 38.88% | 278,668.03     | 11.13% | 1,257,345.00     | 50.00% | 1,242,307.46     | 50.00% | -                 |
| 2  | ANILLOTES                | 1,951,127.55       | 587,008.04  | 30.08% | 207,338.00     | 10.62% | 794,346.04       | 40.68% | 1,156,781.51     | 59.32% | -                 |
| 3  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 275,187.35         | 5,477.95  | 1.99%  | 5,576.35       | 2.03%  | 11,054.31        | 4.02%  | 264,133.04       | 95.98% | -                 |
| 4  | INSTALACIONES BARRERAS   | 236,904.38         | 38,718.53   | 16.34% | 11,029.68      | 4.66%  | 49,748.31        | 21.00% | 187,156.07       | 79.00% | -                 |
| 5  |                          |                    |   |        |                |        |                  |        |                  |        |                   |
| 6  | SUB TOTAL                | 4,970,062.78       | 1,169,891.60                                      | 23.52% | 822,812.86     | 12.81% | 1,969,294.45     | 39.61% | 3,000,768.33     | 60.39% | -                 |
| 7  | IMP. IPTU                | 886,048.82         | 214,222.69  | 24.18% | 112,079.31     | 12.51% | 326,499.00       | 36.73% | 559,549.82       | 63.27% | -                 |
| TOTAL  |                          | SI: 5,856,111.60   | SI: 1,384,114.29                                  |        | SI: 934,892.17 | 12.81% | SI: 2,295,793.45 | 39.33% | SI: 3,560,318.15 | 63.67% |                   |

CONSORCIO SAN PEDRO

CONSORCIO DE INGENIEROS DEL PERU



# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Ejecución física

7 Para ver el riesgo/problemática presionar el icono 

4

| HITOS DEL OBJETO | AVANCE FÍSICO | CRONOGRAMA ACTUALIZADO | MODIFICACIONES CONTRACTUALES | AMPLIACIÓN DE PLAZO |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------------|
|------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------------|

RESUMEN DE VALORIZACIONES

| Periodo<br>(año-mes) | Obra Principal          |               |                |               | Adicional             | Mayores<br>Metrados | Mayores Gastos<br>Generales | Estado Situacional                           | Comentarios | Ver riesgos y<br>Problemáticas          |
|----------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------|---|
|                      | Programado<br>Acumulado |               | Real Acumulado |               | Aprobado<br>Acumulado |                     |                             |  |             |   |
|                      | (%)                     | (S/)          | (%)            | (S/)          | (S/)                  |                     |                             |  |             |   |
| 2021-10              | 97.00%                  | 14,468,103.00 | 90.00%         | 13,541,379.00 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)               | 7           |   |
| 2021-09              | 92.00%                  | 13,828,611.00 | 84.00%         | 12,645,115.00 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)               |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-08              | 88.00%                  | 13,231,374.00 | 83.00%         | 12,414,305.00 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO ATRASADO < (5% - 20%)               |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-07              | 79.00%                  | 11,773,431.00 | 75.00%         | 11,212,292.00 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-06              | 66.00%                  | 9,843,530.00  | 63.00%         | 9,461,729.00  | 0.00                  | 0.00                | 350,000.00                  | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             | No se identifica<br>Riesgo/Problemática |
| 2021-05              | 54.00%                  | 8,061,219.00  | 50.00%         | 7,457,875.00  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                        | CONTRATO DENTRO DE LO<br>PROGRAMADO (+/- 5%) |             |   |

| RIESGOS Y/O PROBLEMATICAS |                       |  | X |
|---------------------------|-----------------------|--|---|
| Periodo                   | Riesgo/Problemática   |  |   |
| 2021-10                   | Problemática          | DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES     |   |
|                           | Ambito                | FACTORES EXTERNOS                          |   |
|                           | Descripción           | DEMORA EN LLEGADA DE ASCENSOR              |   |
|                           | Medidas de mitigación | MONITOREAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN       |   |
|                           | Entidad Responsable   | GOBIERNO REGIONAL                          |   |
|                           | Comentarios           | GR. INFRAESTRUCTURA MONITOREAR ADQUISICIÓN |   |

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Ejecución física

8

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

#### Cronograma actualizado

Esta sección brinda información registrada por la UEI sobre los cronogramas de la obra (descripción, fecha de inicio, fecha de termino, la descarga del cronograma y un enlace para ver el detalle del cronograma).

8




HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO


CRONOGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

| Item | Descripción             | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Cronograma aprobado   | Ver Detalle   |
|------|-------------------------|-----------------|------------------|---|---|
| 1    | CRONOGRAMA 1            | 16/07/2020      | 11/11/2021       |  |  |
| 2    | CRONOGRAMA ACCELERADO 1 | 01/12/2020      | 30/11/2021       |  |  |

Comparativo de cronogramas (Inicial y vigente)

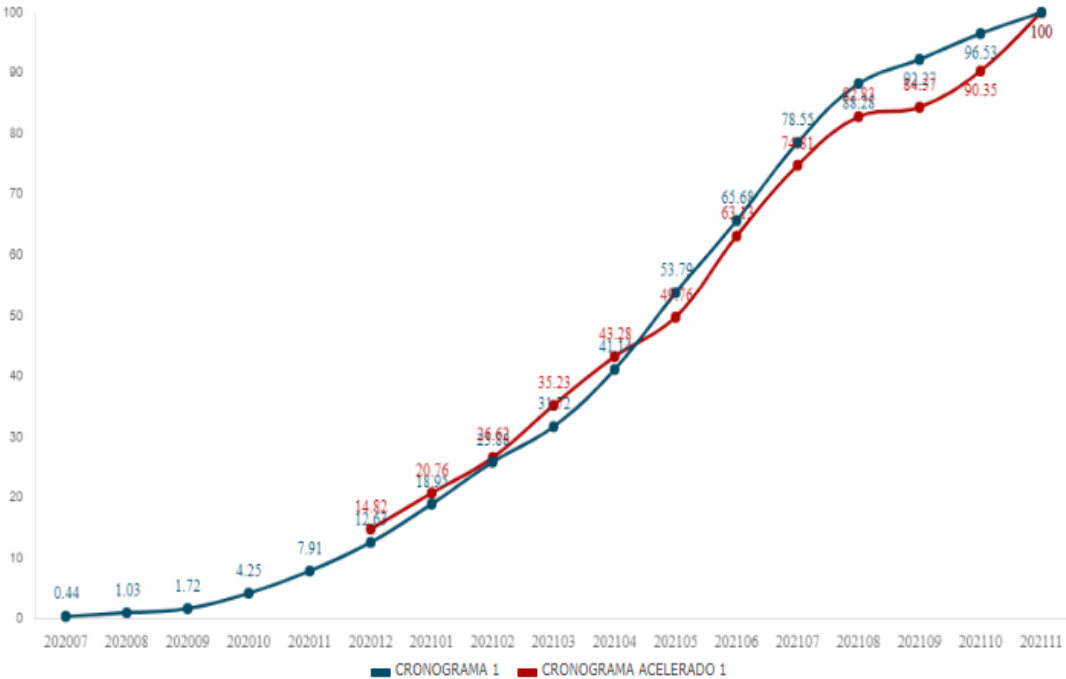

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Ejecución física

9

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

### Modificaciones contractuales

Esta sección brinda información de:

- A. Resumen de las modificaciones durante la ejecución contractual.
- B. El detalle de las modificaciones aprobadas, las causales, fecha de aprobación, % de aprobación respecto al contrato principal, Monto en soles y la descarga de documentos.

9

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

#### RESUMEN

|                                  |   |   |              |
|----------------------------------|---|---|--------------|
| Nº DE ADICIONALES/DEDUCTIVOS :   | 1 | MONTO TOTAL DE ADICIONAL/DEDUCTIVO :      | 1,500,000.00 |
| Nº DE REDUCCIONES :              | 0 | MONTO TOTAL DE REDUCCIONES :              | 0.00         |
| Nº DE MAYORES GASTOS GENERALES : | 1 | MONTO TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES : | 125,000.00   |
| Nº DE MAYORES METRADOS :         | 1 | MONTO TOTAL DE MAYORES METRADOS :         | 15,000.00    |

#### ADICIONALES/DEDUCTIVOS

| Nº adicional | Tipo de adicional/Deductivo | Causales                                  | Fecha de Aprobación | % respecto al contr. principal | Monto S/     | Descarga  |
|--------------|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------|---|
| 1            | ADICIONAL DE OBRA           | POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | 27/08/2020          | 15.00 %                        | 1,500,000.00 |  |

#### MAYORES GASTOS GENERALES

| Nº de Mayores Gastos Generales | Fecha de Aprobación | Monto S/   | Descarga  |
|--------------------------------|---------------------|------------|---|
| 2                              | 09/04/2021          | 125,000.00 |  |

#### MAYORES METRADOS

| Nº de Mayores Metrados | Fecha de Aprobación | Monto S/  | Descarga  |
|------------------------|---------------------|-----------|---|
| 1                      | 10/12/2020          | 15,000.00 |  |

Descarga del documento aprobado

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Ejecución física

10

### AMPLIACIÓN DE PLAZO

### Ampliación de plazo

Esta sección brinda información de:

- A. Resumen de las ampliaciones de plazo.
- B. Detalle sobre las ampliaciones aprobadas, causales, fecha de aprobación, N° de días, fecha de termino, nueva fecha de termino y la descarga de documentos.

10

HITOS DEL OBJETO

AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA ACTUALIZADO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO

RESUMEN

|   |    |                         |            |
|---|----|-------------------------|------------|
| Nº DE AMPLIACIONES:                             | 6  | FECHA DE INICIO (b):    | 17/03/2021 |
| Nº TOTAL DE DÍAS (a):                           | 51 | FECHA DE TERMINO (c):   | 21/04/2021 |
| PLAZO DE EJECUCION VIGENTE EN DÍAS ((c-b) + a): | 86 | NUEVA FECHA DE TERMINO: | 01/05/2021 |

AMPLIACIONES DE PLAZO

| Nº de ampliación | Causales  | Fecha de Aprobación | Nº de días | Fecha de termino | Nueva fecha de termino | Descarga |
|------------------|---|---------------------|------------|------------------|------------------------|----------|
| 52               | OTROS   | 17/03/2021          | 10         | 20/03/2021       | 29/03/2021             |          |
| 49               | ATRASOS Y/O PARALIZACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRESTACIONES POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD | 17/03/2021          | 1          | 20/03/2021       | 20/03/2021             |          |
| 53               | OTROS   | 17/03/2021          | 10         | 20/03/2021       | 30/03/2021             |          |
| 51               | CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL   | 17/03/2021          | 10         | 20/03/2021       | 29/03/2021             |          |
| 54               | ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA                                   | 20/03/2021          | 10         | 20/03/2021       | 30/03/2021             |          |
| 59               | CUANDO SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL   | 21/04/2021          | 10         | 21/04/2021       | 01/05/2021             |          |

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

Botones de acceso rápido

## FORMATO N° 12-B



**REPORT DE SEGUIMIENTO  
A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL  
FORMATO N° 12-B**

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



invierte.pe  
Fecha Últ. Modificación: 04/11/2020

Formato N°12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones

Código único de inversiones

2151258

Nombre de la inversión

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA

Costo actualizado

S/17,185,185.42

Dev. acumulado

S/16,585,585.50

FMI AÑO 1 <2020>

S/3,000,000.00

UEI

38461-INTENDENCIA NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Fecha de última modificación

13/11/2020 05:05:47 p.m.

FMI 2020

S/1,860,359.00

Dev. 2020

S/1,331,811.25

FMI AÑO 2 <2021>

S/0.00

FMI AÑO 3 <2022>

S/70,952.00

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

Haga clic aquí para ver el detalle

II EJECUCIÓN FÍSICA

Registre más reciente en el Procedimiento de Selección

No registre información

Detalle de la Ejecución Física

| Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones  | Según ET/DE |                | Según Contrato/Convenio |                | Según Valorización |                | Docu. | Foto |
|--|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------|------|
|  | Periodo     | Monto          | Periodo                 | Monto          | Periodo            | Monto          |       |      |
| Adecuada Infraestructura (construcción en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura | 2019-01     | S/425,690.31   | 2019-01                 | S/637,516.27   | 2019-01            | S/1,010,144.35 |       |      |
| Adecuada Infraestructura (construcción en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura | 2019-02     | S/1,094,239.89 | 2019-02                 | S/1,186,203.93 | 2019-02            | S/1,485,054.73 |       |      |
| Adecuada Infraestructura (construcción en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura | 2019-03     | S/1,730,247.76 | 2019-03                 | S/1,892,793.10 | 2019-03            | S/2,221,876.63 |       |      |

III EJECUCIÓN FINANCIERA

| Programación financiera |                 | Programación financiera actualizada |                 | Avance financiero real |                 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Periodo                 | Monto           | Periodo                             | Monto           | Periodo                | Monto           |
| 2020-01                 | S/140,000.00    | 2020-01                             | S/338,032.50    | 2020-01                | S/338,032.50    |
| 2020-02                 | S/400,000.00    | 2020-02                             | S/472,721.59    | 2020-02                | S/472,721.59    |
| 2020-03                 | S/600,000.00    | 2020-03                             | S/18,722.99     | 2020-03                | S/18,722.99     |
| 2020-04                 | S/700,000.00    | 2020-04                             | S/0.00          | 2020-04                | S/0.00          |
| 2020-05                 | S/610,000.00    | 2020-05                             | S/0.00          | 2020-05                | S/0.00          |
| 2020-06                 | S/0.00          | 2020-06                             | S/227,297.43    | 2020-06                | S/227,297.43    |
| 2020-07                 | S/0.00          | 2020-07                             | S/0.00          | 2020-07                | S/0.00          |
| 2020-08                 | S/0.00          | 2020-08                             | S/21,603.45     | 2020-08                | S/21,603.45     |
| 2020-09                 | S/0.00          | 2020-09                             | S/7,887.80      | 2020-09                | S/7,887.80      |
| 2020-10                 | S/0.00          | 2020-10                             | S/0.00          | 2020-10                | S/0.00          |
| 2020-11                 | S/0.00          | 2020-11                             | S/0.00          | 2020-11                | S/245,545.49    |
| 2020-12                 | S/550,000.00    | 2020-12                             | S/0.00          | 2020-12                | S/0.00          |
| Total                   | S/ 3,000,000.00 | Total                               | S/ 1,086,265.76 | Total                  | S/ 1,331,811.25 |

IV ESTADO SITUACIONAL

| Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones  | Periodo | Estado Situacional  |           | Avance | Problemas        |  |
|--|---------|---|-----------|--------|------------------|--|
|  |         | Situación   | Problemas |        | Acciones a tomar |  |
| Adecuada Infraestructura (construcción en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura | 2019-01 | Avance Físico 6.74% Se Ha Ejecutado Trabajos Referidos A Movimiento De Tierras, Calzaduras, Incendiarse La Ejecución De Los Muros Anclados. | 6.74 %    |        |                  |  |
| Adecuada Infraestructura (construcción en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura | 2019-02 | Avance Físico 9% Se Ha Realizado Trabajos Habilitación De Acero De Refuerzo, Encofrado Y Vaciado De Muros Secundarios Anclados.             | 9.91 %    |        |                  |  |

**Nota:** Para inversiones que registraron la sección ejecución física en el Formato N°12-B antes del 30 de abril del 2021.

# 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

## Botones de acceso rápido

### CONTRATACIONES



**PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas



invierte.pe

Fecha Últ. Modificación: 04/11/2020



**REPORTE DE SEGUIMIENTO  
A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL  
FORMATO N° 12-B**

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



CONTRATACIONES

Código Único: 2354781

Tipo de Inversión:

PIP MAYOR (SNIP)

Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

Modalidad de Ejecución:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

EJECUCION CONTRACTUAL

● Continuidad en el procedimiento    ● Con modificación en el cronograma    ● Sin continuidad en el procedimiento

CONSULTORIAS DE OBRA : 1

| Tipo de Proceso  | Nomenclatura          | Descripción de Proceso  | Descripción de Item   | Número de Item | Fecha de Convocatoria | Estado     | Valor Referencial (\$/.) | Ver Detalle |
|------------------|-----------------------|---|---|----------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Concurso Público | CP-SM-8-2018-PRONIS-1 | SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 1              | 09/11/2018            | Contratado | 11,794,580               |             |

OBRAS : 2

| Tipo de Proceso           | Nomenclatura          | Descripción de Proceso   | Descripción de Item   | Número de Item | Fecha de Convocatoria | Estado     | Valor Referencial (\$/.) | Ver Detalle |
|---------------------------|-----------------------|--|---|----------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Adjudicación Simplificada | AS-SM-2-2019-PRONIS-1 | contratación de la ejecución de la obra Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica, distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica, código de inversiones N° 2354781 | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CODIGO DE INVERSIONES N 2354781 | 1              | 09/04/2019            | Contratado | 239,346,061              |             |
| Licitación Pública        | LP-SM-3-2018-PRONIS-1 | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CODIGO DE INVERSIONES N 2354781  | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CODIGO DE INVERSIONES N 2354781 | 1              | 08/11/2018            | Desierto   | 229,496,102              |             |

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Contrataciones

CONTRATACIONES

Código Único: 2380087

Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO – CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Tipo de Inversión: PROYECTO DE INVERSION

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

EJECUCION CONTRACTUAL

Continuidad en el procedimiento

Con modificación en el cronograma

Sin continuidad en el procedimiento

Leyenda

BIENES : 55

| Tipo de Proceso | Nomenclatura | Descripción de Proceso | Descripción de Item | Número de Item | Fecha de Convocatoria | Estado | Valor Referencial (S/.) | Ver Detalle |
|-----------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------------|-------------|
|-----------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------------|-------------|

SERVICIOS : 34

| Tipo de Proceso | Nomenclatura | Descripción de Proceso | Descripción de Item | Número de Item | Fecha de Convocatoria | Estado | Valor Referencial (S/.) | Ver Detalle |
|-----------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------------|-------------|
|-----------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------------|-------------|

1  
Dar clic en la sección de procedimientos de selección.

2  
Luego dar clic en el encabezado de “Ver detalle” para desplegar las convocatorias.

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Contrataciones

The screenshot shows the 'CONTRATACIONES' (Contracts) section of a system. At the top, there's a header bar with the title 'CONTRATACIONES' and a green Excel icon. Below this, a form displays contract details: 'Código Único: 2380087', 'Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO – CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO', 'Tipo de Inversión: PROYECTO DE INVERSION', and 'Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA'. Below the form are two buttons: 'PROCEDIMIENTOS DE SELECCION' and 'EJECUCION CONTRACTUAL'. A red line connects the Excel icon (3) to the 'EJECUCION CONTRACTUAL' button (4). Below these buttons, there are two summary bars: 'CONTRATOS ASOCIADOS : 49' and 'BIENES : 34'. The main part of the interface is a table with the following columns: 'Numero de Item', 'Descripción de Item', 'Contratista', 'N° Contrato', 'Fecha Suscripción', 'Monto Contratado Total (S/.)', 'Monto Contratado Item (S/.)', 'Ver Contrato', 'Arbitraje', and 'Información contractual'. The first row of the table has a red box around the 'Ver Contrato' column (5) and a red box around the 'Información contractual' column (6). A red line connects the 'EJECUCION CONTRACTUAL' button (4) to the 'Información contractual' column (6). The second row of the table has a red box around the 'Ver Contrato' column (5) and a red box around the 'Información contractual' column (6). A red line connects the 'Ver Contrato' column (5) to the 'Información contractual' column (6).

| Numero de Item | Descripción de Item  | Contratista   | N° Contrato | Fecha Suscripción | Monto Contratado Total (S/.) | Monto Contratado Item (S/.) | Ver Contrato | Arbitraje               | Información contractual |
|----------------|--|---|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1              | CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES DE MOTOR PARA LA META 09 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-CCORCA-HUAYLLAYPAMPA, ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO". | GAP MAQUINARIAS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GAP MAQUINARIAS PERU E.I.R.L. | 610-2020    | 19/10/2020        | 63,190                       | 63,190                      |              | NO REGISTRA INFORMACIÓN | SE@CE                   |
| 1              | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TEXTILES PARA LA OBRA DE META: 0009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA   | RALEON CORPORATION S.R.L.   | 676-2020    | 03/11/2020        | 77,999                       | 77,999                      |              | NO REGISTRA INFORMACIÓN | SE@CE                   |

3 Dar clic en la sección de ejecución contractual.

4 Dar clic en el encabezado de "información contractual", para desplegar los contratos.

5 Dar clic en "Ver contrato" para descargar el documento en pdf.

6 Dar clic en el icono SE@CE.

## 2. Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### Botones de acceso rápido

#### INFOBRAS



EN PROCESO DE  
IMPLEMENTACIÓN



## **Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones**

---

### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

#### ¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?

Es una herramienta informática de acceso público que permite el seguimiento de inversiones públicas e integra información de las diferentes fases del Ciclo de Inversión<sup>1</sup>.




Además está vinculado con varios sistemas informáticos del Estado



<sup>1</sup>A excepción de la fase de Funcionamiento.

# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Objetivos



Mostrar información sistematizada de las inversiones, para un adecuado seguimiento.



Optimizar el tiempo de búsqueda a través de los vínculos de acceso con los formatos de las diferentes fases del ciclo de inversión.



Brindar información actualizada de las inversiones con la finalidad de facilitar la elaboración de reportes de seguimiento.



Conocer los actores que intervienen en la gestión de la Inversión pública (OPMI, UEI y UF).

### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

#### Acceso al SSI

Luego de ingresar a la página del Ministerio de Economía y finanzas, se deberá hacer clic en :

The screenshot shows the website of the Ministry of Economy and Finance with a navigation menu at the top. The 'Inversión Pública' tab is highlighted with a red box and a red line pointing to the label 'Inversión pública' with a red circle containing the number 1. Below the navigation menu, there is a sidebar on the left with a list of links. The 'Aplicaciones Informáticas' link is highlighted with a red box and a red line pointing to the label 'Aplicaciones informáticas' with a red circle containing the number 2. The 'SSI' link is highlighted with a red box and a red line pointing to the label 'SSI' with a red circle containing the number 3. The main content area displays a grid of application tiles under the heading 'Operadores de Invierte.pe'. The 'SSI' tile, labeled 'Sistema de Seguimiento de Inversiones', is highlighted with a red box. Other tiles include 'Banco de Inversiones', 'Instructivos', 'FIDT', 'PMI', 'GEOInvierte', and 'PNIC'. The 'Acceso público' section is also visible on the right.

Inversión pública 1

Aplicaciones informáticas 2

SSI 3

Nota: También se puede ingresar a través del siguiente link: <https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/>

### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

#### Estructura del SSI

- 1 Acceso a operadores
- 2 Campo de búsqueda
- 3 Vista resumen
- 4 Secciones de información



### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

#### Campo de búsqueda

Para poder obtener información de la inversión, se deberá digitar el criterio de búsqueda (Código Único de Inversión o Código SNIP o nombre de la inversión o a través del acceso directo al Geoinvierte) y luego hacer clic en buscar.



### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

#### Vista resumen

Con este botón se podrá visualizar un resumen de información de las 4 secciones del SSI y permitirá imprimir o guardar el documento en PDF.



The screenshot displays the SSI application interface. At the top, there is a header with the Peruvian coat of arms, the text 'PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas', and the 'inVierte.pe' logo. Below this is the SSI logo and the title 'SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES'. The main content area is titled 'FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN' and contains a table with the following data:

| FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN  |         |                   |                                     |
|--|---------|-------------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO ÚNICO   | 2313156 | CÓDIGO SNIP       | 350270                              |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN   |         | FECHA DE REGISTRO |                                     |
| MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA |         | 08/03/2016        |                                     |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN   | ACTIVO  | TIPO DE INVERSIÓN | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMF? |
| PROYECTO DE INVERSIÓN  |         | SI                |                                     |

Below the table, there is a section titled 'DATOS GENERALES' and a red header 'I. INSTITUCIONALIDAD'. This section contains a table with the following data:

| I. INSTITUCIONALIDAD                  |  |
|---------------------------------------|--|
| OPMI                                  | OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION               |
| UNIDAD FORMULADORA (UF)               | UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y OBRAS - PRONIED |
| UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |

Below this, there is another red header 'II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN'. This section contains a table with the following data:

| II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN    |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| SITUACIÓN   | VIABLE                                   | FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN            | 15/03/2016 |
| LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA | NO                                       | COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/) | 5.079.758  |
| CADENA FUNCIONAL                                    | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN | BENEFICIARIOS (HABITANTES)                | 3.460      |

At the bottom right of the application, there are two buttons: 'Cerrar' and 'Imprimir'.

# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Secciones de información

### 1. Datos generales



Contiene información del Banco de Inversiones sobre la Institucionalidad, la formulación y evaluación y la ejecución de la inversión, así como la convocatoria Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT (antes FONIPREL), de corresponder.

### 2. Ejecución financiera



Muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el avance de ejecución presupuestal del año e histórico del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), dicha información se presenta por unidad ejecutora presupuestal.

### 3. Contrataciones



Presenta información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de los contratos suscritos de acuerdo al objeto contractual (obras, servicios, bienes y consultorías de obras).

### 4. Infobras



Presenta información del contrato de obra y del avance físico por periodo de valorización por cada contrato registrado en Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) de la Contraloría General de la República.

# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Datos generales

Datos generales



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES



[Acceso a Operadores](#)

2151258

Búsqueda por nombre

Geoinvierte

Vista Resumen



|                        |  |                   |                       |                                     |            |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| CÓDIGO ÚNICO           | 258  | CÓDIGO SNIP       | 195992                | FECHA DE REGISTRO                   | 29/11/2011 |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA |                   |                       |                                     |            |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN | ACTIVO   | TIPO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSION | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? | SI         |

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI

OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Datos generales

### Descripción de subsección

Responsables del ciclo de inversión: OPMI, UF Y UEI.

Información de la inversión de acuerdo a lo registrado en el formato de la fase de formulación y evaluación y ejecución.

Estado del concurso FONIPREL.

|                        |   |                   |                       |                                     |            |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| CÓDIGO ÚNICO           | 2312139   | CÓDIGO SNIP       | 349298                | FECHA DE REGISTRO                   | 29/02/2016 |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MATACHOCCO-CHECCE, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA |                   |                       |                                     |            |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN | ACTIVO  | TIPO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSION | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? | SI         |

| I. INSTITUCIONALIDAD                  |   |
|---------------------------------------|---|
| OPMI                                  | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA |
| UNIDAD FORMULADORA (UF)               | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA   |
| UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA  |

| II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN    |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| SITUACIÓN   | VIABLE                                  | FECHA DE VIABILIDAD / APROBACIÓN          | 21/02/2016 |
| LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA | NO                                      | COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/) | 3,179,626  |
| CADENA FUNCIONAL                                    | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO | BENEFICIARIOS (HABITANTES)                | 123        |

| III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN                    |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| ¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE? | SI         | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a) | 3,326,500  |
| ¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?                    | SI         | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)      | 0          |
| REGISTRO DE CIERRE                                 | NO         | MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c)          | 0          |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN                       | 22/07/2020 | FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN               | 16/02/2021 |
|  |            | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)   | 3,326,500  |

| IV. CONVOCATORIAS FONIPREL     |   |                                  |  |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
| CONVOCATORIA                   | CONVOCATORIA FONIPREL 2017-I (CONCURSO REGULAR) | EXPEDIENTE                       | SOLI-2017-I-0212                         |
| PRESENTACIÓN                   | 17/04/2017                                      | PRIORIDAD                        | SANEAMIENTO - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| COSTO DE INVERSIÓN VIABLE (S/) | 3,179,626                                       | MONTO DEL CONFINANCIAMIENTO (S/) | 3,169,626                                |
| EVALUACIÓN                     |   | GANADOR                          | SI                                       |

Botones con vínculos

1

2

3

4

5

# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Datos generales

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:



invierte.pe Banco de Inversiones  
Consulta de Cartera PMI


Criterios de búsqueda

Sector: SALUD Código Único / Código Idea: 2354781 PBA84 Refrescar

Buscar Borrar filtros Exportar formato excel

Lista de resultados

| Prioridad | Orden prelación (*) | Sector | OPMI                         | Nivel Gobierno    | Código único | Código idea | Tipo de inversión     | Nombre inversión   | Costo actualizado (\$) | Devengado acumulado (\$/ al 31 dic. 2020) | PIM 2021 (\$/) | Programación del monto de inversión (\$/) | Monto año 2021 (\$/) | Monto año 2022 (\$/) | Monto año 2023 (\$/) | Monto año 2024 (\$/) |
|-----------|---------------------|--------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--|------------------------|---|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 235       | E                   | SALUD  | OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD | GOBIERNO NACIONAL | 2354781      |             | PROYECTO DE INVERSIÓN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAYELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAYELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA | 342,912,239.08         | 136,910,753.00                            | 12,556,774.00  | 12,556,774.00                             | 68,210,307.00        | 0.0                  | 0.0                  |                      |



FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 17/09/2019 02:22:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/09/2019 09:38:08 p.m.  
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE  
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN

Exportar PDF

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS Y EL APRENDIZAJE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LAS 9 PROVINCIAS DEL DE

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Código único de inversiones                          | 2461806                   |
| ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?   | NO                        |
| ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? | NO                        |
| ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? | NO                        |
| A. Alineamiento a una brecha prioritaria             |                           |
| Función  | 22 EDUCACIÓN              |
| División funcional                                   | 047 EDUCACIÓN BÁSICA      |
| Grupo funcional                                      | 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA |
| Sector responsable                                   | EDUCACION                 |
| Tipología de proyecto                                | EDUCACIÓN SECUNDARIA      |

# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Datos generales

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:



Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución [Exportar PDF](#)

Fecha de registro: 07/02/2018 02:34:26 p.m. Fecha de modificación: 09/02/2021 09:22:09 p.m.  
ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones: 2151258  
Nombre de la inversión: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión


|                       | Según el formato de Formulación y Evaluación    | Fase de Ejecución                               |
|-----------------------|---|---|
| Función               | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |
| División funcional    | RECAUDACIÓN                                     | RECAUDACIÓN                                     |
| Grupo funcional       | RECAUDACIÓN                                     | RECAUDACIÓN                                     |
| Sector responsable    |   | --  |
| Tipología de proyecto |   |   |

2. Articulación con el programa multiannual de inversiones (PMI)

| Servicio Público con Brecha identificada y priorizada                             | Indicador de brechas de acceso a servicios   | Unidad de medida                     | Espacio geográfico | Contribución de cierre de brechas |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE (CSC) | PORCENTAJE DE CSC EN CONDICIONES INADECUADAS | CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE | DEPARTAMENTAL      | 0.0095                            |

3. Institucionalidad

| Según el formato de Formulación y Evaluación | Fase de Ejecución |
|--|-------------------|
|  |                   |



PERU [Ministerio de Economía y Finanzas](#) [invierte.pe](#)  
Fecha Últ. Modificación: 12/02/2021

**REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B**

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN


|                         |  |                         |   |
|-------------------------|--|-------------------------|---|
| CÓDIGO ÚNICO:           | 2151258  | TIPO DE INVERSIÓN:      | PROYECTO DE INVERSIÓN                   |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN: | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA |
| OPME:                   | OPME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS   | REGISTRO DE CIERRE:     | N/D                                     |
| UEI:                    | IDENTIFICACIÓN NACIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES  | PMI AÑO 1 <2022>        | 108.858                                 |
|                         |  | PMI AÑO 2 <2023>        | 0                                       |
|                         |  | PMI AÑO 3 <2024>        | 0                                       |

2. FOTOGRAFÍAS

### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

#### Datos generales

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:

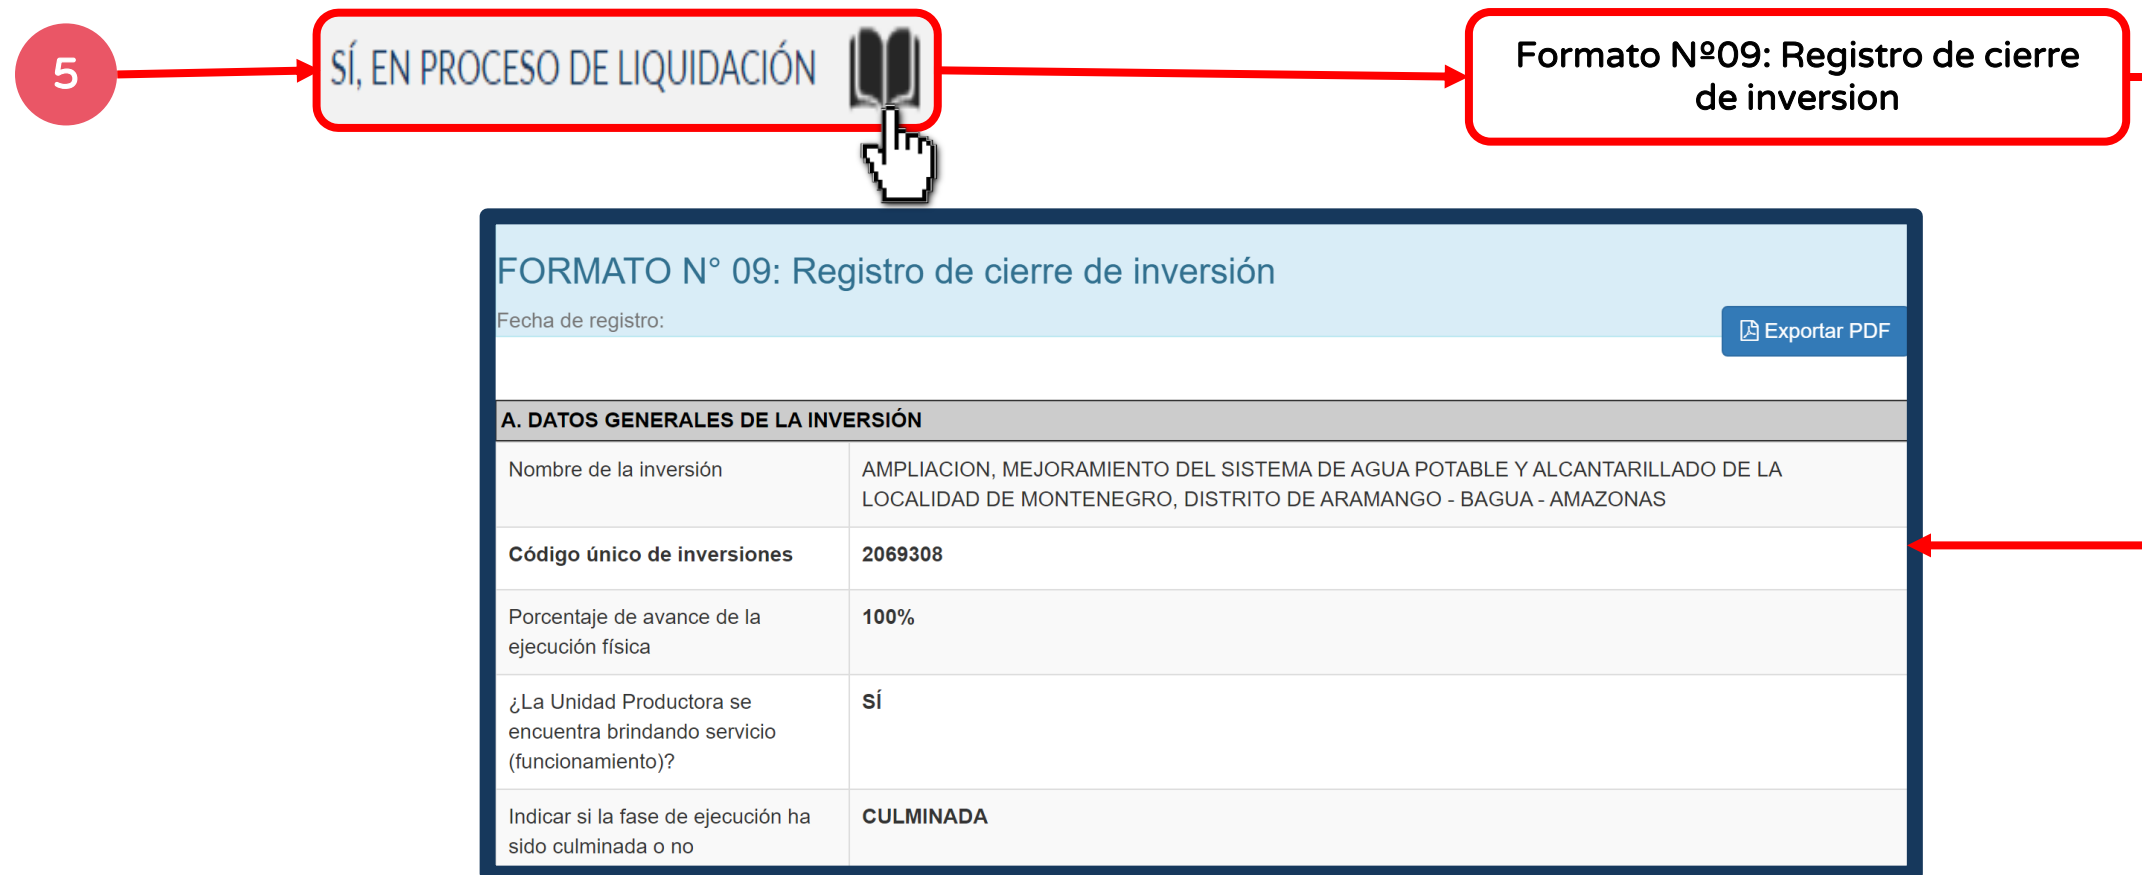

### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

#### Ejecución financiera

**Ejecución financiera**

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

invierte.pe

SSI SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Acceso a Operadores

2151258

Búsqueda por nombre

Gestiona

Vista Resumen

|                        |  |                   |                       |                                     |            |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| CÓDIGO ÚNICO           | 2151258  | CÓDIGO S          | 195992                | FECHA DE REGISTRO                   | 29/11/2011 |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA |                   |                       |                                     |            |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN | ACTIVO   | TIPO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? | SI         |

INSTITUCIONALIDAD

OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Ejecución financiera

### Descripción de subsección

Costo total, devengado acumulado y saldo por ejecutar de la inversión.

| I. INFORMACIÓN FINANCIERA (\$/)   |           |                               |           |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)         | 3,326,500 | PIM 2021 (c)                  | 1,792,841 |
| DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)   | 2,804,970 | DEVENGADO 2021 (d)            | 1,271,309 |
| AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a) | 84.3 %    | AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)  | 70.9 %    |
| SALDO POR EJECUTAR (a-b)          | 521,530   | SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d) | 521,532   |
| FECHA DEL PRIMER DEVENGADO        | FEB-2019  | FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO    | ENE-2021  |

Histórico del PIA, PIM, Certificación, Compromiso anual y devengado de toda la inversión.

| II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (\$/) |     |           |               |                  |           |
|--|-----|-----------|---------------|------------------|-----------|
| AÑO  | PIA | PIM       | CERTIFICACIÓN | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO |
| 2017   | 0   | 104,869   | 104,765       | 0                | 0         |
| 2018   | 0   | 3,179,522 | 104,765       | 104,765          | 0         |
| 2019   | 0   | 3,239,760 | 3,239,655     | 104,765          | 104,765   |

Histórico del ejecución por específica de gasto, en los últimos 05 años.

| III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (\$/)         |           |         |         |           |         |           |
|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| ESPECÍFICA DE GASTO                                      | 2017      | 2018    | 2019    | 2020      | 2021    | TOTAL     |
| 2.6.22.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS                        | 2,503,356 | 399,389 | 0       | 2,982,278 | 418,246 | 6,303,270 |
| 2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS             | 405       | 0       | 0       | 0         | 0       | 405       |
| 2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 220,718   | 194,540 | 45,412  | 261,266   | 34,970  | 756,905   |
| 2.6.32.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS                   | 0         | 139,335 | 159,599 | 41,076    | 0       | 340,010   |

Histórico por Unidad Ejecutora Presupuestal.

| IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (\$/) |                     |         |
|---|---------------------|---------|
| UNIDADES EJECUTORAS                                 | DEVENGADO ACUMULADO | DETALLE |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS       | 2,804,970           |         |

Botones de detalle

1

2

3

### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

Contrataciones



PERÚ  
Ministerio  
de Economía y Finanzas



**SSI**

SISTEMA DE SEGUIMIENTO  
DE INVERSIONES

invierte.pe

Opciones de búsqueda















|                        |         |  |                       |                                     |  |
|------------------------|---------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| CÓDIGO ÚNICO           | 2151258 | CÓDIGO SNIP  | 195992                | FECHA DE REGISTRO                   | 29/11/2011   |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN |         | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA |                       |                                     |  |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN | ACTIVO  | TIPO DE INVERSIÓN  | PROYECTO DE INVERSION | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? | SI  |

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI

OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Contrataciones





# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Contrataciones


En la sección “Contrataciones” se muestran los contratos adjudicados asociados a la inversión registrados en el SEACE, de acuerdo al objeto contractual: obra, consultorías de obras, bienes y servicios.

Presenta la siguiente información de acuerdo al objeto contractual:

- Descripción de ítem
- Contratista
- N° contrato
- Fecha de suscripción
- Monto contratado
- Monto contratado ítem total

| I. OBRA                 |  |                        |                     |                      |                             |                                  |   |
|-------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| N° DE ÍTEM              | DESCRIPCIÓN DE ÍTEM  | CONTRATISTA            | N° CONTRATO         | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | MONTO CONTRATADO TOTAL (S/) | MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/) | VER CONTRATO  |
| 1                       | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO | GUERREROS SUAREZ WUIDO | N°0068-2019-MPT-SGA | 05/06/2019           | 103,800                     | 103,800                          |    |
| II. CONSULTORIA DE OBRA |  |                        |                     |                      |                             |                                  |   |
| N° DE ÍTEM              | DESCRIPCIÓN DE ÍTEM  | CONTRATISTA            | N° CONTRATO         | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | MONTO CONTRATADO TOTAL (S/) | MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/) | VER CONTRATO  |
| 1                       | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO | GUERREROS SUAREZ WUIDO | N°0068-2019-MPT-SGA | 05/06/2019           | 103,800                     | 103,800                          |    |
| III. SERVICIOS          |  |                        |                     |                      |                             |                                  |   |
| N° DE ÍTEM              | DESCRIPCIÓN DE ÍTEM  | CONTRATISTA            | N° CONTRATO         | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | MONTO CONTRATADO TOTAL (S/) | MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/) | VER CONTRATO  |
| 1                       | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO | GUERREROS SUAREZ WUIDO | N°0068-2019-MPT-SGA | 05/06/2019           | 103,800                     | 103,800                          |  |
| IV. BIENES              |  |                        |                     |                      |                             |                                  |   |
| N° DE ÍTEM              | DESCRIPCIÓN DE ÍTEM  | CONTRATISTA            | N° CONTRATO         | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | MONTO CONTRATADO TOTAL (S/) | MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/) | VER CONTRATO  |
| 1                       | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MANTACHOCCO | GUERREROS SUAREZ WUIDO | N°0068-2019-MPT-SGA | 05/06/2019           | 103,800                     | 103,800                          |  |

Botón de descarga del contrato suscrito

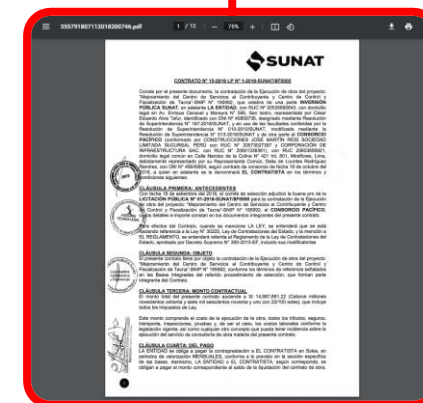

# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Sección: Infobras



Infobras

# 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

## Sección: Infobras

Presenta la siguiente información de cada contrato registrado en Infobras:

I. OBRA 1

1. DATOS GENERALES

|                                 |                            |                             |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO INFOBRAS                 |                            |                             |
| NOMBRE DE LA OBRA               |                            |                             |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN          |                            |                             |
| UBICACIÓN DE LA OBRA            |                            |                             |
| UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES |                            |                             |
| ESTADO DE LA OBRA               |                            |                             |
| MONTO DE CONTRATO EN S/.        | ADICIONALES-DEDUCTIVOS S/. |                             |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (a)          | AMPLIACIÓN DE PLAZO (b)    | TIEMPO DE EJECUCIÓN (c=a+b) |
| FECHA DE INICIO DE OBRA (d)     | FECHA DE FIN DE OBRA (c+d) |                             |

2. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

| N° | PERIODO DE VALORIZACIÓN | FECHA DE REGISTRO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%) |      | AVANCE VALORIZADO ACUMULADO (S/) |      |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------|------|----------------------------------|------|
|    |                         |                   | PROGRAMADO                  | REAL | PROGRAMADO                       | REAL |



Datos de la fase de ejecución contractual, desde la fecha de inicio hasta la fecha fin de la obra.



El avance físico programado y ejecutado (valorizado) acumulado de cada periodo.

### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

“Integración de las herramientas de seguimiento del SIAF con SNPMGI”

Se ha implementado la vinculación del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable del Sistema Integrado de Administración Financiera con el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con el objetivo de facilitar las acciones de seguimiento y trazabilidad de la información de las inversiones públicas a nivel nacional.



### 3. Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones

#### “Integración de las herramientas de seguimiento del SIAF con SNPMGI”

Ingresando al aplicativo de Consulta Amigable, se puede acceder a la herramienta informática del Sistema de Seguimiento de Inversiones

Transparencia  
Económica PERÚ

Consulta Amigable  
Consulta de Ejecución del Gasto

Navegador Buscador Reportes Descargas

Reiniciar Exportar Graficar

| ¿Quién gasta?  |  | ¿En qué se gasta?      |                          | ¿Con qué se financian los gastos? |                | ¿Cómo se estructura el gasto? |                |                  |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Pliego   |  | Categoría Presupuestal | Act./Acción de Inv./Obra | Función                           | Fuente         | Rubro                         | Genérica       |                  |
| TOTAL  |  |                        |                          |                                   | 41,939,670,965 | 60,281,733,065                | 44,230,571,350 | 27,817,594,997   |
| Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL   |  |                        |                          |                                   | 25,876,009,910 | 23,257,238,943                | 15,087,615,114 | 10,027,015,057   |
| Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  |  |                        |                          |                                   | 9,343,910,835  | 8,693,570,512                 | 5,865,079,662  | 3,774,817,427    |
| Proyecto   |  |                        |                          |                                   | PIA            | PIM                           | Certificación  | Compromiso Anual |
| 2465966: CONSTRUCCION DE PUENTE, PUENTE, PUENTE, PUENTE Y PUENTE, EN EL(LA) RUTAS NACIONALES PE-22, PE-1N, PE-18, TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA, ANCON - HUACHO - PATIVILCA Y HUAURA - SAYAN - CHURIN - OYON - AMBO DISTRITO DE CHANGAY, |  |                        |                          |                                   | 1,969,360      | 2,097,059                     | 2,097,059      | 2,097,059        |
| Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI  |  |                        |                          |                                   |                |                               |                |                  |
| PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH   |  |                        |                          |                                   | 1,487,372      | 1,461,017                     | 1,461,017      | 1,461,017        |
| Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI  |  |                        |                          |                                   |                |                               |                |                  |
| 2337718: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28C (DV PICHARI) - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO - KITENI - PALMA REAL EN LOS DISTRITOS DE ECHARATE Y KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO    |  |                        |                          |                                   | 2,724,000      | 1,524,691                     | 1,524,691      | 1,524,691        |
| Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI  |  |                        |                          |                                   |                |                               |                |                  |

PERÚ  
Ministerio de Economía y Finanzas

invierte.pe



SISTEMA DE SEGUIMIENTO  
DE INVERSIONES

Acceso a Operadores

Opciones de búsqueda

2151258

Búsqueda por nombre

invierte

Vista Resumen



|                        |  |                   |                       |                                     |            |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| CÓDIGO ÚNICO           | 2151258  | CÓDIGO SNIP       | 195992                | FECHA DE REGISTRO                   | 29/11/2011 |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA |                   |                       |                                     |            |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN | ACTIVO   | TIPO DE INVERSIÓN | PROYECTO DE INVERSION | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? | SI         |

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI

OPMI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

# ¡No te lo pierdas!



## Capacitaciones virtuales



### Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.

<https://bit.ly/2VQufjJCAPACITACIONES2022>



### Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.

<https://bit.ly/capacitacionesrealizadas2022>



### Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.

<https://bit.ly/recursosdeaprendizaje>



# ¿Aún tienes dudas?



## Consultas generales

Envía tu consulta a:  
[invierte.pe@mef.gob.pe](mailto:invierte.pe@mef.gob.pe)



## Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



## Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO DGPMI>

# **¡No te dejes engañar!**

## **Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición**



### **Directorio DGPMI**

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>




### **Directorio CONECTAMEF**

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

**¡Mantente atento y contacta a los  
verdaderos especialistas!**





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

invierte.pe



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

**¡Muchas gracias!**

