



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

invierte.pe

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones

## Segundo Ciclo de Conferencias y Capacitaciones Virtuales 2020

### Capacitación virtual:

“Realiza de forma adecuada el registro del **seguimiento de ejecución** - Formato F12B”.



3:00 p.m.



Viernes 11 de setiembre



*Empezaremos en unos minutos, gracias por su asistencia.....*

# FORMATO N° 12-B SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

---

setiembre 2020



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

 **invierte.pe**

# Formato N° 12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones

---

- I. Objetivos y beneficios del Formato N° 12-B.
- II. Estructura del Formato N° 12-B.
- III. Próximas implementaciones.

# I. Objetivos y beneficios del Formato N° 12-B


---

# ¿Qué es el F12-B?

Es una herramienta de gestión que permite el **seguimiento a la ejecución de las inversiones**, en base a la información registrada por la UEI en el Banco de Inversiones y a la información de los sistemas administrativos vinculados, facilitando una adecuada toma de decisiones para una eficiente gestión de inversiones.



# Objetivos

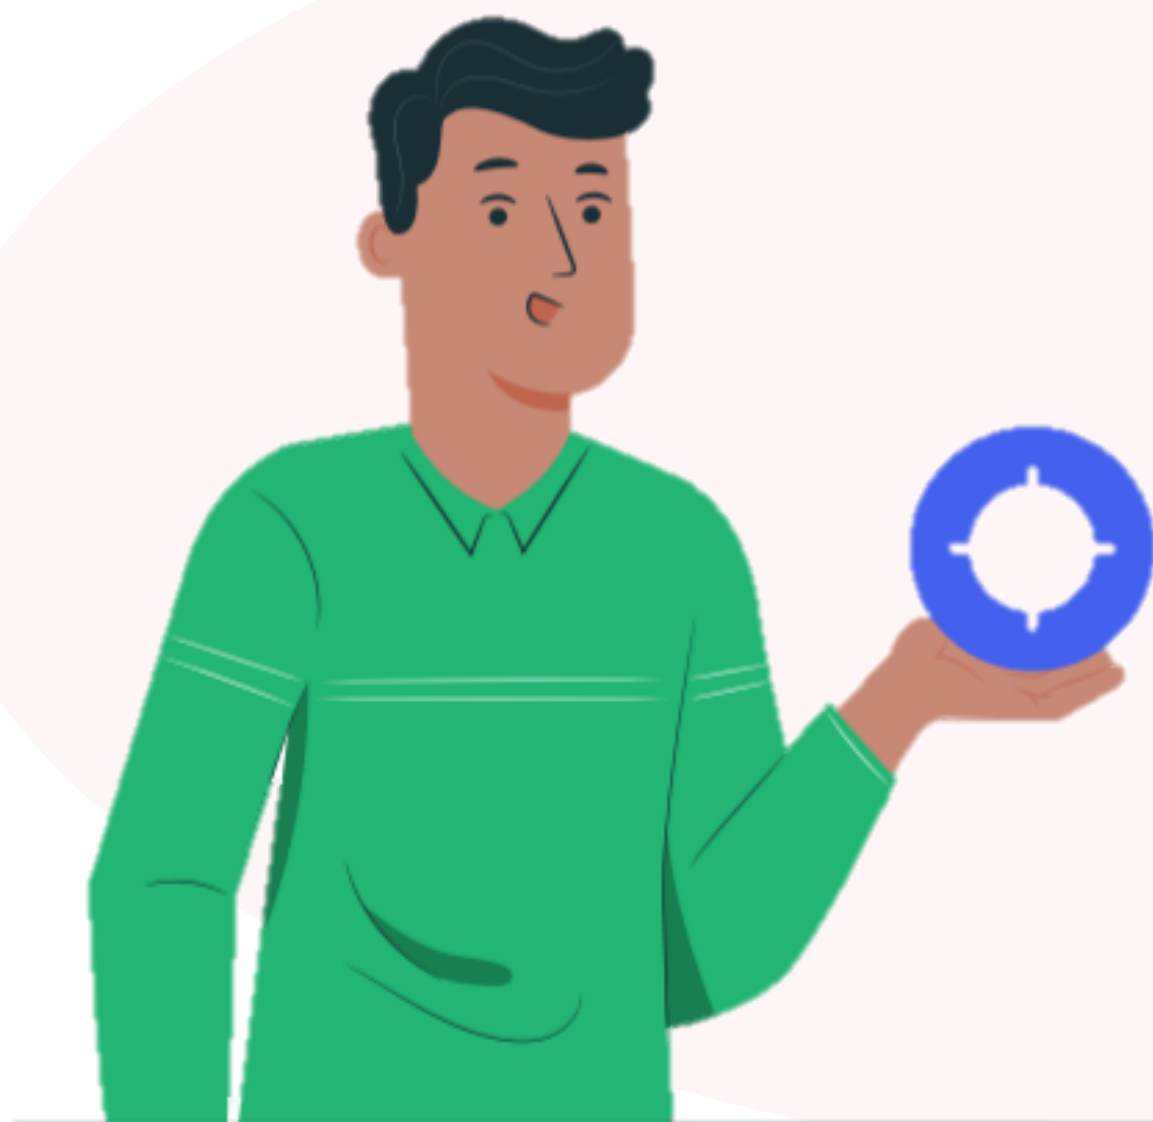

- ✓ **Realizar seguimiento y monitoreo** a la ejecución de inversiones y brindar información de la **situación actual** y los riesgos asociados de las inversiones en la fase de ejecución.
- ✓ **Mostrar los avances en la ejecución** en el período fiscal, propiciando una adecuada toma de decisiones de los involucrados en la gestión de inversiones.
- ✓ **Registrar la trazabilidad** de las inversiones vinculando la información de los sistemas administrativos, lo cual facilita **el seguimiento de las inversiones**.



# ¿Qué beneficios tiene?



## Adecuada toma de decisiones.

Identifica problemas y riesgos, permitiendo una adecuada y oportuna toma de decisiones y en consecuencia el logro de metas establecidas.



## Acceso y transparencia de la información

La información registrada en el Banco de Inversiones a través del F12B es de acceso público.



## Avance de la ejecución de las inversiones

Muestra el avance físico y financiero de las inversiones (obra, bienes y/o servicios).



## Vinculación con el PMI

La información registrada en el F12B es utilizada para la elaboración del PMI, y es insumo para Programación Multianual Presupuestaria.

# Marco legal del F12-B



## Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (DL N° 1252)

Numeral 11.3\*

**Incorporado**

Las UEI **registra y actualiza** la información del **avance físico y financiero** de todos los componentes de las inversiones en el **formato de seguimiento** del aplicativo informático del Banco de Inversiones, de manera mensual...

## Directiva General del Invierte.pe (Directiva N° 001-2019-EF/63.01)


Numeral 45.3

- ✓ **¿Quién registra?**  
La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).
- ✓ **¿Qué se registra?**  
Información sobre la ejecución de cada inversión de la entidad.
- ✓ **¿Plazo de registro?**  
Dentro de los primeros (10) días del mes siguiente al vencimiento del periodo.



# Línea de tiempo del Formato N° 12-B

## FASE DE EJECUCIÓN

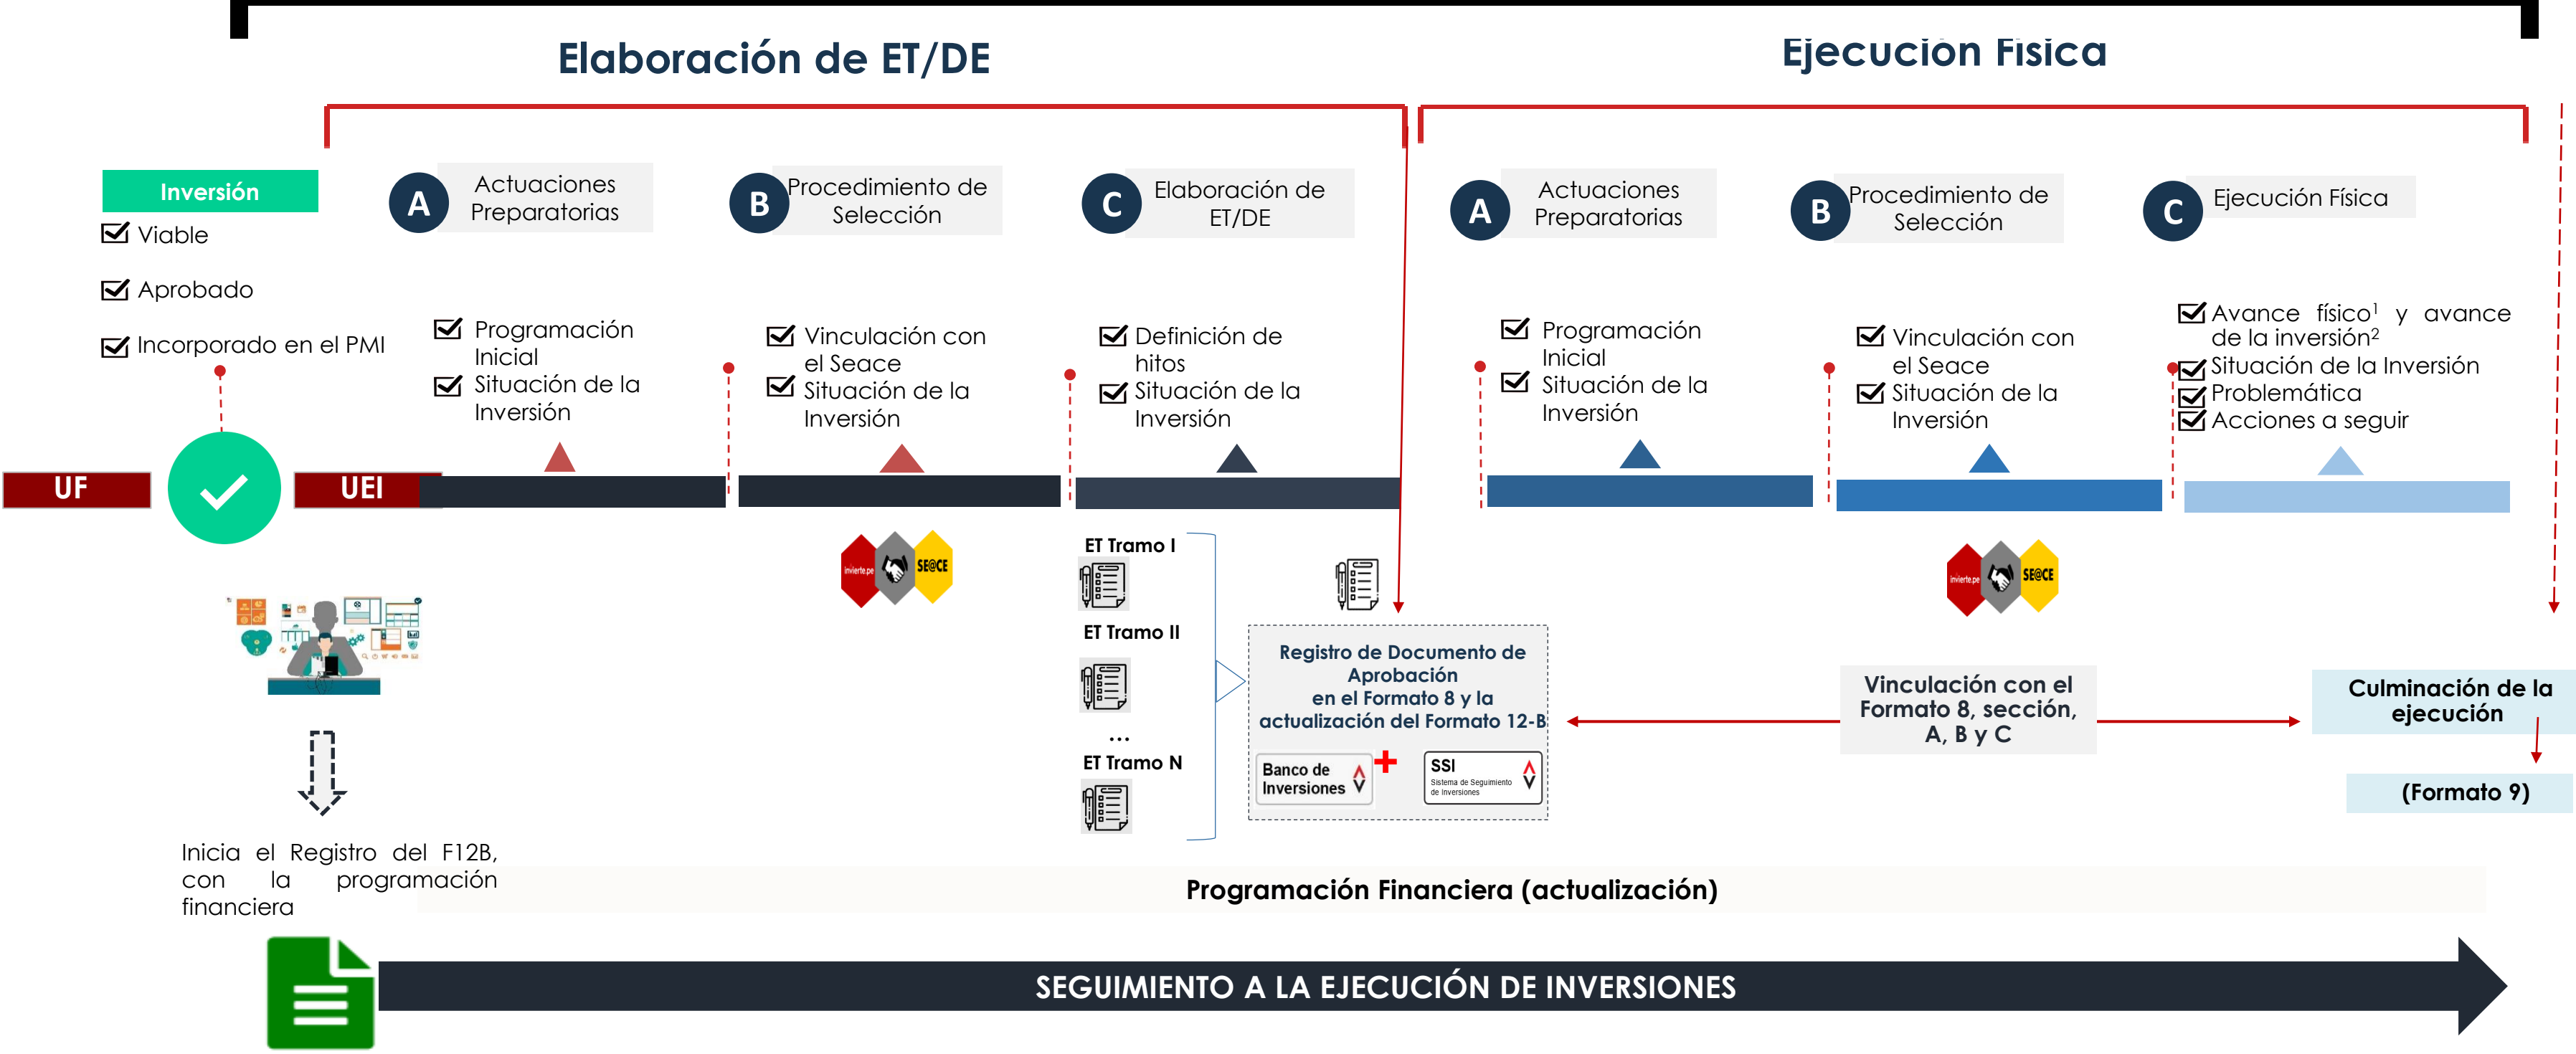

## II. Estructura del Formato N° 12-B

---

# ¿Qué contiene el F12-B?



Datos generales de la Inversión



Ejecución Financiera



Expediente Técnico/ Documento Equivalente



Avance de la Inversión y Ejecución Física



Contrataciones

# 1. Datos generales de la Inversión

## IMPORTANCIA



Brinda información actualizada de las inversiones en la fase de ejecución.



Permite conocer el presupuesto asignado en el año fiscal y su inclusión en el PMI y los responsables de la ejecución


## 2. Ejecución Financiera



### IMPORTANCIA

- ✓ Establecer la **línea base** para **medir el desempeño** de la ejecución financiera.
- ✓ Brinda **alerta del avance** de ejecución financiera con **respecto a lo programado** en el año fiscal.
- ✓ **Herramienta de planificación** para la programación presupuestal anual y sus modificaciones.
- ✓ Información actualizada de la ejecución financiera de la inversión.

### 3. Expediente Técnico/Documento Equivalente

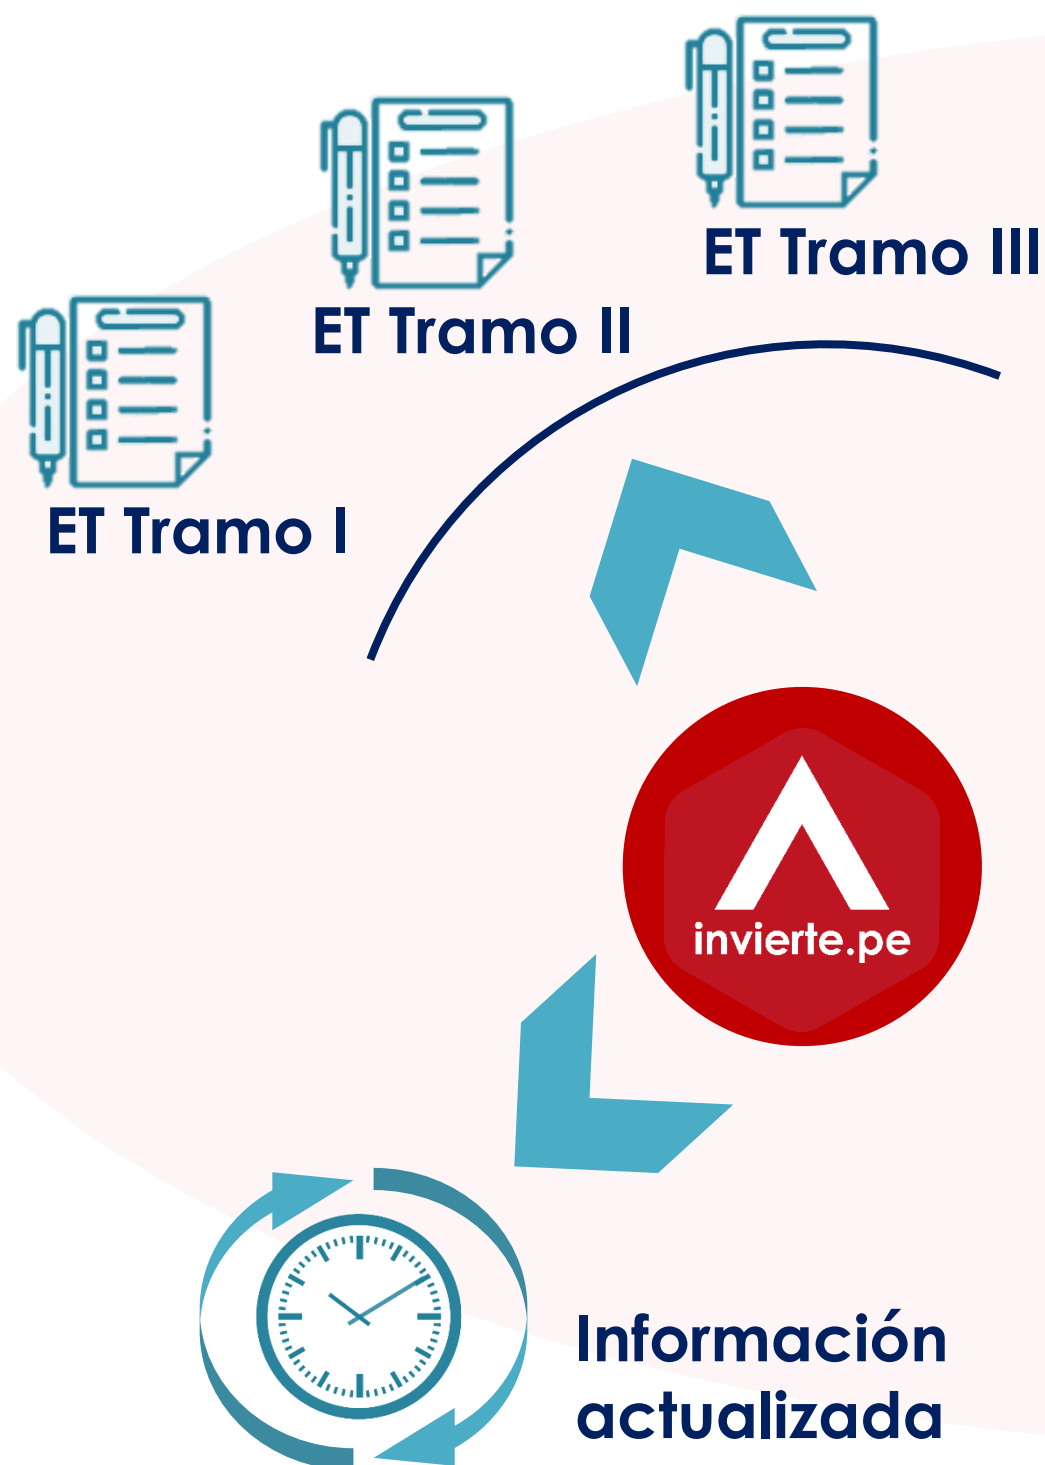

#### IMPORTANCIA

- ✓ Trazabilidad de la información de los **múltiples ET/DE** que tiene la inversión.
- ✓ Permite realizar el seguimiento a las **etapas de la contratación del ET/DE**:
  - ✓ Actuaciones preparatorias
  - ✓ Procedimiento de selección
  - ✓ Elaboración de ET/DE
- ✓ Información actualizada de la **situación y estado de la elaboración de ET/DE** y brinda alertas sobre el avance.
- ✓ La información se encuentra **vinculada con el SEACE**
- ✓ La información mostrada es de **acceso público**.



## 4. Avance de la inversión y ejecución física



### IMPORTANCIA

- ✓ Permite conocer la **situación actual**, el **avance físico** y el **avance de la inversión**.
- ✓ Brinda **alerta del avance de ejecución física** con respecto a lo programado.
- ✓ Información sobre los **riesgos y problemática de la inversión** para una oportuna toma de decisiones.
- ✓ La información mostrada es de **acceso público** y contribuye a la **transparencia de la información**.

## 5. Contrataciones

### IMPORTANCIA

- ✓ Muestra los **procedimientos de selección vinculados a la inversión**, facilitando el seguimiento en la fase de ejecución.
- ✓ **Transparencia en la información** y la verificación del **estado de las contrataciones**.
- ✓ **Acceso a medios de verificación** (acceso a los contratos).



# ¿Qué es la vista resumen?

La vista resumen es una funcionalidad del Formato 12-B que consolida información actualizada sobre la ejecución inversiones.

Búsqueda por Código


☐ Código SNIP ☒ Código único de inversiones

2485224 Buscar Vista Resumen

Banco de Inversiones Contrataciones Ejecución Financiera INFObras

Código único de inversiones	2485224	Fecha de Registro	25/03/2020
Código SNIP		Tipo de inversión	INVERSIONES IOARR
Nombre PIP	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, TOMOGRAFO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC		
Cadena Funcional	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		
Unidad Formuladora (UF)	DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL APURIMAC		
Unidad Evaluadora (OPI)	-		
Beneficiarios	0	Fuente de Financiamiento:	
Situación	APROBADO	Nivel Requerido para Viabilidad	
Último Estudio y Calificación	-	Estado de la Inversión	ACTIVO
Monto Viable/Aprobado	3,566,950		
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	0	Monto actualizado	2,866,782.2
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No	Monto laudo	0
¿Tiene expediente técnico o documento equivalente registrado?		Monto carta fianza	0
¿Tiene registro de Seguimiento?	Sí	¿Tiene registro de cierre?	


Haga clic aquí para ir a la versión

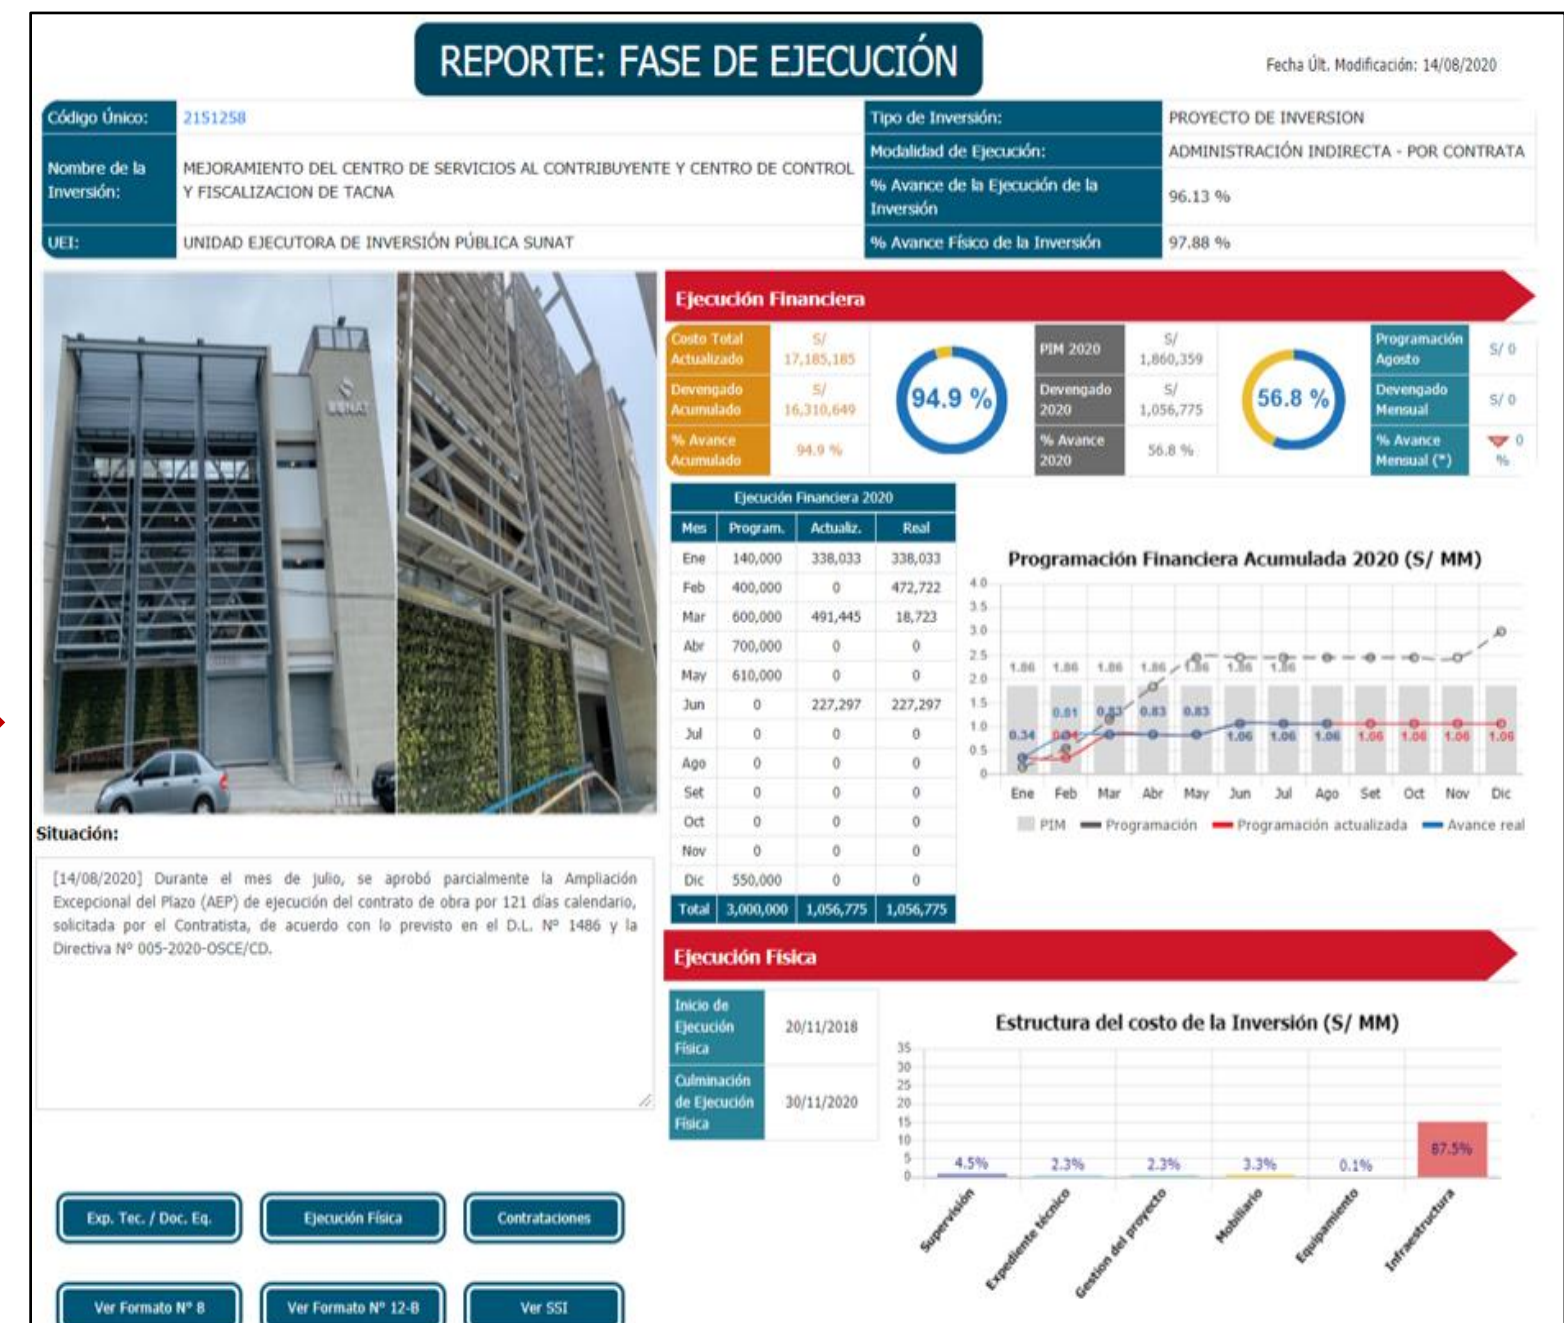



# ¿Qué es la vista resumen?

## Datos generales

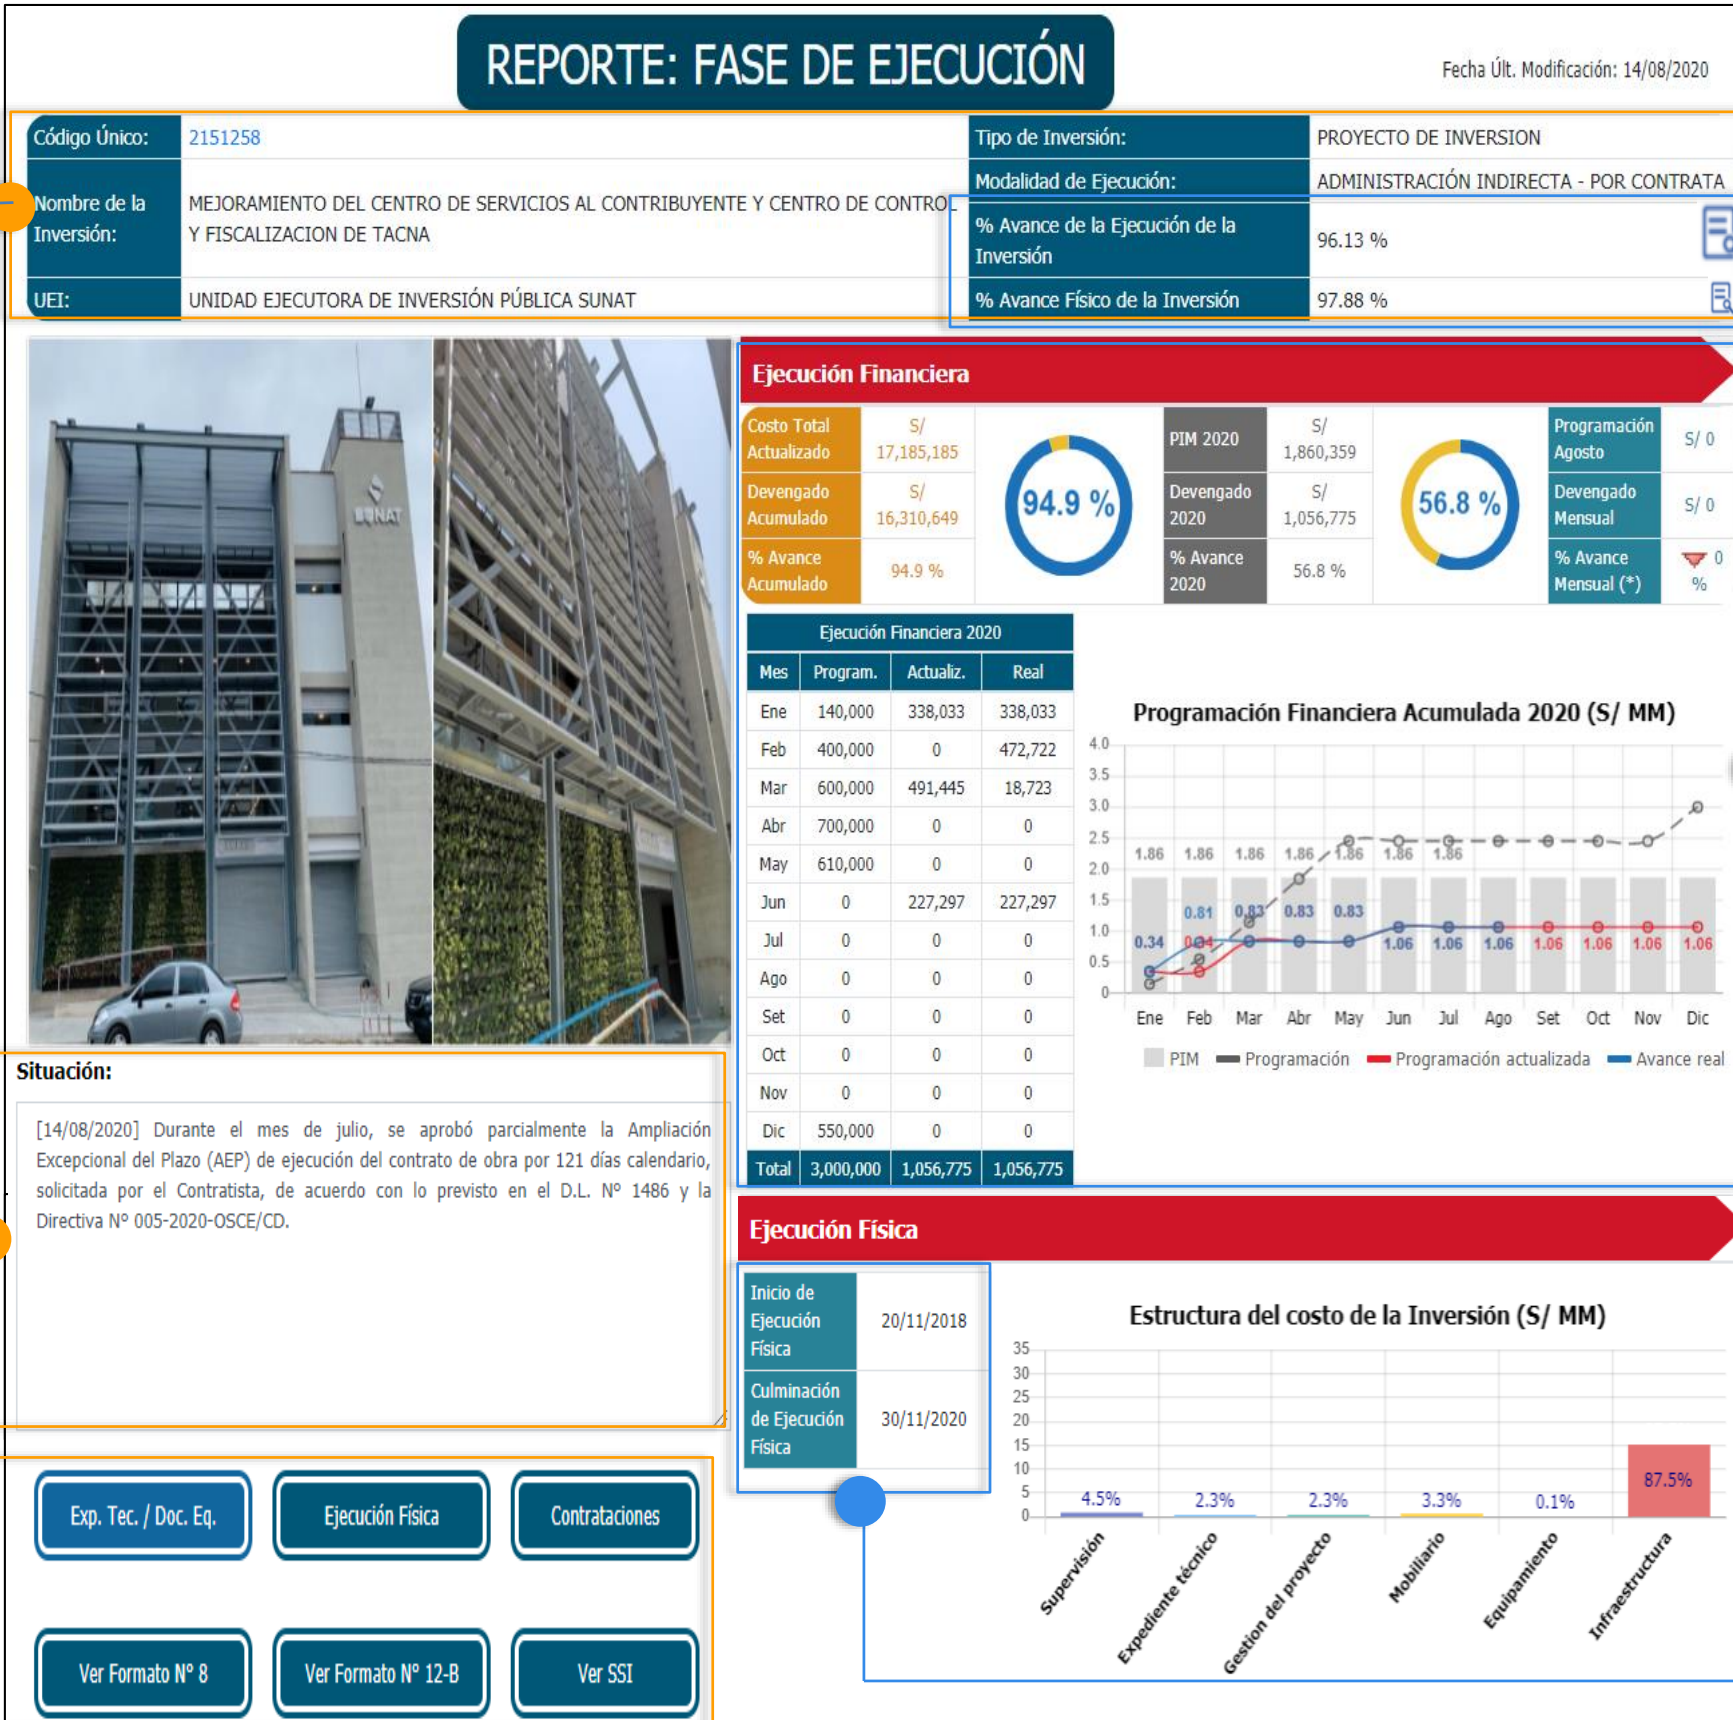

## Avance de la inversión y avance físico

## Ejecución Financiera

## Situación de la inversión

## Información del ET/DE, ejecución física, Contrataciones, F8 y SSI

## Fecha de inicio y culminación de la ejecución física

# Vista resumen del Formato 12-B

## EXPEDIENTE TECNICO/DE

### REPORTE: FASE DE EJECUCIÓN

Fecha Últ. Modificación: 14/08/2020

Código Único: 2151258

Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA


UEI: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT

Tipo de Inversión: PROYECTO DE INVERSIÓN

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

% Avance de la Ejecución de la Inversión: 96.13 %

% Avance Físico de la Inversión: 97.88 %



#### Ejecución Financiera


Costo Total Actualizado	S/ 17,185,185	PIM 2020	S/ 1,860,359	Programación Agosto	S/ 0
Devengado Acumulado	S/ 16,310,649	Devengado 2020	S/ 1,056,775	Devengado Mensual	S/ 0
% Avance Acumulado	94.9 %	% Avance 2020	56.8 %	% Avance Mensual (*)	0 %

94.9 %

56.8 %

Mes	Program.	Actualiz.	Real
Ene	140,000	338,033	338,033
Feb	400,000	0	472,722
Mar	600,000	491,445	18,723
Abr	700,000	0	0
May	610,000	0	0
Jun	0	227,297	227,297
Jul	0	0	0
Ago	0	0	0
Sep	0	0	0
Oct	0	0	0
Nov	0	0	0
Dic	550,000	0	0
Total	3,000,000	1,056,775	1,056,775


#### Programación Financiera Acumulada 2020 (S/ MM)



#### Ejecución Física

Inicio de Ejecución Física	20/11/2018
Culminación de Ejecución Física	30/11/2020

#### Estructura del costo de la Inversión (S/ MM)



Situación:

[14/08/2020] Durante el mes de julio, se aprobó parcialmente la Ampliación Excepcional del Plazo (AEP) de ejecución del contrato de obra por 121 días calendario, solicitada por el Contratista, de acuerdo con lo previsto en el D.L. N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD.

Exp. Tec. / Doc. Eq.

Ejecución Física

Contrataciones

Ver Formato N° 8

Ver Formato N° 12-B

Ver SSI



### EXPEDIENTE TECNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código Único: 2151258

Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA

Tipo de Inversión: PIP MAYOR (SNIP)

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

#### EXPEDIENTE TÉCNICO : 1

Descripción	Fecha de Registro	Modalidad de Ejecución	Ver Detalle
EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	07/10/2019	ADMINISTRACION DIRECTA	

#### EXPEDIENTE TÉCNICO POR AI

ETAPA	HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA ACTUALIZADA	FECHA FINAL
Elaboración de ET	Inicio	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014
Elaboración de ET	Culminación	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016
Elaboración de ET	Aprobación	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018

#### ESTADO SITUACIONAL DEL ET/DE

PERIODO	COMENTARIO
10/2019	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO Y APROBADO

#### ANTECEDENTES

COMENTARIO	DESCARGA SUSTENTO
LA INVERSIÓN CUENTA CON 5 EXPEDIENTE TÉCNICOS DE LOS CUALES EL PRESENTE ET CORRESPONDE AL V	







# Vista resumen del Formato 12-B

## CONTRATACIONES



### CONTRATACIONES: PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

**Código Único:** 2015918

**Nombre de la Inversión:** INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ

**Tipo de Inversión:** PIP MAYOR (SNIP)

**Modalidad de Ejecución:** ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

● Continuidad en el procedimiento
 ● Con modificación en el cronograma
 ● Sin continuidad en el procedimiento

**CONSULTORIAS DE OBRA : 4**

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle

**OBRAS : 3**

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle

**BIENES : 14**

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-22-2020-GRAP-3	CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 54414 RUINAS DE PUCARA IE 54391 HUTCHIMUA IE 54455 QUISCABAMBA IE 54427 SANTA CRUZ DE NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI VILCABAMBA CHUQIBAMBILLA-GRAL-APURIMAC	CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA SANTA CRUZ	3	31/08/2020	Convocado	0	

# ¿Habrá nuevas implementaciones?

## VINCULACION SIGA

- ✓ Cuadro de necesidades
- ✓ Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras

## VINCULACIÓN SEACE Y BANCO DE INVERSIONES (II Etapa)

- ✓ Adicional
- ✓ Arbitrajes
- ✓ Garantías
- ✓ Resoluciones.

## VINCULACIÓN CON INFOBRAS

- ✓ Acciones de control vinculados a la inversión
- ✓ Oportunidad de información
- ✓ Transparencia de la información

## VINCULACIÓN GEOINVIERTE CON FORMATO DE IDEA

- ✓ Vinculación entre la idea (formulación) y el lugar de intervención.
- ✓ Saneamiento Físico y Legal
- ✓ Duplicidad de intervención
- ✓ Zona de riesgo
- ✓ Servicios básicos



# Material didáctico

## INSTRUCTIVOS



- ✓ **Instructivo del avance de la inversión**  
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_publica/docs/F12B/Instructivo\\_AvanceFisico.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/F12B/Instructivo_AvanceFisico.pdf)
- ✓ **Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE**  
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_publica/docs/Instructivo\\_BI/Instructivo\\_ET.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_ET.pdf)
- ✓ **Instructivo de la vinculación SEACE y Banco de Inversiones**  
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_publica/docs/seguimiento/VinculacionSeace.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/seguimiento/VinculacionSeace.pdf)
- ✓ **Instructivo del reportes de Inversiones para Responsables de OPMI**  
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_publica/docs/Instructivo\\_BI/Reporte\\_OPMI.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Reporte_OPMI.pdf)

## VIDEO-TUTORIAL



- ✓ **Videotutorial del avance de la inversión**  
<https://www.youtube.com/watch?v=7fqdNQ5MbF0&t=19s>
- ✓ **Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE**  
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_publica/docs/Instructivo\\_BI/Tutorial\\_ET.mp4](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Tutorial_ET.mp4)
- ✓ **Videotutorial de la vinculación SEACE y Banco de Inversiones**  
<https://www.youtube.com/watch?v=RjfodkDXluM&t=3s>
- ✓ **Videotutorial de reportes de Inversiones para Responsables de OPMI**  
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_publica/docs/Instructivo\\_BI/Reporte\\_OPMI.mp4](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Reporte_OPMI.mp4)

# ¿Aún tienes dudas?



## Consultas generales

Envía tu consulta a:

[invierte.pe@mef.gob.pe](mailto:invierte.pe@mef.gob.pe)



## Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020>



## Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos a nivel nacional y agenda tu reunión virtual.

**CONECTA MEF**

[www.mef.gob.pe/conectamef](http://www.mef.gob.pe/conectamef)

*Todas nuestras conferencias y capacitaciones  
las encuentras en nuestra web, en el link:*

## CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

<https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020>

*en la sección de:*



**EVENTOS REALIZADOS**





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

invierte.pe
