



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones

Segundo Ciclo de Conferencias y Capacitaciones Virtuales 2020

Capacitación virtual:

“Seguimiento a la ejecución de las inversiones”



12:00 m.



Viernes 4 de setiembre



Empezaremos en unos minutos, gracias por su asistencia.....

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

setiembre 2020



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

 invierte.pe

1

Instrumentos de seguimiento a la ejecución de las inversiones


Instrumentos de seguimiento a la ejecución de las inversiones



i) Formato de seguimiento a la ejecución de las inversiones (F N°12-B).



ii) Módulo de Reporte de seguimiento de inversiones de la OPMI

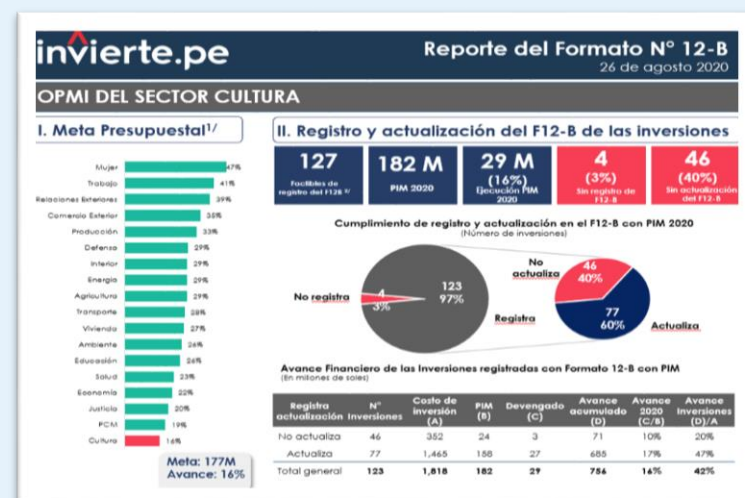

iii) Reportes de seguimiento de inversiones

I. Formato de Seguimiento a la ejecución de las inversiones



OPMI



Con usuario y contraseña



A Definición

Es una herramienta de **gestión** que permite el **seguimiento a las inversiones**, en base a la información proporcionada por la UEI y los sistemas administrativos vinculados la toma de decisiones.

B Finalidad

Brindar información de **la situación actual** de las inversiones en fase de ejecución.

C Estructura

- Expediente Técnico/ Documento Equivalente
- Ejecución Física
- Ejecución Financiera
- Estado Situacional
- Contrataciones



IMPLEMENTACIONES



REGISTRO DE MÚLTIPLES EXPEDIENTES TÉCNICOS



VINCULACIÓN DE SEACE



REGISTRO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN



I.I Registro de Múltiples Expedientes Técnicos

SITUACIÓN IDENTIFICADA

ET Tramo I



ET Tramo II



...

ET Tramo N



Banco de Inversiones



Único registro de ET/DE



¿Cuál ET/DE registro?
¿Qué registro del ET/DE?
¿Qué estado situacional registro del ET/DE?

✓ Registro único de expediente técnico

SITUACIÓN ACTUAL

ET/DE

Tipo de documento
EXPEDIENTE TÉCNICO

Descripción
ET SALDO DE OBRA

Modalidad de ejecución
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Etapas
ELABORACIÓN DEL ET

Buscar

Atención:

- (1) Elimine los hitos con los que no trabajará.
- (2) Ingrese la fecha programada por cada hito.
- (3) Finalice haciendo clic en el botón "Definir hitos".

Definir hitos



	Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado
	FIRMA DE CONTRATO	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
	INICIO DE PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
	ENTREGABLE 1	Fecha de entrega	Fecha de entrega	
	ENTREGABLE 2	Fecha de entrega	Fecha de entrega	
	ENTREGABLE 3	Fecha de entrega	Fecha de entrega	
	ENTREGABLE 4	Fecha de entrega	Fecha de entrega	
	ENTREGABLE 5	Fecha de entrega	Fecha de entrega	
	APROBACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	

Cancelar

✓ Registro de múltiples expedientes técnicos o documentos equivalentes.

I.I Registro de Múltiples Expedientes Técnicos

REPORTE DEL REGISTRO DE MÚLTIPLES ET/DE

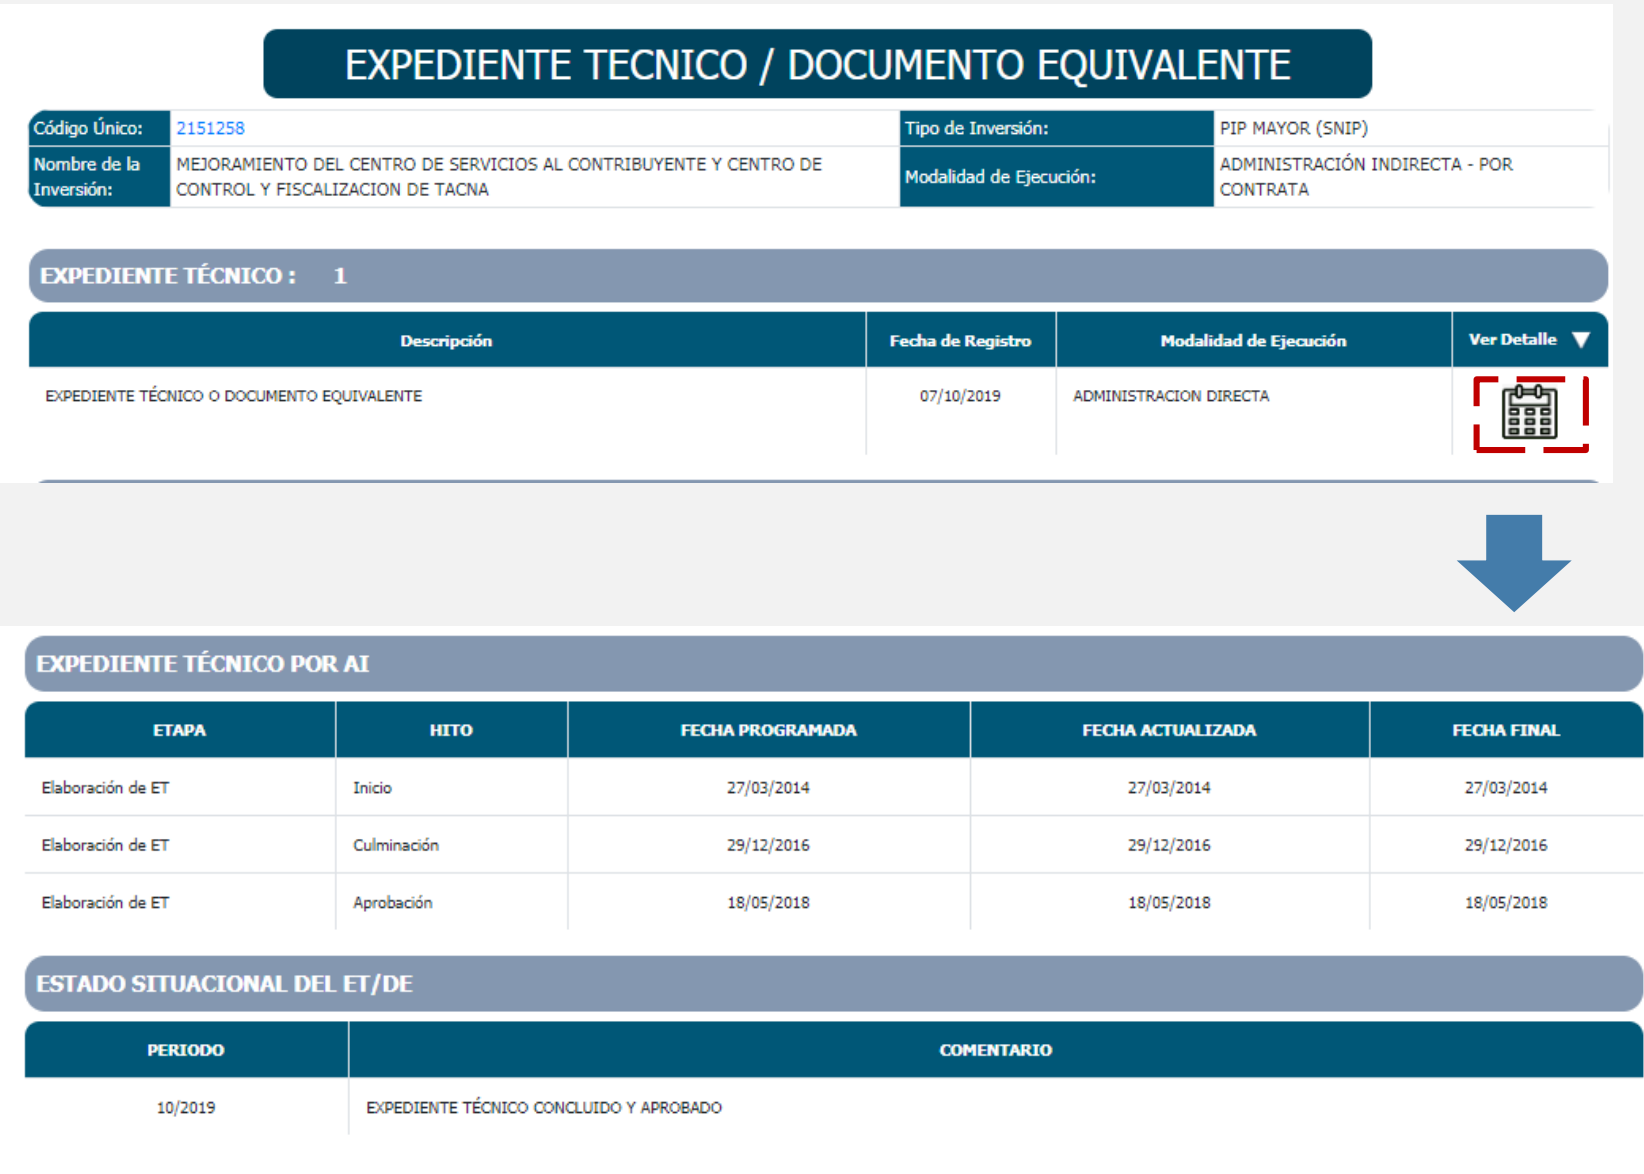


I.I Registro de Múltiples Expedientes Técnicos

Beneficios



I.II Vinculación SEACE y Banco de Inversiones

SITUACIÓN IDENTIFICADA



SITUACIÓN ACTUAL

Vinculación SEACE y BANCO DE INVERSIONES

- ✓ Evitar duplicidad de registros
- ✓ Oportunidad en la información
- ✓ Trazabilidad del seguimiento de inversiones
- ✓ Transparencia en la información
- ✓ Acceso a medios de verificación.

I.II Vinculación SEACE y Banco de Inversiones

REPORTE DE LA VINCULACIÓN DE SEACE Y BANCO DE INVERSIONES

REPORTE: FASE DE EJECUCIÓN

Código Único: 2015918

Nombre de la Inversión: INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ

UEI: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PROVIAS NACIONAL

Tipo de Inversión: PROYECTO DE INVERSION

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Últ. Período Registrado (F12-B): 11-2019

Fecha Últ. Modificación (F12-B): 08/06/2020

% Avance de la Ejecución de la Inversión



Ejecución Financiera

Costo Total Actualizado S/ 690,053,062

Devengado Acumulado S/ 562,622,094

% Avance Acumulado 81.5 %

81.5 %

PIM 2020 S/ 3,740,615

Devengado 2020 S/ 857,469

% Avance 2020 22.9 %

22.9 %

Programación Junio S/ 170,461

Devengado Mensual S/ 2,940

% Avance Mensual (*) 1.7 %

Ejecución Física

Inicio de Ejecución Física 10/09/2018

Culminación de Ejecución Física 25/12/2020

% Avance Físico 0 %

Estructura del costo de la Inversión (S/ MM)

Supervisión 2.2%

Expediente técnico 0.2%

Gestión del proyecto 2.9%

Infraestructura 94.7%

Situación:

[10/12/2019] TRAMO I: EN EJECUCIÓN AVANCE DE 15.91% AL 31 DE OCTUBRE 2019

TRAMO II: EN EJECUCIÓN AVANCE DE 25.68% AL 31 DE OCTUBRE 2019

TRAMO III: EN ESTUDIO DEFINITIVO

Ver detalle

Exp. Tec. / Doc. Eq.

Ejecución Física

Contrataciones

Ver Formato N° 8

Ver Formato N° 12-B

Ver SSI

CONTRATACIONES: PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

Código Único: 2015918

Nombre de la Inversión: INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ

Tipo de Inversión: PIP MAYOR (SNIP)

Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Continuidad en el procedimiento

Con modificación en el cronograma

Sin continuidad en el procedimiento

CONSULTORIAS DE OBRA : 4

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------

OBRAS : 3

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------

BIENES : 5

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------

SERVICIOS : 3

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Item	Número de Item	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------



I.II Vinculación SEACE y Banco de Inversiones

Beneficios



Evitar duplicidad de registros

En los formatos del Banco de Inversiones (Formato 12-B) no se solicitará información registrada del SEACE.



Oportunidad en la información

Todos los procedimientos de selección vinculados a la inversión.



Trazabilidad del seguimiento de inversiones

Facilita el seguimiento de la fase de ejecución de las inversiones



- Transparencia en la información: La información mostrada es de acceso público, verificando el estado de las inversiones.



- Acceso a medios de verificación mediante el acceso a los contratos

I.III Avance de la ejecución de la inversión

SITUACIÓN IDENTIFICADA

Avance de la
Ejecución física



Se refiere al desarrollo de las metas de los productos a través de ejecución de las obras, bienes y servicios.



Avance de la
Ejecución financiera



Se refiere al devengado de los gastos derivados por la ejecución obra, la adquisición de los bienes y/o la prestación de los servicios.



- ☒ Registro manual del avance de la inversión.
- ☒ Omisión en el registro del avance de la inversión.
- ☒ Ausencia de información del avance físico y avance total de la inversión.

SITUACIÓN ACTUAL


Estimación del avance de la inversión BANCO DE INVERSIONES

Avance y Situación		Estimación
Actualizado al:		23/05/2020
Avance	Avance de la ejecución de la inversión:	40.31 %
	Avance de la ejecución física (*):	39.86 %
(*)El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.		
		Nueva declaración

- ☒ Cálculo automático del avance de la inversión en base a registros de los operadores por producto y componente.
- ☒ Información completa del registro del avance de la inversión.
- ☒ Diferenciación entre el avance físico y avance total de la inversión.


I.III Avance de la ejecución de la inversión

REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

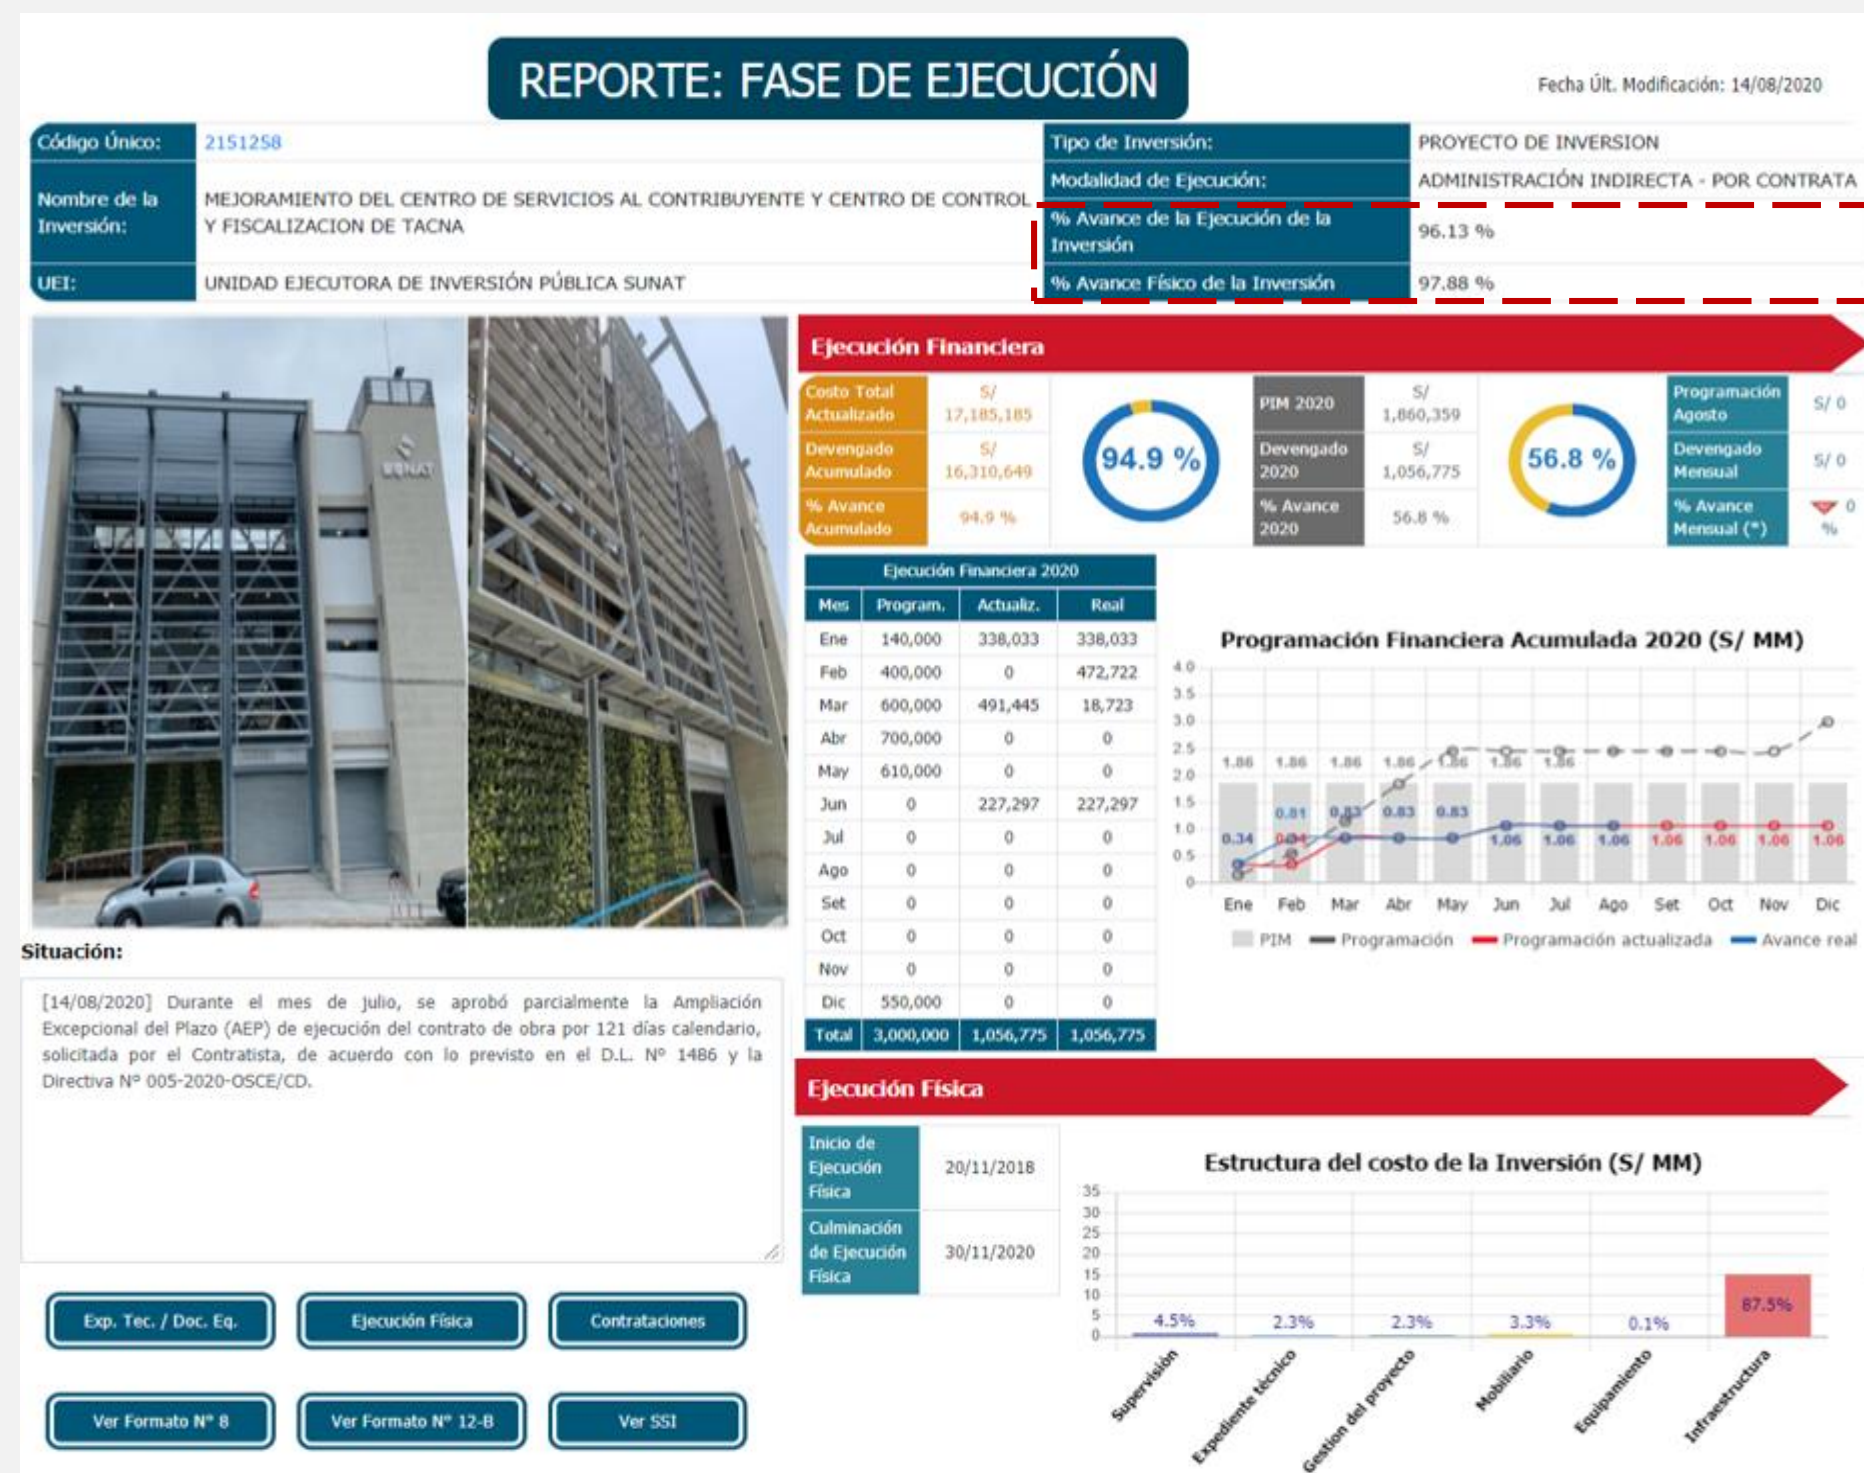

I.III Avance de la ejecución de la inversión

Beneficios



Cálculo automático del avance de la inversión en base a registros de los operadores por producto y componente.



Información completa del registro del avance de la inversión.



Diferenciación entre el avance físico y avance total de la inversión.

II. Módulo de inversiones para la OPMI

invierte.pe

REPORTE DE INVERSIONES

OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

INVERSIONES: 3,705

Nº	Código Único	Código SISP	Nombre de la inversión	Estado	Situación	Fecha Vigencia	Costo Aprobado (\$)	PIA (\$)	PMU (\$)	Certificado (\$)	Comprometido (\$)	Devengado acumulado al 2019 (\$)	Devengado 2020 (\$)
1	215818	12683	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO DE LA LOCALIDAD DE MONZA Y CENTROS POBLADOS DE PUEBLO LUTY Y SAN BENITO	ACTIVO	VIABLE	14-May-2018	18,831,083	0	72,580	0	0	77,420	0
2	243502	243502	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMANDANCIA CAMPESINA DE CRUZ PARA DEL DISTRITO DE CAYMAHUASI - PROVINCIA DE CHIMBACALCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	ACTIVO	VIABLE	20-Oct-2018	2,125,779	0	0	0	0	0	0
3	245478	245478	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA REGIÓN TAMBORUELO DEL DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	ACTIVO	VIABLE	21-May-2020	12,841,803	0	0	0	0	0	0
4	285810	285810	CREACIÓN DEL SERVICIO DE GASEOS LIBERANDO EN DISTRITOS RINGUAYO DE LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO Y LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ACTIVO	VIABLE	04-Oct-2019	286,740,726	0	660,000	0	0	0	0
5	229630	260431	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO LOS ARENALES - CONDONA - HUAYTARA - HUANUCU	ACTIVO	VIABLE	28-Apr-2014	1,874,803	0	0	0	0	0	0
6	225668	302736	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE TELEFÉRICO QUE CONECTE LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN JUAN DE LARGANCHO - PROVINCIA DE LIMA	ACTIVO	VIABLE	14-Apr-2015	330,734,766	0	0	0	0	982,813	0
7	241325	241325	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO DEL ESCUELA GARCÍA DE MACHO - SAN ENRIQUE DISTRITO DE PASOANCA DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRUJILLO DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	ACTIVO	VIABLE	09-May-2018	283,626,108	0	0	0	0	0	0


OPMI



Con usuario y contraseña

A Definición

Es una herramienta para la OPMI que contiene información relevante de las inversiones registrada en los diversos sistemas administrativos

B Finalidad

Permite tener información oportuna y transparente sobre la ejecución de las inversiones para una adecuada toma de decisiones y el logro de las metas establecidas para el cierre de brechas.

C Estructura

- Información de la inversión.
- Información de seguimiento de la inversión
- Información de cierre de la inversión.
- Información de registro de ET/DE de la inversión.
- Información sobre reactivación en el marco del COVID-19

II. Módulo de inversiones para la OPMI-Vinculaciones

- Programación Multianual
- Consulta amigable - SIAF
- Formato N° 08
- Datos generales

- Ampliación de plazo por COVID 19
- Cuantificación de costos por COVID 19
- Costos COVID 19



- Números de ET/DE
- Descripción de ET/DE
- Etapa
- Estado
- Problemática

- Situación de la inversión
- Avance de ejecución
- Avance físico
- Programación financiera
- Ejecución financiera real
- Formato N° 12-B
- Formato N° 09

II. Modulo de inversiones para la OPMI

REPORTE DE INVERSIONES DE LA OPMI

invierte.pe

Fecha Consulta: 23/08/2020

REPORTES DE INVERSIONES

OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

INVERSIONES: 3,705

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN

N°	Código Único	Código SNIP	Nombre de la inversión	Estado	Situación	Fecha viabilidad	Costo Actualizado (S/)	PIA (S/)	PIM (S/)	Certificado (S/)	Comprometido (S/)	Devengado acumulado al 2019 (S/)	Devengado 2020 (S/)
1	2156818	125853	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MONZON Y CENTROS POBLADOS DE PISTA LOLI Y SAN BENITO.	ACTIVO	VIABLE	14-May-2010	18,031,063	0	72,500	0	0	77,420	0
2	2435692	2435692	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CRUZ PAMPA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	ACTIVO	VIABLE	20-Dic-2018	2,125,778	0	0	0	0	0	0
3	2454710	2454710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA REGION TUMBES PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	ACTIVO	VIABLE	21-May-2020	12,641,603	0	0	0	0	0	0
4	2459010	2459010	CREACION DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO EN DISTRITOS PRIORIZADOS DE LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO Y LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	ACTIVO	VIABLE	04-Oct-2019	266,740,726	0	660,000	0	0	0	0
5	2196300	292431	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO LOS ARENALES - CORDOVA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	ACTIVO	VIABLE	24-Abr-2014	1,074,853	0	0	0	0	0	0
6	2266684	302735	INSTALACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE-TELEFERICO, QUE CONECTE LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA	ACTIVO	VIABLE	14-Abr-2015	330,734,755	0	0	0	0	992,613	0
7	2413676	2413676	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	ACTIVO	VIABLE	09-May-2018	283,626,108	0	0	0	0	0	0
8	2087531	6337	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MONZON Y CENTROS POBLADOS DE PISTA LOLI Y SAN BENITO.	ACTIVO	VIABLE	12-Nov-2008	26,765,870	0	0	0	0	22,659,448	0


II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.1. Filtro avanzado

4.3. Seleccionar campos

4.2. Actualizar datos

4.4. Descargar datos en Excel



N°	Código Único	Código SNIP	
1	2156818	125853	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO LOLI Y SAN BENITO
2	2435692	2435692	MEJORAMIENTO SANITARIA DE E DISTRITO DE CA CUSCO
3	2454710	2454710	MEJORAMIENTO DE LA REGION T

invierte.pe

REPORTES DE INVERSIONES

OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Fecha Consulta: 23/08/2020

INVERSIONES: 3,705

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN													
N°	Código Único	Código SNIP	Nombre de la inversión	Estado	Situación	Fecha viabilidad	Costo Actualizado (S/)	PIA (S/)	PIM (S/)	Certificado (S/)	Comprometido (S/)	Devengado acumulado al 2019 (S/)	Devengado 2020 (S/)
1	2156818	125853	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MONZON Y CENTROS POBLADOS DE PISTA LOLI Y SAN BENITO.	ACTIVO	VIABLE	14-May-2010	18,031,063	0	72,500	0	0	77,420	0
2	2435692	2435692	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CRUZ PAMPA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO.	ACTIVO	VIABLE	20-Dic-2018	2,125,778	0	0	0	0	0	0

II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.1. Filtro avanzado



N°	Código Único	Código SNIP	
1	2156818	125853	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO LOLI Y SAN BENITO
2	2435692	2435692	MEJORAMIENTO SANITARIA DE E DISTRITO DE CAUSCO
3	2454710	2454710	MEJORAMIENTO DE LA REGION T

El operador seleccionará el campo que desea realizar el filtro de interés, en el ejemplo, se quiere filtrar las inversiones con un costo actualizado **mayor o igual a S/ 500 000**.

Búsqueda...

Código Único

Código Único
Código SNIP
Nombre de la inversión
Estado
Situación
Fecha viabilidad
Costo Actualizado (S/)
PIA (S/)
PIM (S/)
Certificado (S/)
Comprometido (S/)
Devengado acumulado al 2019 (S/)
Devengado 2020 (S/)
Fuente de Financiamiento
Pliego
Unidad Ejecutora Presupuestal
Unidad Ejecutora de Inversiones
Tipo Inversión
PMI 2020 (S/)
PMI 2021 (S/)

igual

igual
no igual a
menor que
menor o igual que
mayor que
mayor o igual a
es nulo
no es nulo
está en
no está en

500,000

Buscar

II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.2. Actualizar datos






N°	Código Único	Código SNIP	
1	2156818	125853	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO LOLI Y SAN BENITO
2	2435692	2435692	MEJORAMIENTO SANITARIA DE EL DISTRITO DE CAJACUSCO
3	2454710	2454710	MEJORAMIENTO DE LA REGION T





La información se encontrará actualizada automáticamente acuerdo a los registros de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

Registro no actualizado por la UEI					
N°	Código Único	Código SNIP	Nombre de la inversión	Avance de ejecución de la inversión (%)	Avance fisico de la inversión (%)
1	2159599	224215	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 80691 TUPAC AMARU II DEL CENTRO POBLADO MENOR LLAGUEN, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	0 %	0 %
2	2209389	201622	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE OSCOL , DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	0 %	0 %
3	2190679	287935	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAGUEN, CASERIO DE PARRAPOS Y SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	0 %	0 %
4	2160535	222470	MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN IGNACIO, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	0 %	0 %
5	2295935	338690	CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	0 %	0 %

Registro actualizado por la UEI					
N°	Código Único	Código SNIP	Nombre de la inversión	Avance de ejecución de la inversión (%)	Avance fisico de la inversión (%)
1	2159599	224215	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 80691 TUPAC AMARU II DEL CENTRO POBLADO MENOR LLAGUEN, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	73.9 %	0 %
2	2209389	201622	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE OSCOL , DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	74.5 %	0 %
3	2190679	287935	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLAGUEN, CASERIO DE PARRAPOS Y SINSICAP, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	72.4 %	0 %
4	2160535	222470	MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN IGNACIO, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	0 %	0 %
5	2295935	338690	CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	0 %	0 %

II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.3. Seleccionar campos



N°	Código Único	Código SNIP	
1	2156818	125853	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO LOLI Y SAN BENITO
2	2435692	2435692	MEJORAMIENTO SANITARIA DE E DISTRITO DE CAUSCO
3	2454710	2454710	MEJORAMIENTO DE LA REGION T

El operador puede seleccionar los campos que desea visualizar en el reporte, en el ejemplo, se seleccionó los campos de “Código Único”, “nombre de la inversión”, “PIM” y “Devengado 2020”.

Mostrar/ocultar columnas

4 Columnas disponibles	Ocultar todas	Buscar:	Mostrar todas
<input checked="" type="checkbox"/> Código Único	—		<input checked="" type="checkbox"/> Situación
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre de la inversión	—		<input checked="" type="checkbox"/> Fecha viabilidad
<input checked="" type="checkbox"/> PIM (S/)	—		<input checked="" type="checkbox"/> Costo Actualizado (S/)
<input checked="" type="checkbox"/> Devengado 2020 (S/)	—		<input checked="" type="checkbox"/> Fuente de Financiamiento
			<input checked="" type="checkbox"/> Pliego
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad Ejecutora Presupuestal
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad Ejecutora de Inversiones
			<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Inversión
			<input checked="" type="checkbox"/> PMI 2020 (S/)
			<input checked="" type="checkbox"/> PMI 2021 (S/)
			<input checked="" type="checkbox"/> PMI 2022 (S/)
			<input checked="" type="checkbox"/> Avance de ejecución de la inversión (%)
			<input checked="" type="checkbox"/> Avance físico de la inversión (%)
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA:
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA:
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA:
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA: Abril
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA:
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA:
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA: Julio
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA:
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA:
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA:
			<input checked="" type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA:


Enviar Cancelar

II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.4. Descargar datos en EXCEL



N°	Código Único	Código SNIP	
1	2156818	125853	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO LOLI Y SAN BENITO
2	2435692	2435692	MEJORAMIENTO SANITARIA DE E DISTRITO DE CAUSCO
3	2454710	2454710	MEJORAMIENTO DE LA REGION T

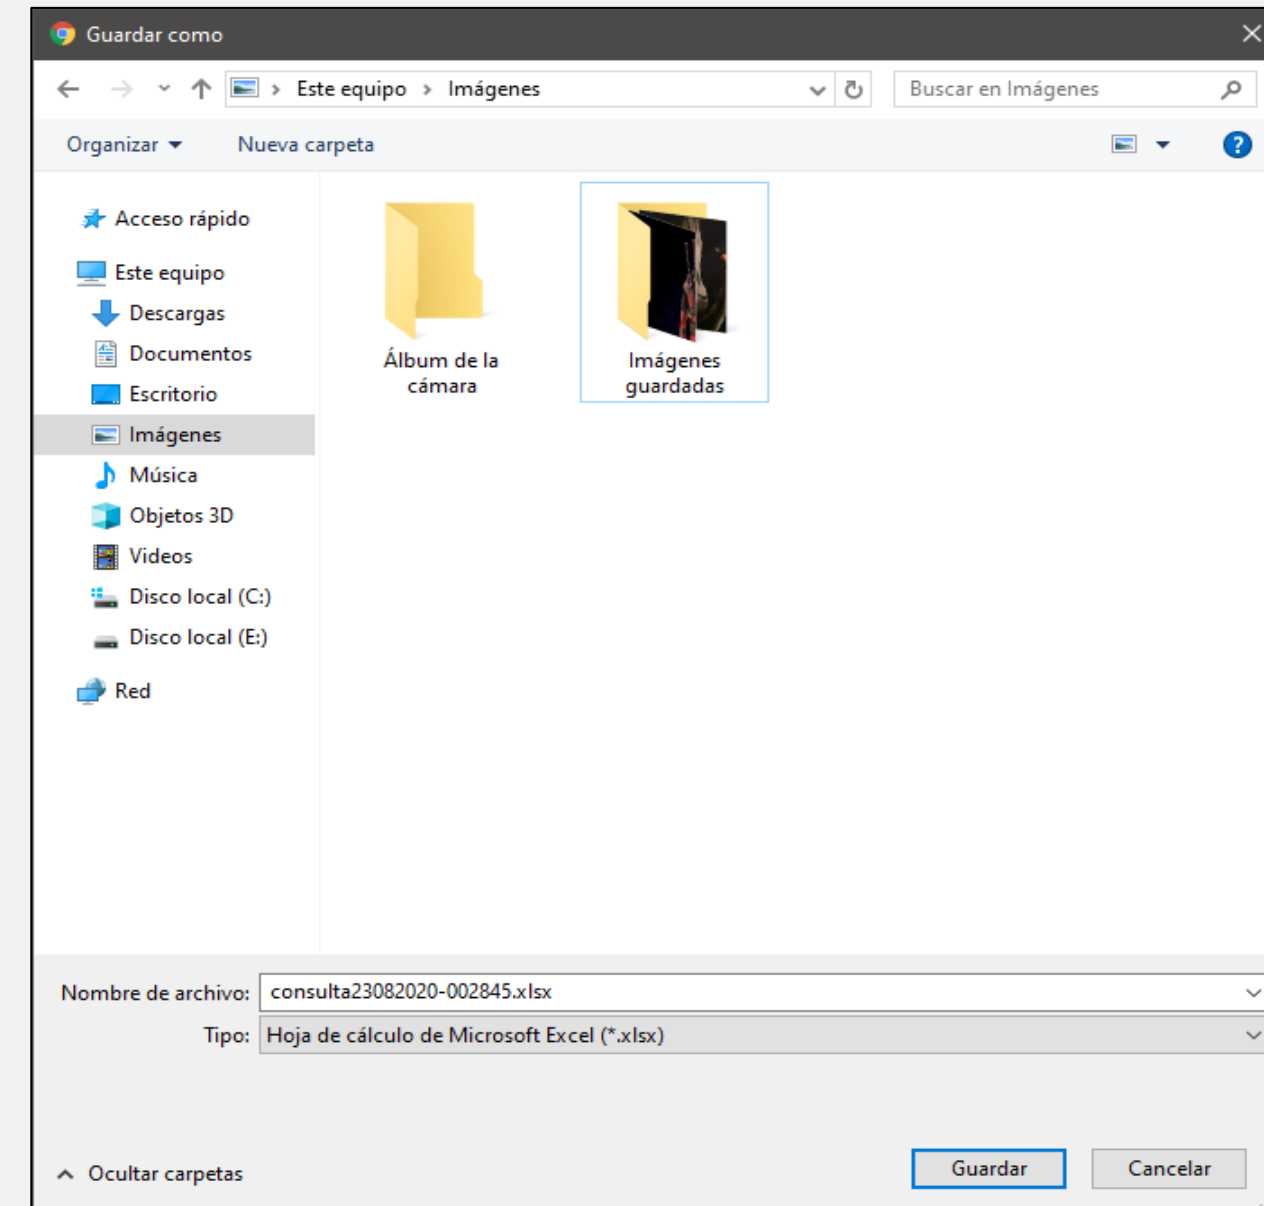


II. Módulo de inversiones para la OPMI





III. Reportes de seguimiento de inversiones

- ☒ Reportes de inversiones no incorporadas en el PMI
- ☒ Registro del Formato N° 9.
- ☒ Reporte de registro y actualización del Formato N°12-B.
- ☒ Registro del avance físico del Formato N°12-B.
- ☒ Check list del Formato 12 –B


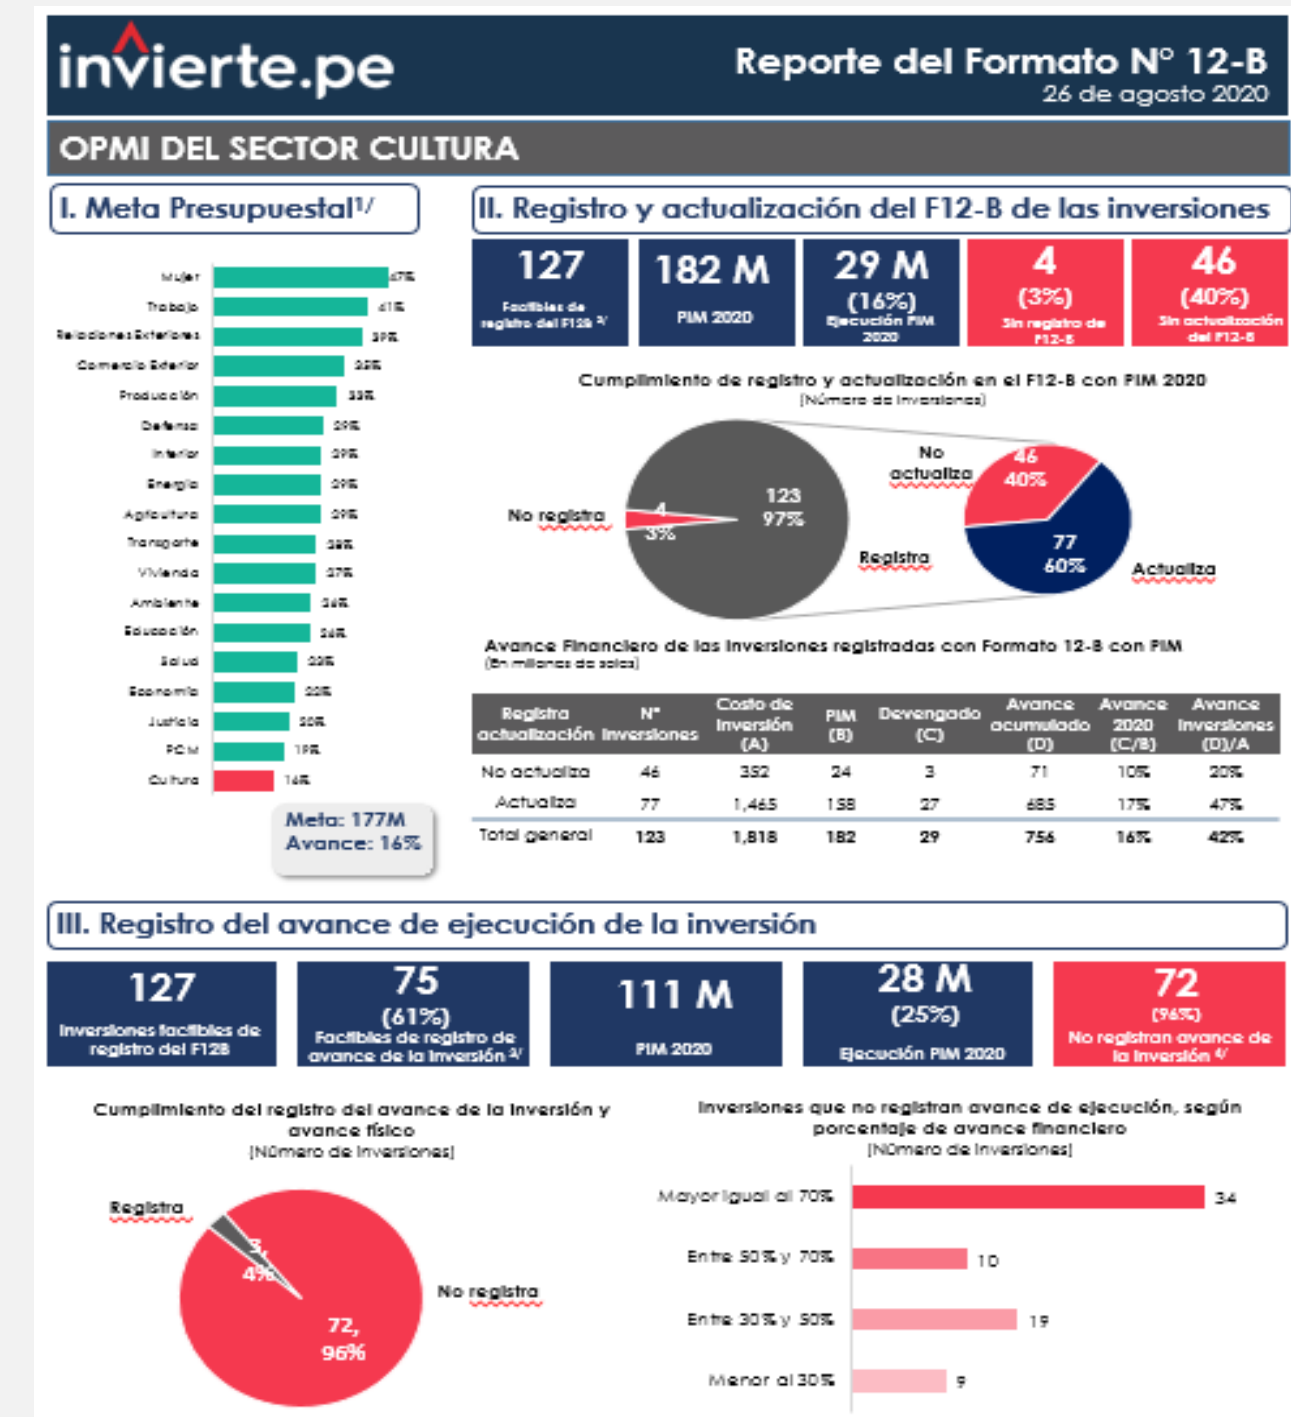


III. Reportes de seguimiento de inversiones

Indicadores de desempeño de inversiones incorporadas en el PMI

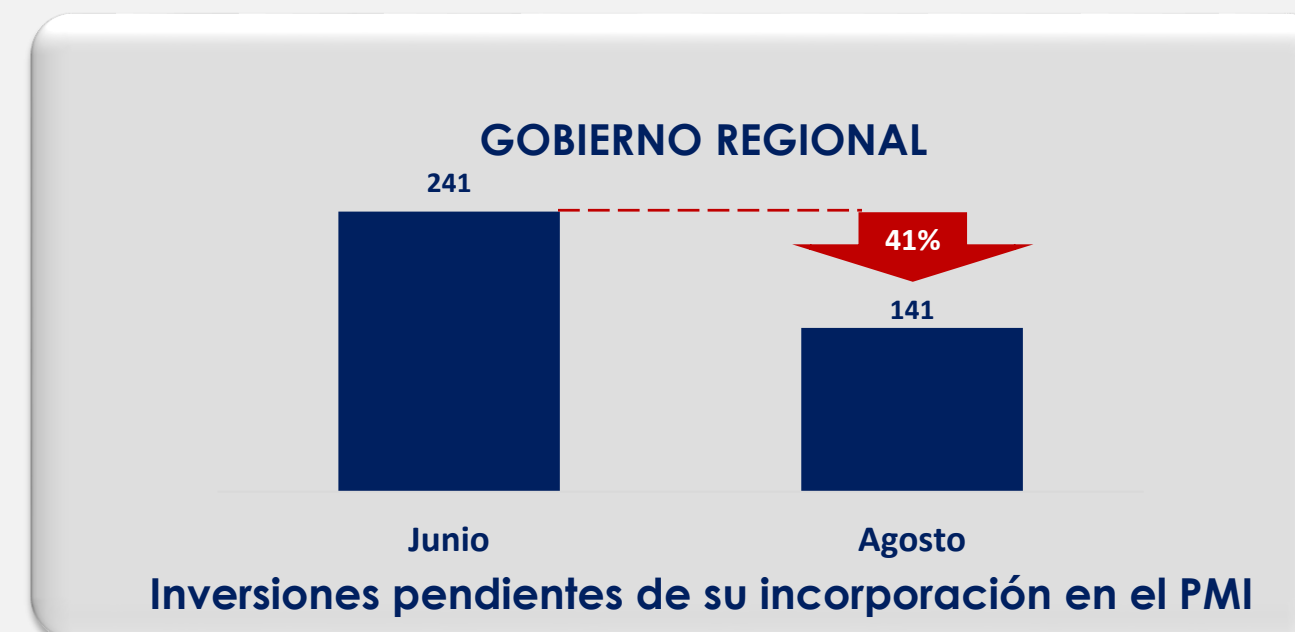
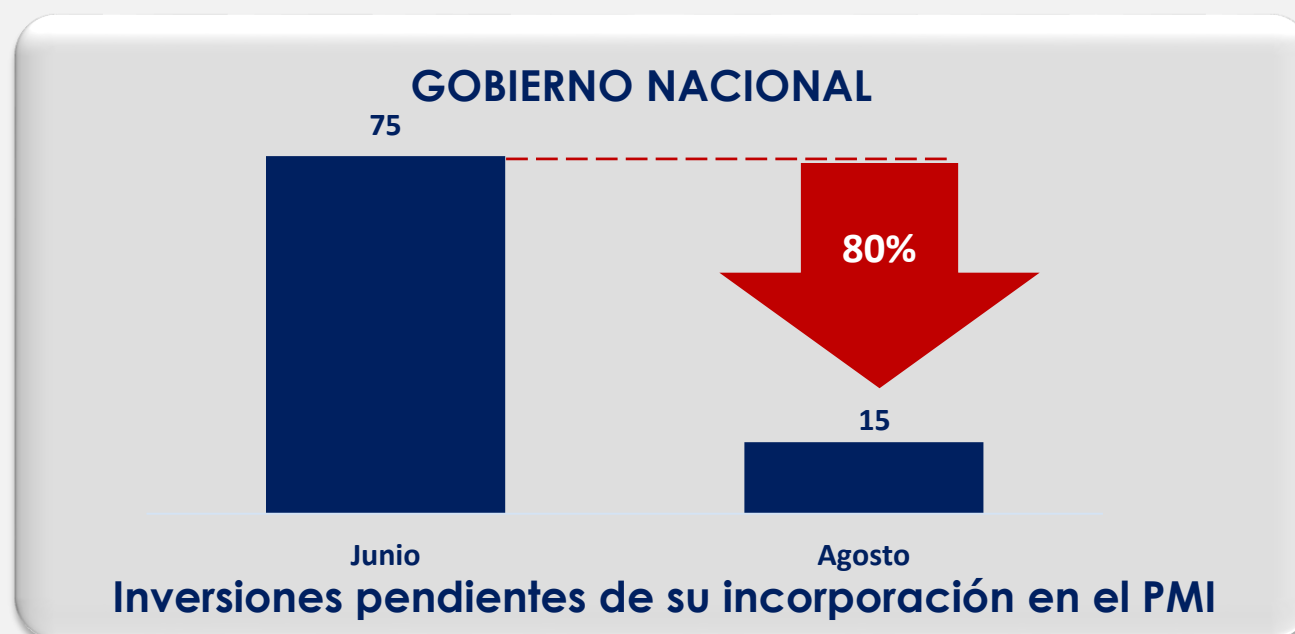


Indicadores de desempeño en el registro del Formato de cierre

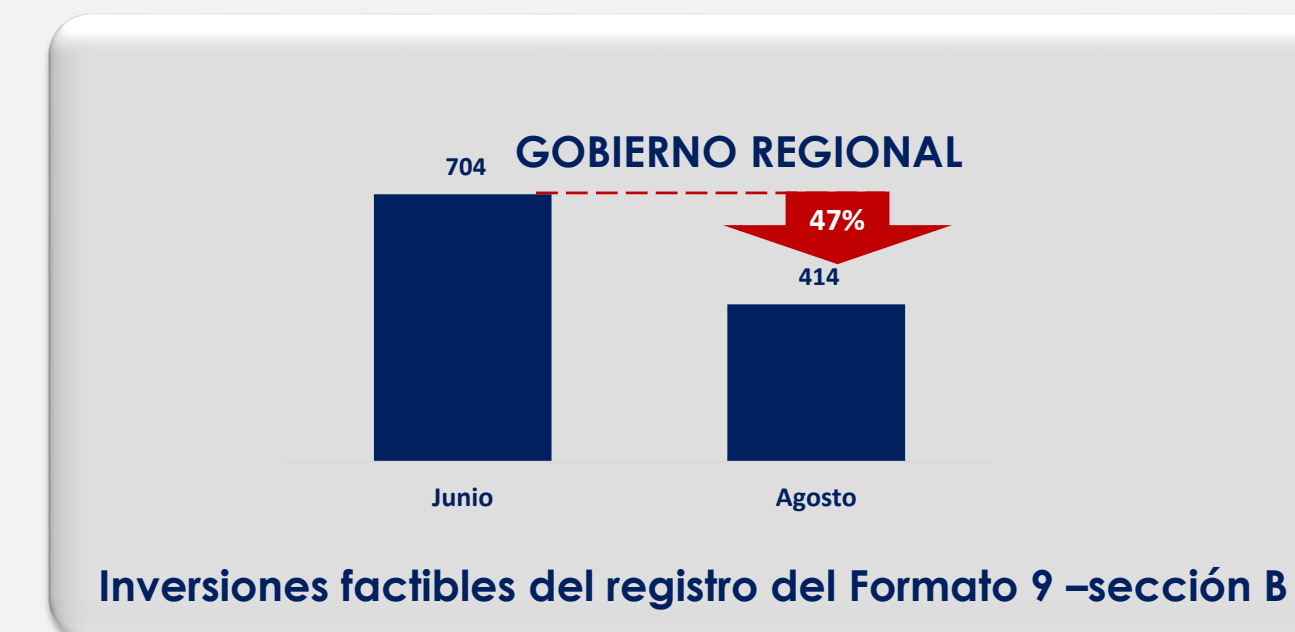
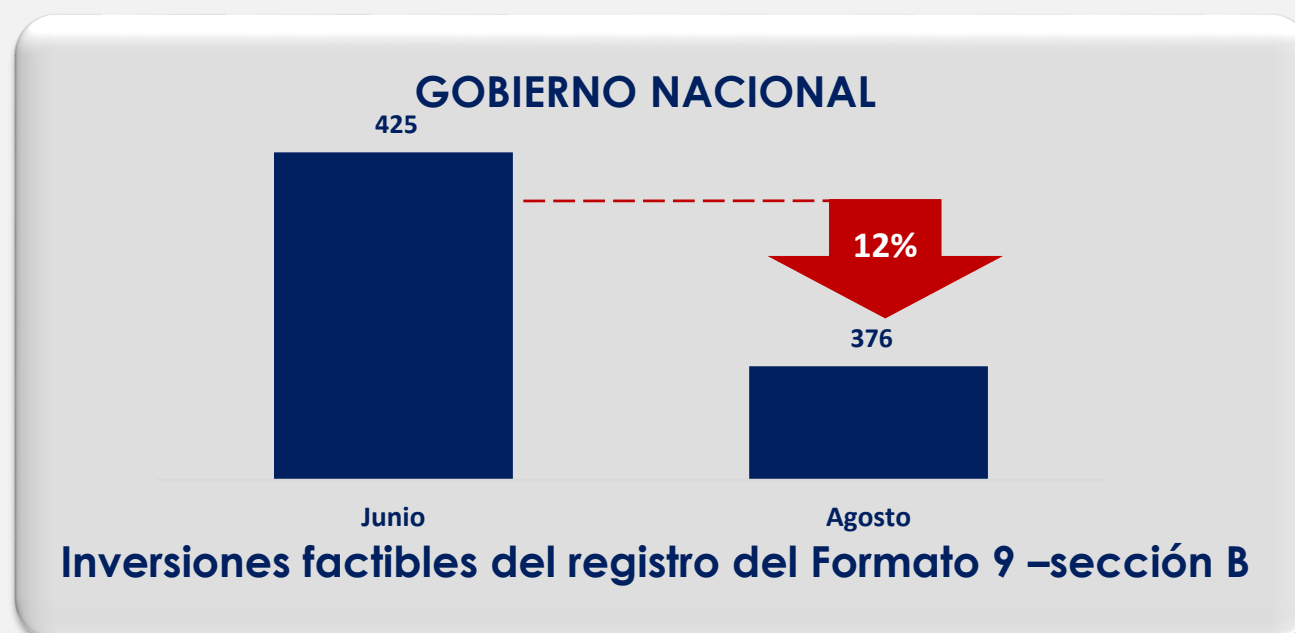


III. Reportes de seguimiento de inversiones

Indicadores de desempeño en la actualización del F12-B

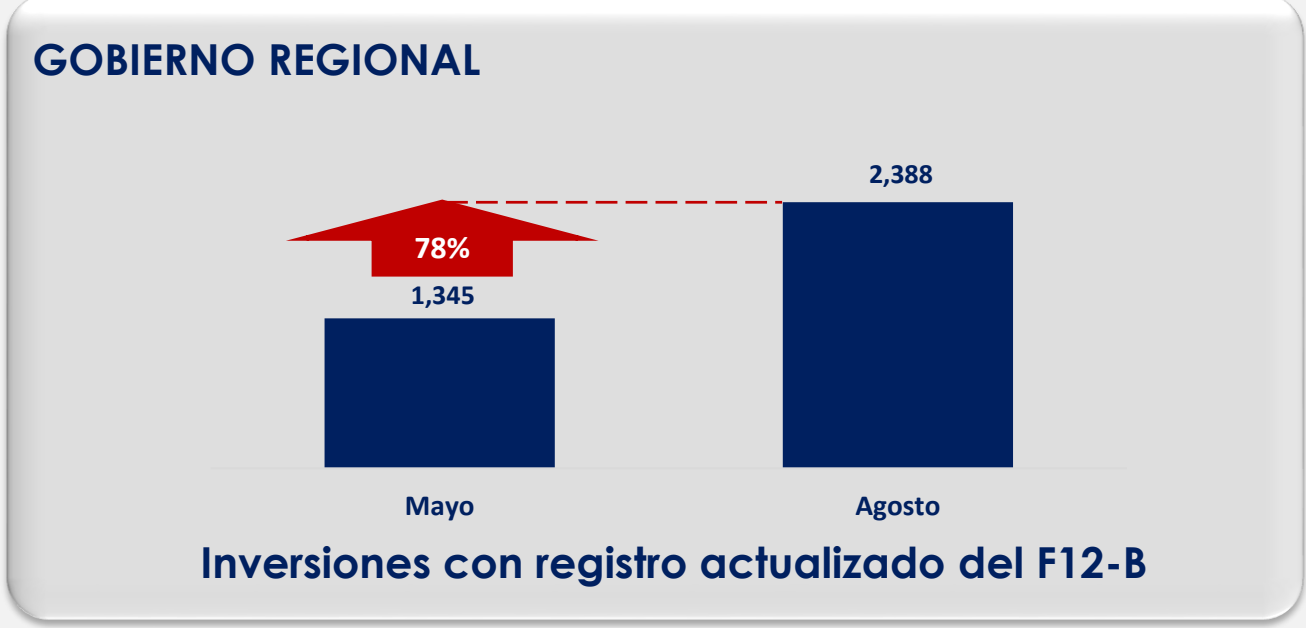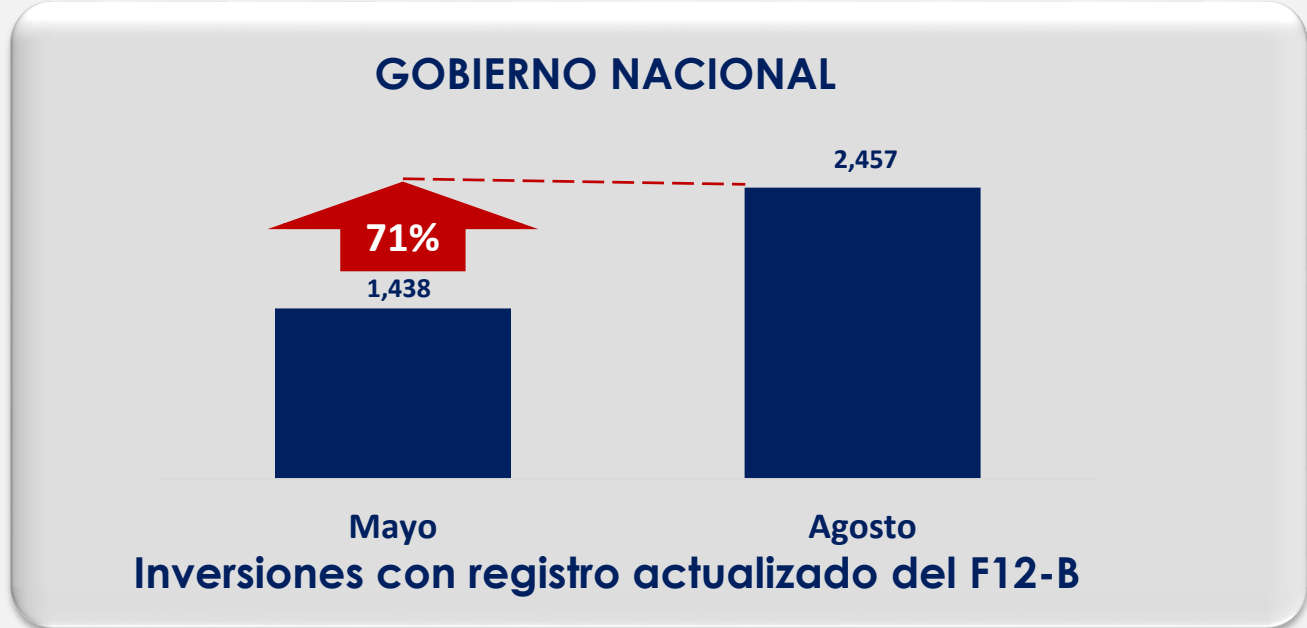

Indicadores de desempeño en el registro del avance físico en el F12-B

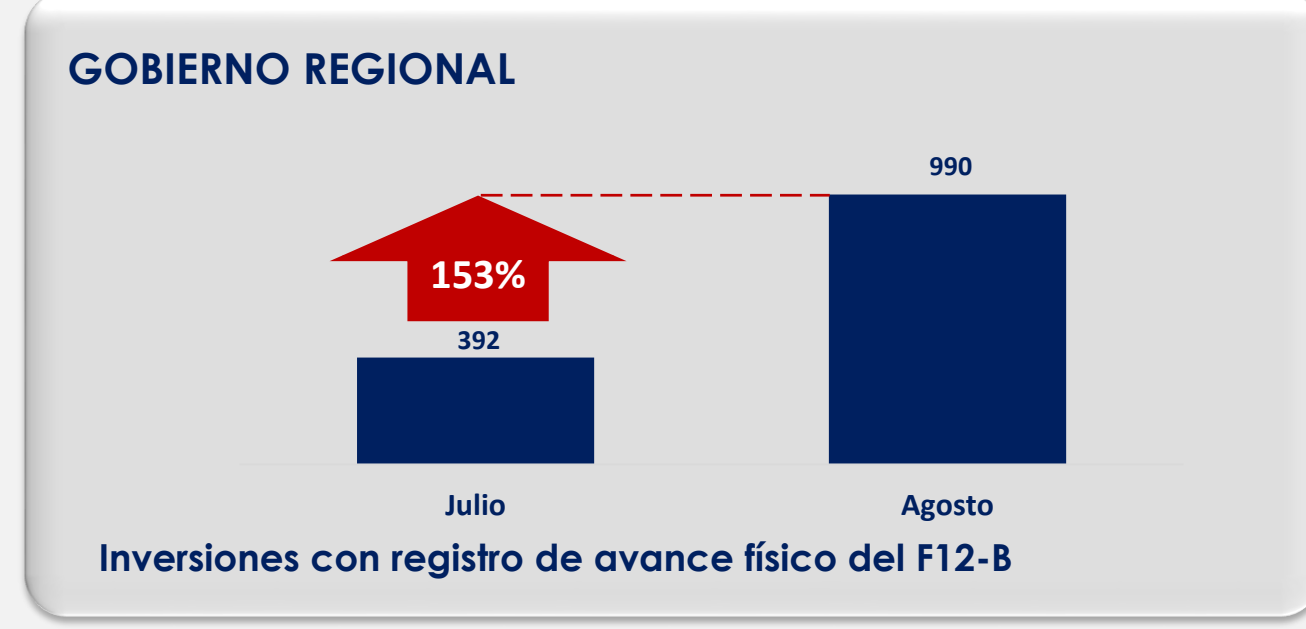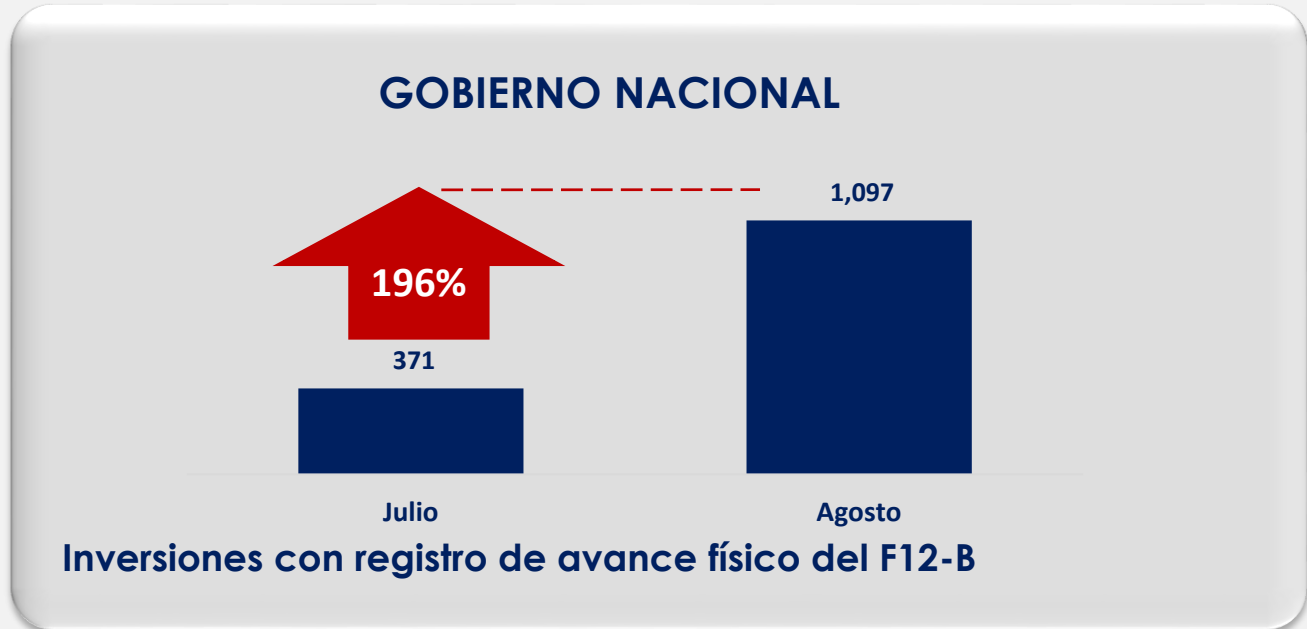

Principales cifras de seguimiento

- 🔍 **Acceso a 82,128 contratos** vinculados a inversiones.
- 🔍 **Vinculación de 48,800 inversiones** en el marco del invierte.pe.
- 🔍 **1,636 OPMI** que utilizan el reporte de inversiones como principal herramienta.
- 🔍 **1,765 nuevos registros de múltiples ET/DE** por parte de la UEI.



Instructivos y videos Tutoriales

En Inversión Pública, seleccionar **Aplicaciones Informáticas** y dar clic a la sección de **Instructivos**.

Acerca del Ministerio	Direcciones Generales	Normatividad	Inversión Pública	Transparencia Económica	TUPA
-----------------------	-----------------------	--------------	-------------------	-------------------------	------

Acerca de Invierte.pe
Directorio
Capacitaciones
Capacitaciones virtuales 2020
Normatividad
Anexos y Formatos
Ciclo de inversión
PMI
Metodologías
Aplicaciones Informáticas
FIDT
Estrategia BIM-Perú
Seguimiento
Preguntas frecuentes

Operadores de Invierte.pe

Banco de Inversiones


Instructivos


FIDT
Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial

PMI
Programación Multianual de Inversiones


Acceso público

SSI
Sistema de Seguimiento de Inversiones

Consulta de Inversiones


GEOInvierte


PNIC
Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad



Instructivos

- Instructivo IOARR de emergencia para peligro inminente
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2019-EF/63.01
- Instructivo para el registro de Inversiones de Rehabilitación y Reposición de Emergencia
DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01

TEMA	INSTRUCTIVO	VIDEO TUTORIAL
Registro de múltiples ET/DE NVL90		
Vinculación SEACE - Banco de Inversiones NVL90		
Avance de la inversión NVL90		
Personas acreditadas NVL90		
Consistencia de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones		
Registro del Formato N° 8-A - Registros en la Fase de Ejecución		
Registro del Formato N° 9 - Cierre de Inversión		
Protocolo de Retiro de Cierre		
Registro de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones		

Videos Tutoriales

- ☒ [Registro de múltiples ET/D](#)
- ☒ [Avance de la inversión](#)
- ☒ [Vinculación SEACE - Banco de Inversiones](#)
- ☒ [Módulo de inversiones para la OPMI](#)



¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos a nivel nacional y agenda tu reunión virtual.

CONECTA MEF

www.mef.gob.pe/conectamef

*Todas nuestras conferencias y capacitaciones
las encuentras en nuestra web, en el link:*

CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

<https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020>

en la sección de:



EVENTOS REALIZADOS



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe
