

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE INVERSIONES EN EL MARCO DE REACTIVACIÓN

Agosto 2020



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

 invierte.pe

CONTENIDO



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

1. Metas y presentación para descarga de base de datos.

2. Priorización de inversiones.

3. Buenas prácticas para Comité de Inversiones y herramientas.

1


Metas y presentación para descarga de base de datos

Registro de metas mensuales para maximizar la ejecución

Ejemplo: PIM 2020
de S/ 15 mm

Ejecución: S/ 15 mm
100% del PIM


Ejemplo: avance del devengado

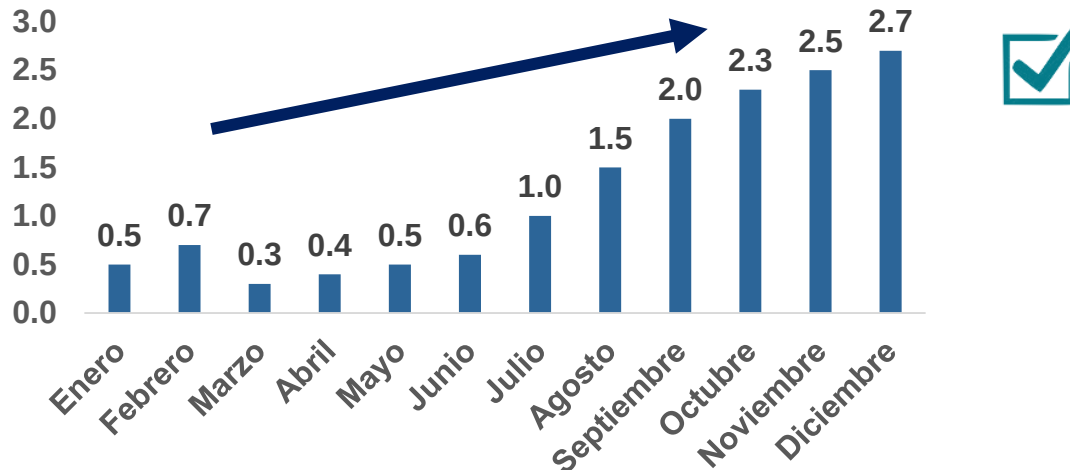

- Es importante definir metas para **planificar la gestión del presupuesto** orientado a un resultado y a la **oportuna culminación de inversiones**.
- Se verifican avances mensuales para una **oportuna solución de problemas**, así como para evaluar el desempeño.

Registro de metas mensuales

Se materializa a través de la proyección de los recursos de inversiones pendientes de ejecución en el año 2020 en función a su estado y avances.

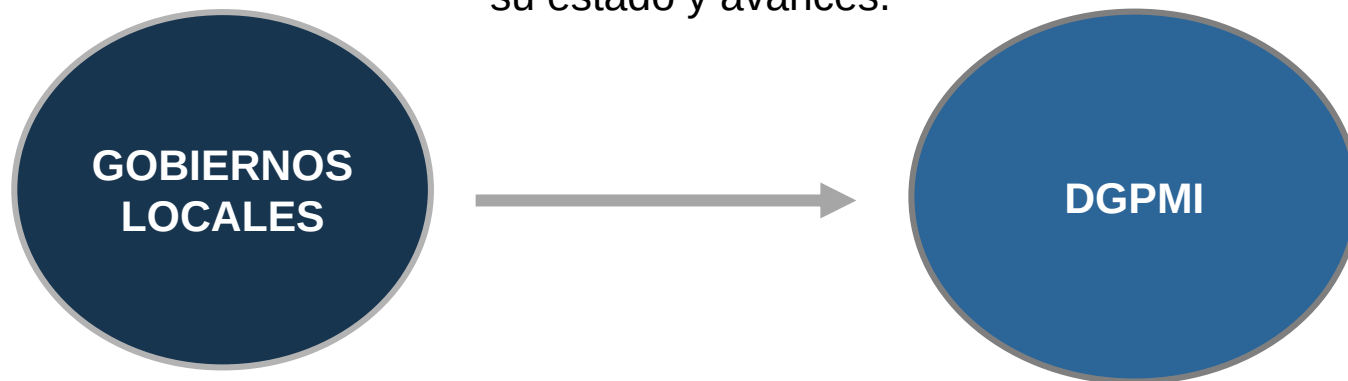

- Define y cumple las **metas mensuales de ejecución** de inversiones.
- Realiza con un **monitoreo efectivo** de los avances para la **toma de decisiones**.

- Reporta oportunamente las inconsistencias en el **registro de inversiones** para informar a las entidades.
- Brinda **asistencia técnica**.

Herramientas para la identificación de metas

2.1 Instrucciones: Video Tutorial sobre Reporte de Metas de Ejecución 2020.


Link: https://drive.google.com/file/d/1moO9pKmClwSY5armmCPm5cd_o-k64H13/view?usp=sharing

2.2 Insumo: Cartera detallada de Inversiones por Gobierno Local.

Link: t.ly/BUQn

Proceso de descarga de bases de datos:

1. Seleccionar Departamento, Provincia y Municipio.
2. Elegir el Botón **descargar** de la parte inferior derecha de la pantalla:



3. Elegir la Opción "Tabulación Cruzada".
4. Dar click en la opción "Hoja 1".
5. Dar click en la opción "Descargar".



Descarga de Datos

Selecciona Departamento: **AMAZONAS** | Selecciona Provincia: **SAGUA** | Selecciona Municipio: **(Todos)**

DESC_EJECUTORA	PRODUCT.	DESC_PRODUCTO_PROYECTO	DESC_FUENTE	MONTO_PM	MONTO_DEV.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	RECURSOS DETERMINADOS	1,088,038	104,000
	2309661	CREACION, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR VAL.	RECURSOS ORDINARIOS	103,235	0
	2376758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSMISIBILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM-S.	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	130,113	0
	2462939	REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL/LA CAMINO VECINAL PEÑA NEGRA, DIS.	RECURSOS DETERMINADOS	151,748	0
	2463197	REPARACION DE ALICANTILLA EN EL/LA CALLE PROGRESO CUADRA Nº 01 DEL	RECURSOS DETERMINADOS	1,800	0
	2470386	REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL/LA CALLES Y AVENIDAS DEL C.P EL MUJO.	RECURSOS DETERMINADOS	15,900	15,900
	2479237	CREACION DE LAS ESCALINATAS EN LA CALLE E CENTRO POBLADO EL MUJO - DISTRITO DE AR.	RECURSOS DETERMINADOS	99,248	0
	2483387	REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL/LA C	RECURSOS DETERMINADOS	17,360	17,360
	2484460	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCAL.	RECURSOS DETERMINADOS	290,738	1,230
	2484553	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZA I	RECURSOS DETERMINADOS	30,754	26,879
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN	2483387	REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL/LA C	RECURSOS DETERMINADOS	20,386	0
	2484460	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCAL.	RECURSOS DETERMINADOS	294,312	213,164
	2484553	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZA I	RECURSOS DETERMINADOS	3,300	3,300
	2488175	CREACION DEL PARQUE JUVENIL RUBIO LOZAN	RECURSOS DETERMINADOS	50,936	0
	2501621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	RECURSOS DETERMINADOS	120,128	0
	2430573	MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SI	RECURSOS DETERMINADOS	38,000	0
	2494718	CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CENTRI	RECURSOS DETERMINADOS	10,000	0
	2494723	CREACION DEL BAHEN Y MURO EN EL CAMINO	RECURSOS DETERMINADOS	1,000	0
	2501621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	RECURSOS DETERMINADOS	173,000	0
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO	2282982	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,000
2429984		CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE EL PARC.	RECURSOS ORDINARIOS	49,861	3,000
2500569		ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,979	0
2500569		ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL	RECURSOS ORDINARIOS	631,469	0
2500569		ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL	RECURSOS DETERMINADOS	247,589	0
2500569		ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL	RECURSOS DETERMINADOS	247,589	0
2500569		ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL	RECURSOS DETERMINADOS	247,589	0
2500569		ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL	RECURSOS DETERMINADOS	247,589	0
2500569		ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL	RECURSOS DETERMINADOS	247,589	0
2500569		ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL	RECURSOS DETERMINADOS	247,589	0

Fuente: SIAP Consulta Amigable Información actualizada a: 2020-08-19

tableau

 Ministerio
de Economía y Finanzas

Siguiente

invierte.pe

2

Priorización de inversiones en la Fase de Ejecución

¿Cómo priorizar las inversiones en la fase de ejecución?



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo-Priorizacion_de_Inversiones_Fase_de_Ejecucion.pdf

Cartera de inversiones según orden de prelación

- Para iniciar la priorización, la entidad deberá ordenar las inversiones según su estado en la Fase de Ejecución, priorizando aquellas que contribuyan con el **cierre de brechas** y la prestación **inmediata del servicio público a la población**.

Criterios para priorización

1

CIERRE DE BRECHA



- Inversiones que contribuyan al cierre de **brechas prioritarias** en el territorio de acuerdo a su diagnóstico.

2

CONTINUIDAD



- Inversiones que cuenten con **mayor avance** de ejecución física y financiera para asegurar la prestación oportuna del servicio.

3

EJECUTABILIDAD




- Proyección de la ejecución de las inversiones acorde con su **capacidad operativa y financiera**, no necesariamente según el cronograma inicial.
- Considerar los procedimientos y plazos establecidos en los sistemas administrativos.

¿Cuáles son los pasos para priorizar?

 La OPMI en coordinación con las UEI deberá seguir los siguientes pasos:



Ejemplo: Incremento del costo de las inversiones por el efecto del COVID-19

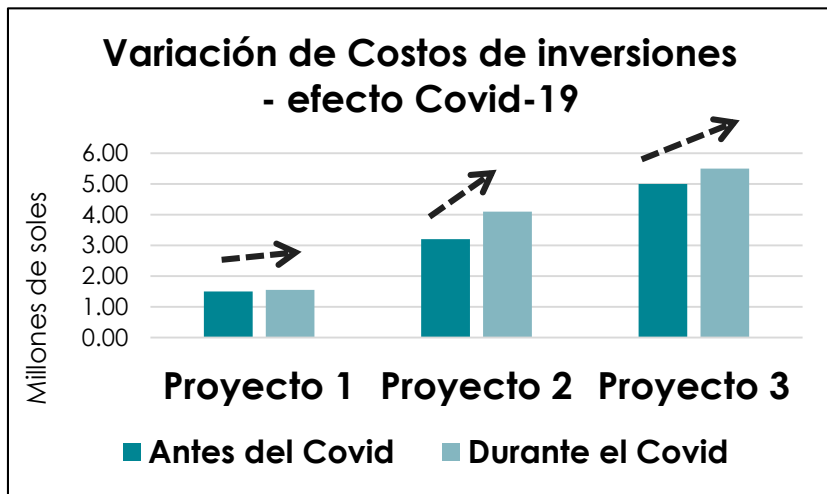


Variación de costos por:

Paralización de obras

Adecuación de los ambientes de trabajo

Ejecución de obras bajo medidas Covid-19

EJEMPLO: Cartera de 25 inversiones




NECESIDAD DE:

I. Ordenar.

II. Priorizar.

1. Cierre de brechas
2. Continuidad
3. Ejecutabilidad

Ejemplo: Cartera de 5 Inversiones

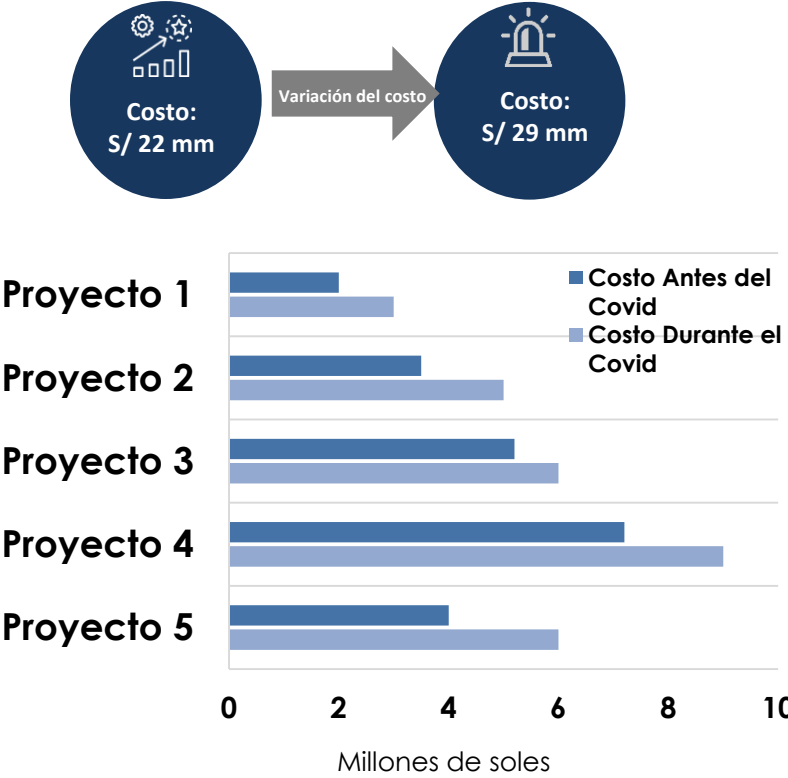

Ordenadas según prelación

Priorización de inversiones

Cartera de Inversiones	Criterios			Inversión Priorizada
	Cierre de Brechas	Continuidad	Ejecutabilidad	
Proyecto 1 (en ejecución)	✓	✓	✓	✓
Proyecto 2 (en ejecución)	✓	✓	✗	✗
Proyecto 3 (inicio de contrato)	✓	✓	✓	✓
Proyecto 4 (en convocatoria)	✓	✗	✓	✓
Proyecto 5 (en expediente técnico)	✗	✗	✗	✗



La entidad destina recursos a as inversiones priorizadas según la aplicación de orden de prelación y criterios de priorización, en el ejemplo, la entidad dependiendo de PIM disponible priorizará Proyecto 1,3 y 4.

Formato para realizar la priorización en fase de ejecución



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Orden de Prelación	Criterios de Priorización											
	1. Cierre de Brechas				2. Continuidad				3. Ejecutabilidad			

CÓD. ÚNICO	NOMBRE DE INVERSIÓN	1 Ordenar las inversiones según la prelación*	2 BRECHAS PRIORITARIAS		3 MAYOR CIERRE DE BRECHAS		4 MAYOR AVANCE	5 CONTRAT. EN CURSO	6 PARALIZACIÓN	7 ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES		8 VIGENCIA DE CONVENIOS	INVERSIÓN PRIORIZADA
			Brecha	¿Es prioritaria en mi territorio?	Contrib.	Unidad de medida	Porcentaje respecto al costo actualizado	¿Cuenta con contratos vigentes?	¿La obra está paralizada o tiene arbitraje?	Saldo pendiente de ejecución	¿Se podrá asignar los recursos suficientes?	Se requiere convenios para continuar ejecutando?	
2116xxx	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado	A	Salud 1	SI	1500	Viviendas	98%	SI	NO	S/. 20,000	SI	NO	SI
2087xxx	Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado	A	Salud 2	SI	1320	Viviendas	95%	SI	NO	S/. 5,000	SI	NO	SI
2102xxx	Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida xyz	A	Transporte 1	SI	325	Kilómetros	90%	NO	SI	----	----	----	NO
2163xxx	Creación del terminal terrestre abc	A	Transporte 2	NO	1	Terminal	----	----	----	----	----	----	NO
2143xxx	Mejoramiento del canal principal en el sector ab	A	Agricultura 1	SI	231	Hectáreas	92%	SI	NO	S/. 50,000	SI	NO	SI
2159xxx	Mejoramiento del servicio educativo xyz	B1	Educación 1	SI	1	Institución	55%	SI	NO	S/. 962,000	SI	NO	SI
2328xxx	Mejoramiento del servicio de agua para riego bocatomas	B1	Agricultura 2	SI	568	Hectáreas	52%	NO	SI	----	----	----	NO
2078xxx	Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado	B2	Saneamiento 1	SI	562	Viviendas	2%	SI	NO	S/. 9,875,420	NO	----	NO
2055xxx	Construcción de acceso vial hacia los atractivos turísticos	B2	Transporte 3	SI	281	Kilómetros	45%	SI	NO	S/. 98,500	SI	NO	SI
2317xxx	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de camino vecinal	B3	Transporte 3	SI	121	Kilómetros	55%	NO	NO	S/. 984,220	SI	NO	SI
2115xxx	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego	B3	Agricultura 2	SI	1254	Hectáreas	22%	SI	NO	S/. 985,632	SI	NO	SI
2148xxx	Mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola	C	Agricultura 1	SI	564	Hectáreas	8%	SI	NO	S/. 2,178,500	NO	----	NO
2407xxx	Mejoramiento de la capacidad productiva para la exportación de palta	E	Comercio 1	NO	----	----	----	----	----	----	----	----	NO
2416xxx	Creación del servicio de transitabilidad vehicular tramos	F	Transporte 3	SI	655	Kilómetros	0%	NO	NO	----	----	----	NO
2340xxx	Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular	G	Transporte 3	SI	212	Kilómetros	0%	NO	NO	----	----	----	NO
538xx	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital abc	H	Salud 1	SI	1	Establecimiento	0%	NO	NO	----	----	----	NO

Cartera de inversiones


*De acuerdo al Art. 15.2 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01 y según la codificación establecida en la cartera de inversiones.

3

Buenas prácticas para Comité de Inversiones y herramientas

Comité de Inversiones

Definición:



Espacio de coordinación entre los actores directamente involucrados en la ejecución de las inversiones de la ***Cartera Priorizada de Inversiones***.

Finalidad:




Mejorar los mecanismos e instancias de coordinación entre los actores directamente involucrados en la ***toma de decisiones*** y la ***ejecución de inversiones***.

Objetivos del Comité de Inversiones



Mejorar el proceso de seguimiento de las inversiones de la Cartera, ejecutadas por las diferentes UEI del sector y la gestión de las inversiones priorizadas.



Conocer la problemática y los riesgos asociados a la ejecución y gestión de las inversiones.



Establecer acuerdos y compromisos que garanticen una ejecución eficiente y continua.



Revisar el avance y estado de la Cartera de manera conjunta con los responsables de los órganos involucrados.

Buenas prácticas para un Comité de Inversiones efectivo

- ✓ **Definir una cartera de inversiones priorizadas y metas** a través de las proyecciones para medir avances.
- ✓ Utilizar herramientas que ayuden a **gestionar, organizar, dirigir, planificar, monitorear** las inversiones en Fase de Ejecución.
- ✓ **Involucrar y articular** con las áreas claves en la gestión de las inversiones (presupuesto, logística, planificación y unidades ejecutoras).
- ✓ **Identificar** riesgos en la ejecución de las inversiones y **plantear** diversas alternativas de solución.
- ✓ **Participación del personal que toma decisiones** durante las sesiones de comités.

Conformación del Comité de Inversiones



Órgano Resolutivo
-Gobernadores y Alcaldes-



OPMI

UEI

Abastecimiento

Presupuesto

Otras unidades
orgánicas



ACUERDOS Y COMPROMISOS



Herramientas para el Comité de Inversiones y toma de decisiones

1. Formato 12-B.
2. Registros para el Comité: cartera priorizada y acuerdos.
3. Tablero General de Seguimiento.
4. Tablero de Seguimiento del Inversiones del Anexo I (Transferencias del Gobierno Nacional).

Formato de Seguimiento de Inversiones (Formato N° 12-B)

Definición:



Es una herramienta de gestión que permite el **seguimiento a las inversiones**, en base a la información proporcionada por la UEI y los sistemas administrativos vinculados la toma de decisiones.

Finalidad:



Insumo a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) para la realización de su **función** de seguimiento del **avance de la ejecución de las inversiones**.

Utilidad del Formato N°12-B

- ☑ **Identificación de riesgos** durante la ejecución de la inversión para la adecuada toma de decisiones y el logro de metas establecidas en la inversión.

- ☑ Identificación a través de los **reportes de las inversiones** no culminadas en la Fase de Ejecución, promoviendo su continuidad por su contribución al cierre de brechas.

- ☑ **Transparencia y oportunidad** en la información sobre la ejecución de inversiones para el mejor desempeño en la gestión de las inversiones.

- ☑ **Trazabilidad del seguimiento** de inversiones mediante la interoperatividad de sistemas administrativos lo que permite facilitar el seguimiento de la Fase de Ejecución de las inversiones.

Código único de inversiones	2151258			Fecha de última modificación	14/08/2020 04:46:41 p.m.		
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA						
Costo actualizado	S/17,185,185.42		PIM 2020	S/1,860,359.00			
Dev. acumulado	S/16,310,648.76		Dev. 2020	S/1,056,774.51			
PMI AÑO 1 <2020>	S/3,000,000.00		PMI AÑO 2 <2021>	S/0.00		PMI AÑO 3 <2022>	S/0.00
UEI	28358-UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT			Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA		

I EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

II EJECUCIÓN FÍSICA

Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Según ET/DE		Según Contrato/Convenio		Según Valorización				
	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Docto.	Foto	
adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios									
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-01	S/425,690.31	2019-01	S/637,516.27	2019-01	S/1,010,144.35			
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-02	S/1,094,239.89	2019-02	S/1,186,203.93	2019-02	S/1,485,054.73			
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-03	S/1,730,267.76	2019-03	S/1,892,703.10	2019-03	S/2,221,876.63			
Adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios / obra de infraestructura	2019-04	S/2,686,477.31	2019-04	S/2,839,540.39	2019-04	S/3,112,051.83			

III EJECUCIÓN FINANCIERA

Programación financiera		Programación financiera actualizada		Avance financiero real	
Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto
2020-01	S/140,000.00	2020-01	S/338,033.00	2020-01	S/338,032.50
2020-02	S/400,000.00	2020-02	S/ 00	2020-02	S/472,721.59
2020-03	S/600,000.00	2020-03	S/491,445.00	2020-03	S/18,722.99

IV ESTADO SITUACIONAL

Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Estado Situacional		Avance	Problemas		
	Periodo	Situación		Tipo de Problema	Explicación	Acciones a tomar
adecuada infraestructura (construccion en terreno propio o cedido en uso) para prestar los servicios						
Adecuada infraestructura (construccion en	2019-01	Avance Físico 6.74% Se Ha Ejecutado Trabajos Referidos A	6.74 %			
Adecuada infraestructura (construccion en	2019-02	Avance Físico 9%, Se Ha Realizado Trabajos Habilitación	9.91 %			
Adecuada infraestructura (construccion en	2019-03	A Marzo, La Obra Tiene Una Ejecución Acumulada De	14,82			

V CONTRATACIONES

Vista resumen del Formato 12-B

REPORTE: FASE DE EJECUCIÓN

Fecha Últ. Modificación: 14/08/2020

Código Único:	2151258	Tipo de Inversión:	PROYECTO DE INVERSION
Nombre de la Inversión:	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA	Modalidad de Ejecución:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
UEI:	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	% Avance de la Ejecución de la Inversión	96.13 %
		% Avance Físico de la Inversión	97.88 %



Situación:

[14/08/2020] Durante el mes de julio, se aprobó parcialmente la Ampliación Excepcional del Plazo (AEP) de ejecución del contrato de obra por 121 días calendario, solicitada por el Contratista, de acuerdo con lo previsto en el D.L. N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD.

Ejecución Financiera

Costo Total Actualizado	S/ 17,185,185
Devengado Acumulado	S/ 16,310,649
% Avance Acumulado	94.9 %



PIM 2020	S/ 1,860,359
Devengado 2020	S/ 1,056,775
% Avance 2020	56.8 %



Programación Agosto	S/ 0
Devengado Mensual	S/ 0
% Avance Mensual (*)	0 %


Mes	Program.	Actualiz.	Real
Ene	140,000	338,033	338,033
Feb	400,000	0	472,722
Mar	600,000	491,445	18,723
Abr	700,000	0	0
May	610,000	0	0
Jun	0	227,297	227,297
Jul	0	0	0
Ago	0	0	0
Set	0	0	0
Oct	0	0	0
Nov	0	0	0
Dic	550,000	0	0
Total	3,000,000	1,056,775	1,056,775

Inicio de Ejecución Física	20/11/2018
Culminación de Ejecución Física	30/11/2020

Programación Financiera Acumulada 2020 (S/ MM)



Estructura del costo de la Inversión (S/ MM)



Exp. Tec. / Doc. Eq.

Ejecución Física

Contrataciones

Ver Formato N° 8

Ver Formato N° 12-B

Ver SSI

Mejoras en el Seguimiento de la Inversión Pública Vinculación SEACE y Banco de Inversiones



Ministerio
de Economía y Finanzas

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/seguimiento/vinculacionseace.mp4

REPORTE DE LA VINCULACIÓN DE SEACE Y BANCO DE INVERSIONES



CONTRATACIONES: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Código Único: 2015918
Nombre de la Inversión: INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ

Tipo de Inversión: PIP MAYOR (SNIP)
Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Continuidad en el procedimiento Con modificación en el cronograma Sin continuidad en el procedimiento

CONSULTORIAS DE OBRA : 4

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Ítem	Número de Ítem	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	-------------------------	-------------

OBRAS : 3

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Ítem	Número de Ítem	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	-------------------------	-------------

BIENES : 5

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Ítem	Número de Ítem	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	-------------------------	-------------


SERVICIOS : 3

Tipo de Proceso	Nomenclatura	Descripción de Proceso	Descripción de Ítem	Número de Ítem	Fecha de Convocatoria	Estado	Valor Referencial (S/.)	Ver Detalle
-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--------	-------------------------	-------------

Mejoras en el Seguimiento de la Inversión Pública

Registro de Múltiples ET/DE

REPORTE DEL REGISTRO DE MÚLTIPLES ET/DE

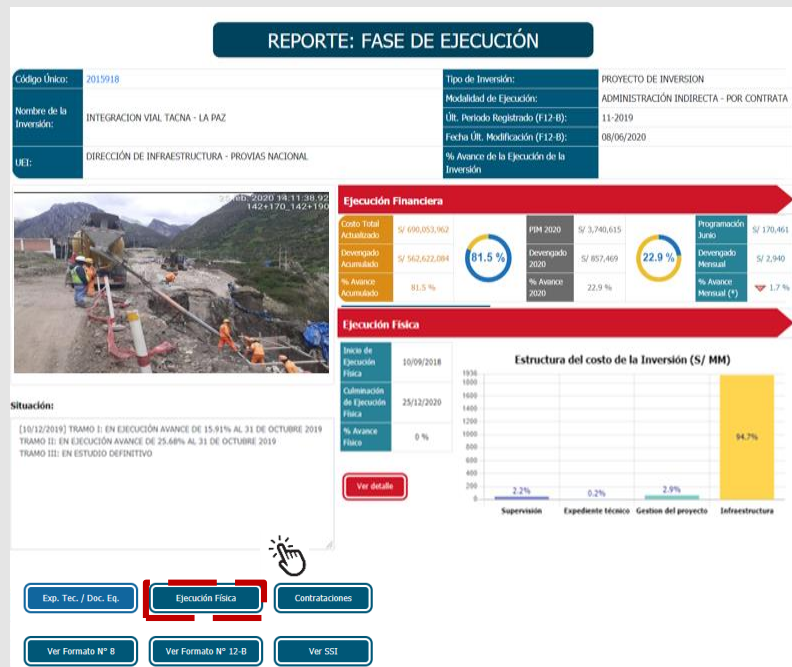

EXPEDIENTE TÉCNICO / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código Único: 2151258 Tipo de Inversión: PIP MAYOR (SNP)
Nombre de la Inversión: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

EXPEDIENTE TÉCNICO : 1

Descripción	Fecha de Registro	Modalidad de Ejecución	Ver Detalle
EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	07/10/2019	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	

EXPEDIENTE TÉCNICO POR AI

ETAPA	HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA ACTUALIZADA	FECHA FINAL
Elaboración de ET	Inicio	27/03/2014	27/03/2014	27/03/2014
Elaboración de ET	Culminación	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016
Elaboración de ET	Aprobación	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018

ESTADO SITUACIONAL DEL ET/DE

PERIODO	COMENTARIO
10/2019	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO Y APROBADO

2.

Registro de cartera de inversiones y actas



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Con usuario
y contraseña
OPMI



MÓDULO DE
COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

Antes del comité

A

Cartera de Inversiones

Registro de la Cartera de inversiones prioritizadas

- ✓ Código único de inversiones.
- ✓ Unidad Ejecutora de Inversiones.
- ✓ Estado .
- ✓ Problemática.

REGISTRO
SATISFACTORIO



CARTERA DE INVERSIONES
PRIORIZADAS

A

Convocatoria a los miembros de Comité de Seguimiento.

Durante el comité

B

Presentación de la situación actual de las inversiones de la Cartera Priorizada de Inversiones

- ✓ Número y fecha de Acta.
- ✓ Tipo de reunión.
- ✓ Registro de participantes.
- ✓ Agenda.
- ✓ Acuerdos de CIP.
- ✓ Fecha del Próximo Comité.

REGISTRO
SATISFACTORIO



ACTA DE COMITÉ DE
SEGUIMIENTO DE LAS
INVERSIONES

B

Actas de Comité

Registro de los acuerdos del Comité de Inversiones

Después del comité

C

Seguimiento a los acuerdos planteados en las actas de comité.



Registro de la Cartera Priorizada de Inversiones

<https://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login>

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:59:46

Bienvenido, OPMICOMEXT

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Ingresar con usuario y contraseña de OPMI

Banco de Inversiones » Inicio

Total de Proyectos

Proyectos Programables

Proyectos No Programables

Proyectos Pendientes

Evolución del Alineamiento de Proyectos Viables orientado al Cierre de Brechas (Alineado a funciones básicas complementarias: Educación, Salud, Saneamiento, Seguridad ciudadana)

Comite de Seguimiento

Cartera Priorizada de Inversiones

Registro de Actas

Hacer clic en “Cartera Priorizada de Inversiones”

Registro de la Cartera Priorizada de Inversiones

Otros

Reportes

Comité de Seguimiento

Cartera Priorizada de Inversiones

Registro de Actas

Registro de Cartera Priorizada de Inversiones

Código único

2151258

Nombre de la inversión

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA

Piiego

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR

Unidad Ejecutora de Inversiones

PLAN COPESCO NACIONAL - MANCOMUNIDAD - 2019COPESCO - LUIS ENRIQUE BE

Tipo de Inversión

PROYECTO

Costo Actualizado de la inversión (\$/)

20,660,520.55

Inicio de Ejecución Física

20/09/2010

Fin de Ejecución Física

15/05/2013

Avance Financiero de la Inversión (\$/)

19,380,977.58

Avance Financiero de la Inversión (%)

93.81

Avance Físico de la Inversión (%)

92

Avance de la Ejecución de la Inversión (%)

0.00

Estado

Inversión en ejecución

Problemática / Riesgos / Oportunidades

POR FACTORES EXTERNOS LA INVERSIÓN PRESENTO UNA PARALIZACIÓN , SE ESTA REALIZANDO LAS COORDINACIONES.

Guardar Cambios

Volver

3

B Registro de Actas de Comités de Inversiones



Ministerio
de Economía y Finanzas

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante: 01:59:32

Bienvenido, OPMICOMEXT

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario: OPMICOMEXT Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR

Comité de Seguimiento de Inversiones - CSI » Lista de Actas de Acuerdos

Consulta de Actas de Acuerdos

Criterios de búsqueda

Fecha de registro del Acta Desde dd/mm/aaaa Hasta dd/mm/aaaa Año 2020

Buscar Borrar filtros

Nueva Acta

Lista de Actas de Acuerdos

Mostrar 10 registros

N° de Acta	Título	Tipo de reunión	Fecha de registro del Acta	Fecha de aprobación del Acta	Estado
Ingrese el criterio de búsqueda					
123	sdfsdf	Ordinaria	13/07/2020 09:32:07 a. m.	13/07/2020	REGISTRADO
12	SESION n° 01	Ordinaria	13/03/2020 03:04:40 p. m.	13/03/2020	REGISTRADO

ofi7.mef.gob.pe/invierte/Home/Index#/consultaActa

B Registro de Actas de Comités de Inversiones

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

2

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR
Nro: 02 - Fecha de aprobación: 17/08/2020

 Exportar PDF

TÍTULO DEL ACTA

ACTA DE ACUERDOS N°02

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JUAN ALONSO BERMUDEZ BUENDIA	DNI: 11289965	MINCETUR		juvelanm@gmail.com	

II. AGENDA

REVISION DE LA CARTERA PRIORIZADA CON LAS UEI

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2438679	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: PARALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	REVISION POR PARTE DEL AREA LEGAL	INFORME TÉCNICO	JUAN ALONSO BERMUDEZ BUENDIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	01/09/2020

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2324256	OPORTUNIDAD: DEMORAS EN LA REVISION DEL ENTREGABLE N°03	LA UEI CUMPLIRÁ CON EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA REVISIÓN DEL ENTREGABLE	ENTREGABLE N°03	JUAN ALONSO BERMUDEZ BUENDIA	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	31/08/2020

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

17/09/2020

DOCUMENTOS ADJUNTOS

 ACTA FIRMADA

3.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Tablero GENERAL de seguimiento de ejecución y registros en el Banco de Inversiones

1. Gobierno Nacional

t.ly/Jkwp

2. Gobiernos Regionales

t.ly/2xnh

3. Gobiernos Locales

t.ly/9piT



4.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Tablero del ANEXO I para el seguimiento de ejecución y registros en el Banco de Inversiones


Link:

t.ly/vyvB



Proceso de descarga de bases de datos:

1. Ingresar al link.
2. Click en el botón **"VER MÁS DETALLE"**.
3. Filtrar el sector a revisar.
4. Elegir el Botón **descargar** de la parte inferior derecha de la pantalla.
5. Elegir la Opción **"Tabulación Cruzada"**.
6. Dar click en la opción **"Hoja 4"** y **"Descargar"**.



invierte.pe

¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/cap-acitaciones-virtuales-2020>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos a nivel nacional y agenda tu reunión virtual.

CONECTA MEF

www.mef.gob.pe/conectamef
