



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

 **invierte.pe**



Gobierno del Perú



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

**Webinar**

# **Formato de Seguimiento de Inversiones (Formato N° 12-B)**

Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública  
**Dirección General de Programación Multianual de Inversiones**  
Ministerio de Economía y Finanzas



# Objetivo

---

Facilitar el seguimiento, trazabilidad y la transparencia de la información en la ejecución de inversiones



# Contenidos

---

1. Registro de la Ejecución Financiera
2. Registro de la sección Información de la Inversión
3. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente
4. Registro de Ejecución física

# SECCIONES DEL FORMATO N° 12 -B

## Sección ET / DE

## Sección Ejecución Física - Hitos

### Inversión

- Viable
- Aprobado
- Incorporado en el PMI



Inicia el Registro del F12B, con la programación financiera.

<b>A</b> Descripción del ET/DE	<b>B</b> Programación de fechas de hitos	<b>A</b> Información general del seguimiento	<b>B</b> Cronograma	<b>C</b> Información del avance físico	<b>D</b> Información de modificaciones en ejecución física
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de documento</li><li>• Modalidad</li><li>• Etapas e hitos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programación Inicial</li><li>• Programación actualizada</li><li>• Vinculación con el SEACE</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Etapas e hitos</li><li>• Programación</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cronograma inicial</li><li>• Cronograma modificado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valorizaciones</li><li>• Riesgos</li><li>• Problemática</li><li>• Acciones a seguir</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adicional/Reducción</li><li>• Ampliación de Plazo</li><li>• Mayores Gastos Generales</li><li>• Mayores Metrados</li></ul>

## Sección Ejecución Financiera

- Programada
- Actualizada

## Sección Información de la inversión

- Avance y situación de la inversión
- Estimación de la inversión

Nota: B, C y D de la sección ejecución física no corresponde para bienes y servicios.



1

## **Registro de la Ejecución Financiera**

---

# I. Registro de la Ejecución Financiera

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:58:51

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI > Entidad : UEI

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

2438679 - CREACION DEL BIEN PUBLICO DE SOCOS DEL DISTRITO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Información de la inversión Expediente técnico **Ejecución Financiera** BIM Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

## IMPORTANTE:

El registro de la ejecución financiera es requisito previo para el ingreso de información del avance físico.

# I. Registro de la Ejecución Financiera

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2023 PIM: S/412,160,276.00

Ejecutora presupuestal: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Programación Financiera (mensual) Programación Financiera (anual)

Programación Financiera	
Periodo	Monto (Soles)
<b>TOTAL:</b>	<b>S/ 412,160,276.00</b>

Programación Financiera Actualizada	
Periodo	Monto (Soles)
<b>TOTAL:</b>	<b>S/ 412,160,276.00</b>

## Programación financiera :

- Luego de que el usuario haya ingresado al aplicativo, deberá seleccionar el año de ejecución (2023).
- En caso la entidad cuente con mas de una Unidad Ejecutora Presupuestal, deberá seccionar una de ellas para iniciar el registro del avance financiero.

# I. Registro de la Ejecución Financiera

## Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año:

2023

PIM: S/1,854,795.00

Ejecutora presupuestal:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES

Programación Financiera (mensual)

Programación Financiera (anual)

### Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2023-01	730000
2023-02	550728
2023-03	522400
2023-04	51667
2023-05	0
2023-06	0
2023-07	0
2023-08	0
2023-09	0
2023-10	0
2023-11	0
2023-12	0
<b>TOTAL:</b>	<b>S/1,854,795.00</b>

Guardar

### Programación Financiera Actualizada

Periodo	Monto (Soles)
2023-01	
2023-02	
2023-03	
2023-04	
2023-05	
2023-06	
2023-07	
2023-08	
2023-09	
2023-10	
2023-11	
2023-12	
<b>TOTAL:</b>	<b>S/1,854,795.00</b>

Guardar

- a) Programación financiera (soles): Programar PIA/PIM asignado a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.), es decir como se estima gastar el presupuesto asignado en el año. Se registra por única vez.

Guarda la información registrada

Guardar

### ⚠ Información del sistema

Requisitos mínimos:

El monto total del avance financiero programado no debe superar el PIM.



# I. Registro de la Ejecución Financiera

## Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año:

2023

PIM: S/1,854,795.00

Ejecutora presupuestal:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES

### Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2023-01	730000
2023-02	550728
2023-03	522400
2023-04	51667
2023-05	0
2023-06	0
2023-07	0
2023-08	0
2023-09	0
2023-10	0
2023-11	0
2023-12	0
<b>TOTAL:</b>	<b>S/1,854,795.00</b>

### Programación Financiera Actualizada

Periodo	Monto (Soles)
2023-01	0
2023-02	678852
2023-03	450728
2023-04	519400
2023-05	189667
2023-06	16148
2023-07	315150.77
2023-08	0
2023-09	0
2023-10	0
2023-11	0
2023-12	0
<b>TOTAL:</b>	<b>S/2,169,945.77</b>

Guardar

b) **Programación financiera ACTUALIZADA (soles):** Se registran las reprogramaciones financieras a nivel de devengados mensuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.) cada vez que se requiera.

¿Qué puedo actualizar?

- Reprogramación de saldos por ejecutar.
- La programación de presupuesto incorporado.
- La programación del nuevo PIM, después de efectuado un recorte presupuestal.



**IMPORTANTE:**  
Se puede reprogramar montos mayores al PIM

Guarda la información registrada

Guardar

# I. Registro de la Ejecución Financiera

- c) Programación financiera anual (soles): Programar el saldo de la inversión a nivel de devengados anuales de toda la inversión (valorizaciones de obra, gastos de supervisión, gestión del proyecto, etc.), posterior al registro de la programación financiera mensual (soles).

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2022 PIM: 5/8,836,297.00

Ejecutora presupuestal: REGION HUANUCO-TRANSPORTES

Programación Financiera (mensual) **Programación Financiera (anual)**

Costo Actualizado	Devengado acumulado (al año anterior)	PIM	Saldo
79,748,213.12	12,242,207.98	8,836,297.00	58,669,708.14

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2023	19400000
2024	39,669,708.14
<b>TOTAL:</b>	<b>58,669,708.14</b>

Guardar

Guarda la información registrada



La visualización de los años de la programación financiera (anual), se encuentra vinculados a los plazos de la programación de ejecución de la inversión registrados en el Formato N° 8 , sección B o C, según corresponda.

# I. Registro de la Ejecución Financiera

## c) Programación financiera anual

### Consideraciones para el registro de la Programación Financiera en el Formato N°12B y su vinculación con el Módulo de Programación Multianual de Inversiones

Toda modificación en la programación financiera mensual del año fiscal (2023) requiere obligatoriamente la actualización de la programación financiera anual\* según las siguientes consideraciones:

- ✓ El Monto para la programación anual se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Saldo para la Programación Anual} = \text{Costo Actualizado de la Inversión} - ( \text{Devengado acumulado al año anterior} + \text{Programación financiera mensual del año fiscal (2023)} )$$

- ✓ Para las inversiones que culminen\*\* en los años 2024, 2025 y 2026, el registro de la programación anual debe ser mayor a cero en estos periodos o hasta completar el saldo programable en el año que corresponda su finalización, dicha información se visualizará en el Módulo de la Programación Multianual de Inversiones.

\*Programación de los años posteriores al año fiscal actual (Formato N°12-B).

\*\*Programación anual de ejecución de inversiones registrada en Formato N°8, sección B o C, según corresponda.

# Consideraciones para el registro de la Programación Financiera en el Formato N°12B y su vinculación con el Módulo de Programación Multianual de Inversiones

## PASO 1:

Registro de la Programación Financiera (mensual) / Programación Financiera Actualizada (mensual)

Registro del avance financiero

Información financiera de la inversión

Seleccione año y ejecutora presupuestal

Año: 2023 PIM: S/412,160,276.00

E: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Programación Financiera (mensual) Programación Financiera (anual)

Programación Financiera		Programación Financiera Actualizada	
Periodo	Monto (Soles)	Periodo	Monto (Soles)
TOTAL:	S/ 412,160,276.00	TOTAL:	S/ 412,160,276.00

✓ El total de la última programación mensual registrada en esta sección será considerada para el cálculo del saldo a programar en los periodos anuales.

✓ La actualización de la Programación financiera mensual y anual deben coincidir en la fecha de registro.

### Notas

✓ Se deberá completar la programación financiera anual hasta el periodo de culminación que se ha reportado en el Formato N° 08 sección B o C, según corresponda.

## PASO 2:

Registro del saldo en la Programación Financiera Anual

Programación Financiera (mensual) Programación Financiera (anual) 2

Fecha de actualización: 06/02/2023

Costo Actualizado	Devengado acumulado (al año anterior)	Programación Financiera 2023	Saldo
17,214,635,713.09	6,776,619,684.67	412,160,276.00	10,025,855,752.42

Programación Financiera

Periodo	Monto (Soles)
2024	893,192,687.00
2025	795,158,938.00
2026	790,855,026.00
2027	2,263,994,730.43
2028	3,018,659,640.57
2029	1,509,329,820.28
2030	754,664,910.14
TOTAL:	S/.10,025,855,752.42

Guardar

Información vinculada con el MPMI




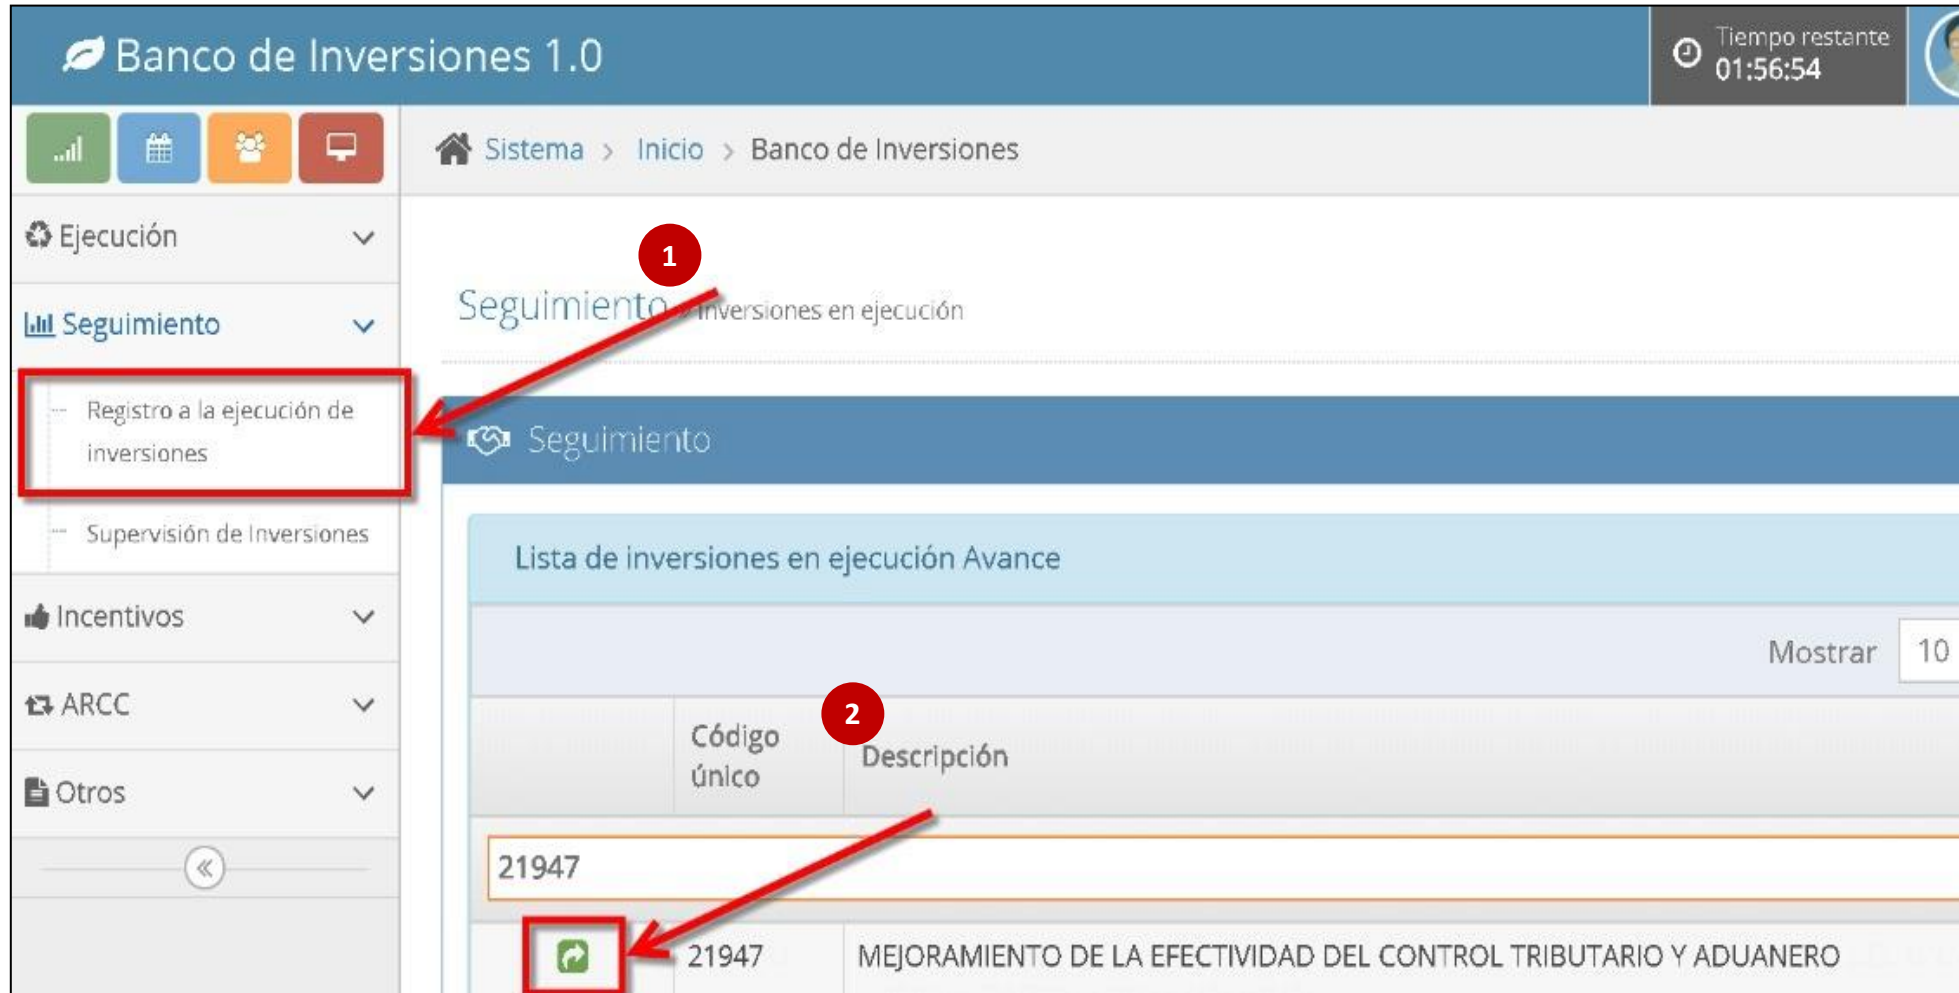
## **Registro de la sección Información de la Inversión**

---

# II. Registro de la sección Información de la Inversión

## ACCESO

- 1 Ingresar al Banco de Inversiones
- 2 Buscar el código único de la inversión y hacer clic en el icono 



Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:56:54

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Seguimiento de inversiones en ejecución

Registro a la ejecución de inversiones

Supervisión de Inversiones

Incentivos

ARCC

Otros

Lista de inversiones en ejecución Avance

Mostrar 10

Código único	Descripción
21947	
21947	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO

# II. Registro de la sección Información de la Inversión

## ACCESO

3 Seleccionar “Información de la inversión”

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:58:51

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI > Entidad : UEI

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

2438679 - CREACION DEL BIEN PUBLICO DE SOCOS DEL DISTRITO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

3

Información de la inversión

Expediente técnico

Ejecución Financiera

BIM

Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

## II. Registro de la sección Información de la Inversión

- 4 En la pestaña “Avance y situación” se muestra:
- A El avance de la ejecución de la inversión que se calcula automáticamente con la información registrada en la pestaña “Estimación”.
  - B En situación se registra la información actualizada de la inversión.

Información durante la etapa de ejecución

Código único	2479752
Nombre de inversión	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE YARARAHUE DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Avance y Situación    Estimación

Avance de la ejecución de la inversión (%) **A**    60.28

Situación **B**

EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN. A LA FECHA SE HA PRESENTADO LA 3ERA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.  
AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO DE 59.85%  
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/1,485,894.98.

LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO.

2000 Caracteres restantes



Si la inversión no registra Formato N° 08, la UEI en el campo **B** -“Situación” deberá describir las acciones realizadas e indicar el avance alcanzado de la elaboración del Expediente Técnico y/o Documentos Equivalentes.



## II. Registro de la sección Información de la Inversión

5 Seleccionar la pestaña “Estimación”

6 Hacer clic en “Iniciar el cálculo”

### Información de la Inversión

Información durante la etapa de ejecución

Código único: 2574029  
Nombre de inversión: RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO TUPAC AMARU, LOS ALPES, HURANGUILLO, ALTO PERU, PACAY, ALTAMIZA, TABLONES, FAIQUE HASTA BARRO HONDO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Avance y Situación: **Estimación** 5

Actualizado al:

Avance	Avance de la ejecución de la inversión:	%
	Avance de la ejecución física (*):	%

(\*El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.

6 **Iniciar**

Componentes/otros costos de inversión	Costo	Avance		Comentarios
		%	Costo	
<b>COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/</b>				

**Guardar Estimación** **Cancelar**

# II. Registro de la sección Información de la Inversión

Luego de hacer clic en “Declarar”:

### Información de la Inversión

Información durante la etapa de ejecución

Avance y Situación   Estimación

Actualizado al: 09/02/2023

Avance	Avance de la ejecución de la inversión:	60.28 %
	Avance de la ejecución física (*):	59.85 %

(\*El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.

[Nueva declaración](#)

Componentes/otros costos de inversión	Costo	Avance		Comentarios
		%	Costo	
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	614,575.15	59.85	367823.23	OBRA ATRASADA
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SERVICIO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO/LETRINAS	1,087,641.43	59.85	650953.40	OBRA ATRASADA
SUPERVISIÓN	166,984.73	59.53	99406.01	OBRA ATRASADA
EXPEDIENTE TÉCNICO	30,000.00	100	30000.00	
GESTION DEL PROYECTO	0.00	0	0.00	
LIQUIDACIÓN	0.00	0	0.00	
<b>COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/</b>	<b>2,679,706.95</b>		<b>1,615,315.27</b>	

Ve a [Comenzar](#) para activar [Declarar](#)



Para reiniciar una nueva estimación deberá seleccionar “Nueva declaración”




3


## **Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente**

---

# III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente


## REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS ET/DE EN EL F12B

- 1 Ingresar al módulo de “Seguimiento” del Banco de Inversiones.
- 2 Buscar el código único de la inversión que se quiere registrar ET/DE y hacer clic en 

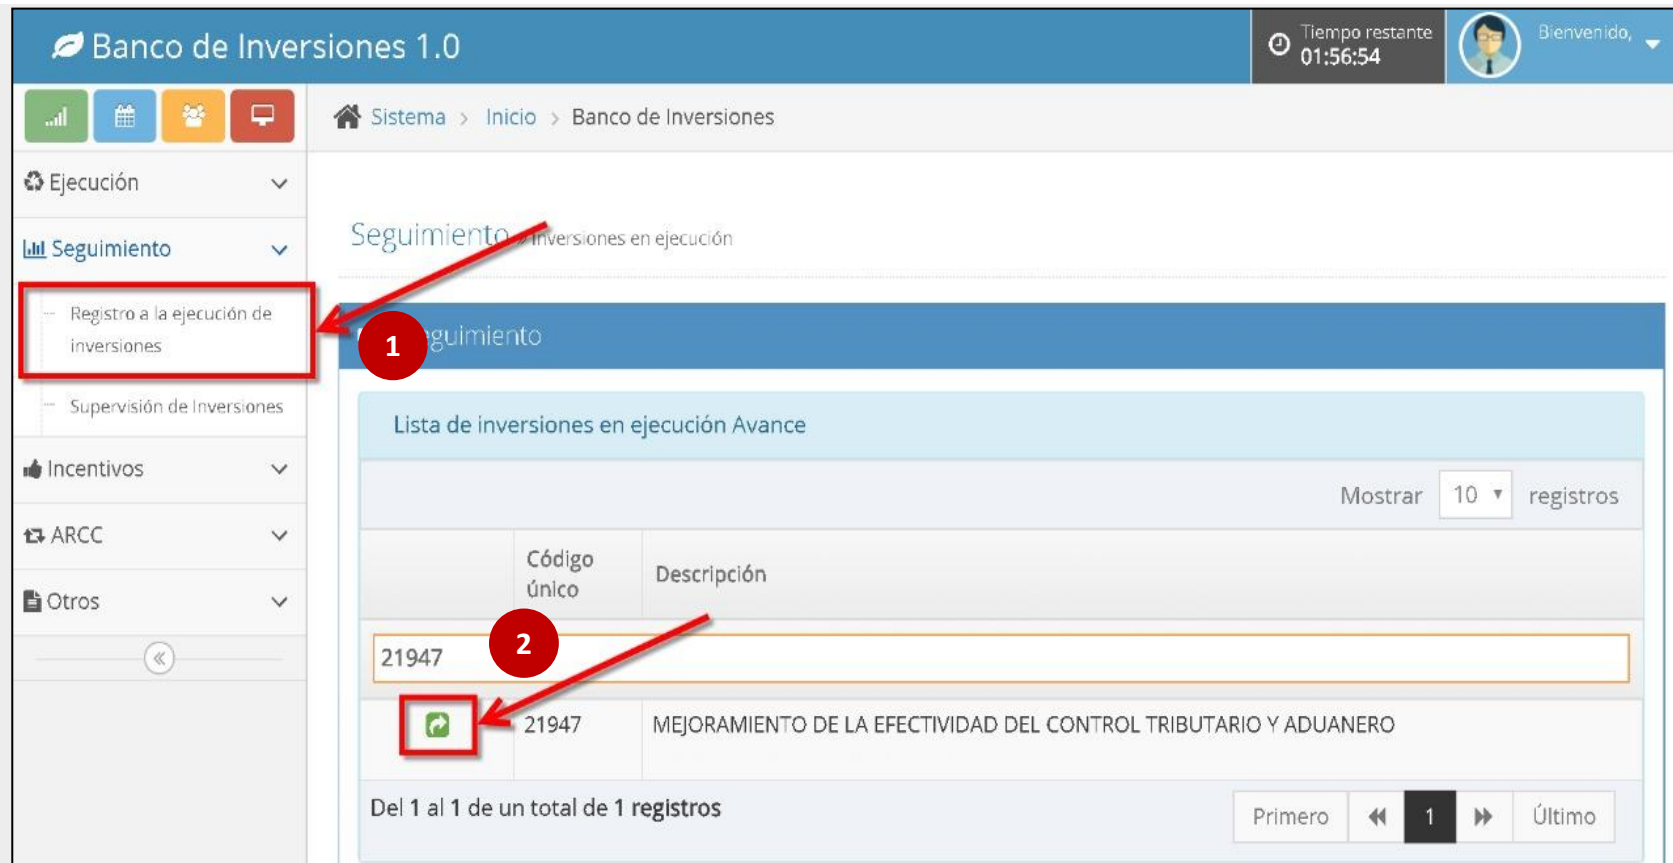

Banco de Inversiones 1.0

Tiempo restante 01:56:54

Bienvenido, 

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Supervisión de Inversiones

Incentivos

ARCC

Otros

Seguimiento de Inversiones en ejecución

Seguimiento

Lista de inversiones en ejecución Avance

Mostrar 10 registros

Código único	Descripción
21947	
21947	MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

Primero 1 Último

# III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

## REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS ET/DE EN EL F12B

- 3 Seleccionar “Expediente Técnico”.
- 4 Hacer clic en **Agregar** para generar ET/DE.

Banco de Inversiones 1.0

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario: UEI Entidad: UEI

Registro del seguimiento de inversiones >> Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

2438679 - CREACION DEL BIEN PUBLICO DE SOCOS... DISTRITO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Información de la inversión Expediente técnico Ejecución Financiera BIM Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

Formato 12B >> Registros

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

Nº de ET/DE 0 Agregar

Descripción	Fecha de egistro	Documento	Modalidad de ejecución	Ver detalle
-------------	------------------	-----------	------------------------	-------------

Salir

# III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

## REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS ET/DE EN EL F12B

- 7 Se visualiza los hitos correspondientes a la etapa seleccionada.
  - 8 Definir los hitos ha registrar y completar las fechas programadas de cada hito.
- Etapa: Elaboración del ET**

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

Tipo de documento  
EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de ejecución  
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Etapa  
ELABORACIÓN DEL ET

Descripción  
ELABORACION DE ET DE LA OBRA

Mostrar hitos


Definir hitos

Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
FIRMA DE CONTRATO	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
INICIO DE PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
ENTREGABLE 1	Fecha de entrega	Fecha de entrega		
ENTREGABLE 2	Fecha de entrega	Fecha de entrega		
CULMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
APROBACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		



Cancelar

# III. Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

## REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS ET/DE EN EL F12B

- 10 Aparecerá una ventana de confirmación, hacer clic en .
- 11 Se mostrará un mensaje indicando “Operación Exitosa”.
- 12 Finalmente, se visualiza el ET/DE registrado correctamente.

**Confirmación**  
¿Está seguro(a) que desea guardar estos 5 hitos?

Estado **10**  

**Operación Exitosa**  
Operación exitosa.



**11**

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

Nº de ET/DE  

**12**

	Descripción	Fecha de egistro	Documento	Modalidad de ejecución	Ver detalle
	ET DE SALDO DE OBRA	01/07/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	 





## **Registro de Ejecución física**

---



# IV. Registro de Ejecución física

Las UEI podrán registrar el seguimiento de la ejecución física a nivel de etapas e hitos de las diferentes modalidades de ejecución. Cabe indicar que el registro de la ejecución física se realiza por línea de seguimiento y este se encuentra vinculado a un ET/DE.



Secciones



## A. Información general del seguimiento

Información general del seguimiento de obras, bienes y servicios a nivel de etapas e hitos.



## B. Cronograma

Información del plazo de ejecución física programada y vigente



## C. Avance físico

Información del avance físico de la obra programado y real



## D. Modificaciones en ejecución física

Documentos aprobados de las modificaciones de la obra

# IV. Registro de Ejecución física

## ACCESO

- 1 Ingresar al módulo de “Seguimiento” del Banco de Inversiones.
- 2 Buscar el código único de la inversión que va registrar Avance físico.

The screenshot displays the user interface of the 'Banco de Inversiones 1.0' system. At the top, there is a navigation bar with the system name, a clock showing 'Tiempo restante 01:58:51', and a user profile for 'Bienvenido, 2019COPESCO'. Below this is a breadcrumb trail: 'Sistema > Inicio > Banco de Inversiones'. The main content area is titled 'Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento'. A specific investment is selected, identified as 'Formato 12-B' with the code '2438679 - CREACION DEL BIEN PUBLICO DE SOCOS DEL DISTRITO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN'. A horizontal menu of action buttons is visible, including 'Información de la inversión', 'Expediente técnico', 'Ejecución Financiera', 'BIM', and 'Seguimiento Físico (Hitos)'. The 'Seguimiento Físico (Hitos)' button is highlighted with a red rectangular box, and a red arrow points to it from the right. A 'Volver' button is located in the bottom right corner of the main content area. On the left side, there is a vertical sidebar menu with options like 'Ejecución', 'Seguimiento', 'Registro a la ejecución de inversiones', 'Supervisión de Inversiones', 'Incentivos', 'ARCC', and 'Otros'.

# IV. Registro de Ejecución física

## A. Información general del seguimiento (VIDEO)

Banco de Inversiones 1.0

area puntero

Tiempo restante 01:58:30

Bienvenido, UEIMDPIS001

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEIMDPIS001 > Entidad : UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC

Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

Incentivos

ARCC

Seguimiento » Registro

Seguimientos

Nº de Seguimientos

0

Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
--	-------------	-------------------	--------	------------------------	------------------------

Volver

IE 11.0+ Chrome 13.0+ Firefox 24.0+

Ministerio de Economía y Finanzas

# IV. Registro de Ejecución física

## B. Cronograma (VIDEO)

Banco de Inversiones 1.0

⌚ Tiempo restante  
01:59:50

👤 Bienvenido,  
UEIPNSR3

🏠 Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

👤 Usuario : UEIPNSR3 > 🏢 Entidad : UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Seguimiento Interno » Registro

🔔 Seguidimientos

Nº de Seguidimientos

5

Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
🗑️	OBRA_1	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	✎️ +
🗑️	OBRA 2	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	✎️ +
🗑️	OBRA 3	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	Editar
🗑️	MEJORAMIENTO DEL TRAMO I	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	✎️ +
🗑️	MEJORAMIENTO TRAMO II	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	✎️ +

🏠 Volver



# IV. Registro de Ejecución física

## C. Información del avance físico (VIDEO)

Banco de Inversiones 1.0

area puntero

Tempo restante 01:59:47

Bienvenido, UEIPNSR3

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEIPNSR3 > Entidad : UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Seguimiento Interno » Registro

### Seguimientos

Nº de Seguimientos

Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
	OBRA_1	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	
	OBRA 2	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	
	OBRA 3	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	
	MEJORAMIENTO DEL TRAMO I	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	
	MEJORAMIENTO DE TRAMO II	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	

Volver

Ministerio de Economía y Finanzas

# IV. Registro de Ejecución física

## D. Información de modificaciones en ejecución física (VIDEO)

Banco de Inversiones 1.0

⌚ Tiempo restante  
01:59:45

👤 Bienvenido,  
UEIPNSR3

🏠 Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

👤 Usuario : UEIPNSR3 > 🏢 Entidad : UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Seguimiento Interno » Registro

🔔 Seguir

Nº de Seguir

5

Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
🗑️	OBRA_1	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	📄 +
🗑️	OBRA 2	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	📄 +
🗑️	OBRA 3	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	Editar 📄
🗑️	MEJORAMIENTO DEL TRAMO I	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	📄 +
🗑️	MEJORAMIENTO DE TRAMO II	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	📄 +

🏠 Volver



# IV. Registro de Ejecución física

## REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA

- 1 Buscar en el navegador “Aplicaciones Informáticas MEF” y seleccionar la primera opción.
- 2 Hacer clic en el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
- 3 Digitar el código único de inversión y hacer clic en “buscar”.

The image displays three sequential screenshots of a web browser and the SSI application interface, each with a red circle and number indicating a step:

- Step 1:** A search engine results page for the query "aplicaciones informaticas mef". The first result, "Aplicaciones Informáticas - Ministerio de Economía y Finanzas", is highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.
- Step 2:** The SSI application's public access page. The "SSI Sistema de Seguimiento de Inversiones" button is highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.
- Step 3:** The SSI search interface. The search input field contains the number "2988111" and is highlighted with a red box. A hand cursor is shown clicking the search button.

# ¡No te lo pierdas!



## Capacitaciones virtuales



### Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.

<https://bit.ly/CAPACITACIONES2023>



### Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.

<https://bit.ly/DGPMICapacitacionesrealizadas2023>



### Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.

<https://bit.ly/recursosdeaprendizaje>





# ¿Aún tienes dudas?



## Consultas generales

Envía tu consulta a:  
[invierte.pe@mef.gob.pe](mailto:invierte.pe@mef.gob.pe)



## Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



## Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO DGPMI>

# ¡No te dejes engañar!

## Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



### Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>



### Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

 **invierte.pe**



Gobierno del Perú



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

**iMuchas gracias!**

