



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

invierte.pe



Webinar:

Formato de Seguimiento a la ejecución de inversiones (Formato N° 12-B)

Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
Ministerio de Economía y Finanzas



Objetivo

Desarrollar capacidades y orientar a los operadores del SNPMGI sobre el Formato N° 12-B:
Seguimiento a la Ejecución de Inversiones



Contenidos

1. Base Legal
2. Entendiendo el Formato N° 12B: Registro y Estructura
3. Registro y Seguimiento con el Formato N° 12B
 - Registro de la sección Información de la Inversión
 - Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente
 - Registro Programación Financiera
 - Registro de Ejecución física



Base Legal

Base Legal

- **Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones**

(Aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 de fecha 23.01.2019)


Artículo 45. Seguimiento de la fase de Ejecución

45.3 “La información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser **registrada mensualmente por la UEI** en el Formato N° 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, dentro de los primeros diez **(10) días hábiles** del mes siguiente.”



Entendiendo el Formato N°12B

Entendiendo el Formato N° 12B: Registro y Estructura



➤ Definición

Es una herramienta de gestión que permite el seguimiento a la ejecución de las inversiones, a partir de la información registrada por la UEI en el Banco de Inversiones y de los sistemas administrativos vinculados, lo que facilita la toma de decisiones informadas y contribuye a la gestión de inversiones.



➤ ¿Cuál es la periodicidad del registro ?

El registro es mensual, y se realiza hasta el décimo día hábil del mes siguiente del periodo ejecutado.



UEI

➤ ¿Quién registra?

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).



➤ ¿A partir de cuándo se debe registrar el seguimiento a la inversión en el Formato N° 12B?

- ✓ Viable
- ✓ Aprobado
- ✓ Incorporado en el PMI

➤ Estructura del Formato N°12-B

SECCIONES DEL FORMATO N°12B

Información de la Inversión

- Hitos de Inicio de ET/DE – Ejecución Física
- Avance y Situación
- Estimación del avance de la Inversión

Expediente Técnico

- Registro del seguimiento a la elaboración del ET/DE
- Seguimiento por hitos a la elaboración del ET/DE

Programación Financiera

- Programación Financiera Inicial
- Programación Financiera Actualizada

Seguimiento Físico por Hitos

- Registro del seguimiento a la ejecución física de Obras, Bienes y Servicios
- Seguimiento por hitos a la ejecución física de Obras, bienes y servicios



3

Registro y Seguimiento con el Formato N° 12B

Registro de la sección Información de la Inversión

Seleccionar la sección : “Información de la inversión”



Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

Incentivos

Núcleos Ejecutores

ANIN

Reportes

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

IOARR

Información de la inversión

Expediente técnico

Programación Financiera

BIM

Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

Registro de la sección Información de la Inversión

Sección “Avance y situación”

- El “Avance de la ejecución de la inversión (%)” (1) se calcula automáticamente con la información registrada en la pestaña “Estimación”.
- En “Situación” (2) se describen las acciones/actividades realizadas en la gestión de la inversión.

Información de la Inversión

Información sobre la fase de Ejecución

Código único de inversión (CUI) 2424326

Nombre de la inversión REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

Hito de Inicio (Exp. Técnico/Doc. Equivalente/Ejecución Física)

Avance y Situación

Estimación

Avance de la ejecución de la inversión (%) 1

67

Situación 2

LA INVERSIÓN IOARRR 2424326, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA, AL 14 DE MARO SE DEVENGÓ UN TOTAL DE S/1,170,795.54, POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°15, MAYORES METRADOS N°11,

2000 Caracteres restantes

situación actual de reforzamiento 14.03.2025[r].pdf

Adjuntar archivo

Riesgos asociados a la inversión en la Fase de Ejecución

No se identifica riesgo en el periodo

Guardar Avance y Situación

Cancelar



Si una inversión no cuenta con el Formato N° 08 registrado, la sección "Estimación" estará deshabilitada. En este caso, la UEI debe detallar las acciones de gestión de la inversión en la sección "Situación"

Registro de la sección Información de la Inversión

Sección “Estimación”

- Se ingresará el avance en % por cada componente de la inversión, de acuerdo con la estructura registrada en el Formato N°08. Para empezar a registrar información debemos hacer clic en “Iniciar”

Información de la Inversión

Información durante la etapa de ejecución

Código único2574029

Nombre de inversiónRENOVACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO TUPAC AMARU, LOS ALPES,HURANGUILLO, ALTO PERU, PACAY, ALTAMIZA, TABLONES, FAIQUE HASTA BARRO HONDO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Avance y Situación

Estimación1

Actualizado al:

Avance

Avance de la ejecución de la inversión:%

Avance de la ejecución física (*):%

(*)El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.

2

Iniciar

Componentes/otros costos de inversión	Costo	Avance		Comentarios
		%	Costo	
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				

Guardar Estimación

Cancelar

Registro de la sección Información de la Inversión

Una vez registrada la información (%), el sistema calcula el Avance y para finalizar el registro se debe hacer clic en “Declarar”.



La estructura de Componentes y Otros costos de inversión provienen del registro realizado en el Formato N°08

Componentes de la inversión

Otros costos de inversión

Información de la Inversión

Información durante la etapa de ejecución

Avance y Situación

Estimación

Actualizado al: 09/02/2023

Avance

Avance de la ejecución de la inversión: 60.28 %

Avance de la ejecución física (*): 59.85 %

(*)El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.

Nueva declaración

Componentes/otros costos de inversión	Costo	Avance		Comentarios
		%	Costo	
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	614,575.15	59.85	367823.23	OBRA ATRASADA
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SERVICIO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO/LETRINAS	1,087,641.43	59.85	650953.40	OBRA ATRASADA
SUPERVISIÓN	166,984.73	59.53	99406.01	OBRA ATRASADA
EXPEDIENTE TÉCNICO	30,000.00	100	30000.00	
GESTION DEL PROYECTO	0.00	0	0.00	
LIQUIDACIÓN	0.00	0	0.00	
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/		2,679,706.95	1,615,315.27	

Declarar

Para actualizar los datos de estimación se deberá seleccionar “Nueva declaración”



Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la sección Expediente Técnico

Seleccionar “Expediente Técnico”



Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

Incentivos

Núcleos Ejecutores

ANIN

Reportes

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

IOARR

Información de la inversión

Expediente técnico

Programación Financiera

BIM

Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro del seguimiento a la elaboración del ET/DE

- Seleccionar “Expediente Técnico”.
- Hacer clic en **Agregar** para generar un nuevo registro de seguimiento para la elaboración del ET/DE.

Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

Incentivos

Nucleos Ejecutores

ANIN

Reportes

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEI682 > Entidad : oficina general de administración

Formato 12B » Registros

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

Nº de ET/DE

1

Agregar

Mostrar 15 registros

	Descripción	Fecha de registro	Documento	Modalidad de ejecución	Ver detalle/ Agregar etapa
	Ingrese el criterio de búsqueda				
		05/07/2019	EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

Primero 1 Último

Salir

Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la programación para la elaboración del ET/DE

- Se visualiza los hitos correspondientes a la etapa seleccionada.
- Definir los hitos ha registrar y completar las fechas programadas de cada hito.

Etapas: Elaboración del ET

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

Tipo de documento

EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Etapas

ELABORACIÓN DEL ET

Descripción

ELABORACION DE ET DE LA OBRA


Mostrar hitos

Definir hitos

	Hito	Fecha Programada	Fecha Actualizada	Estado	Comentario
	FIRMA DE CONTRATO	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
	INICIO DE PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
	ENTREGABLE 1	Fecha de entrega	Fecha de entrega		
	ENTREGABLE 2	Fecha de entrega	Fecha de entrega		
	CULMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
	APROBACIÓN DEL ET	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		

Registro del Expediente Técnico/Documento Equivalente

Registro de la programación para la elaboración del ET/DE

- Aparecerá una ventana de confirmación, hacer clic en 
- Se mostrará un mensaje indicando “Operación Exitosa”.
- Finalmente, se visualiza el ET/DE registrado correctamente.

Confirmación

¿Está seguro(a) que desea guardar estos 5 hitos?

Estado

Aceptar

Cancelar

Operación Exitosa

Operación exitosa.

Registro del Expediente Técnico - ET / Documento Equivalente - DE

ET/DE

Nº de ET/DE

1

Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Documento	Modalidad de ejecución	Ver detalle
	ET DE SALDO DE OBRA	01/07/2020	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	 


Salir



Registro de la Programación Financiera

Registro de la Programación Financiera en el Formato N°12-B


Esquema para el inicio del registro de la “Programación Financiera” de la inversión

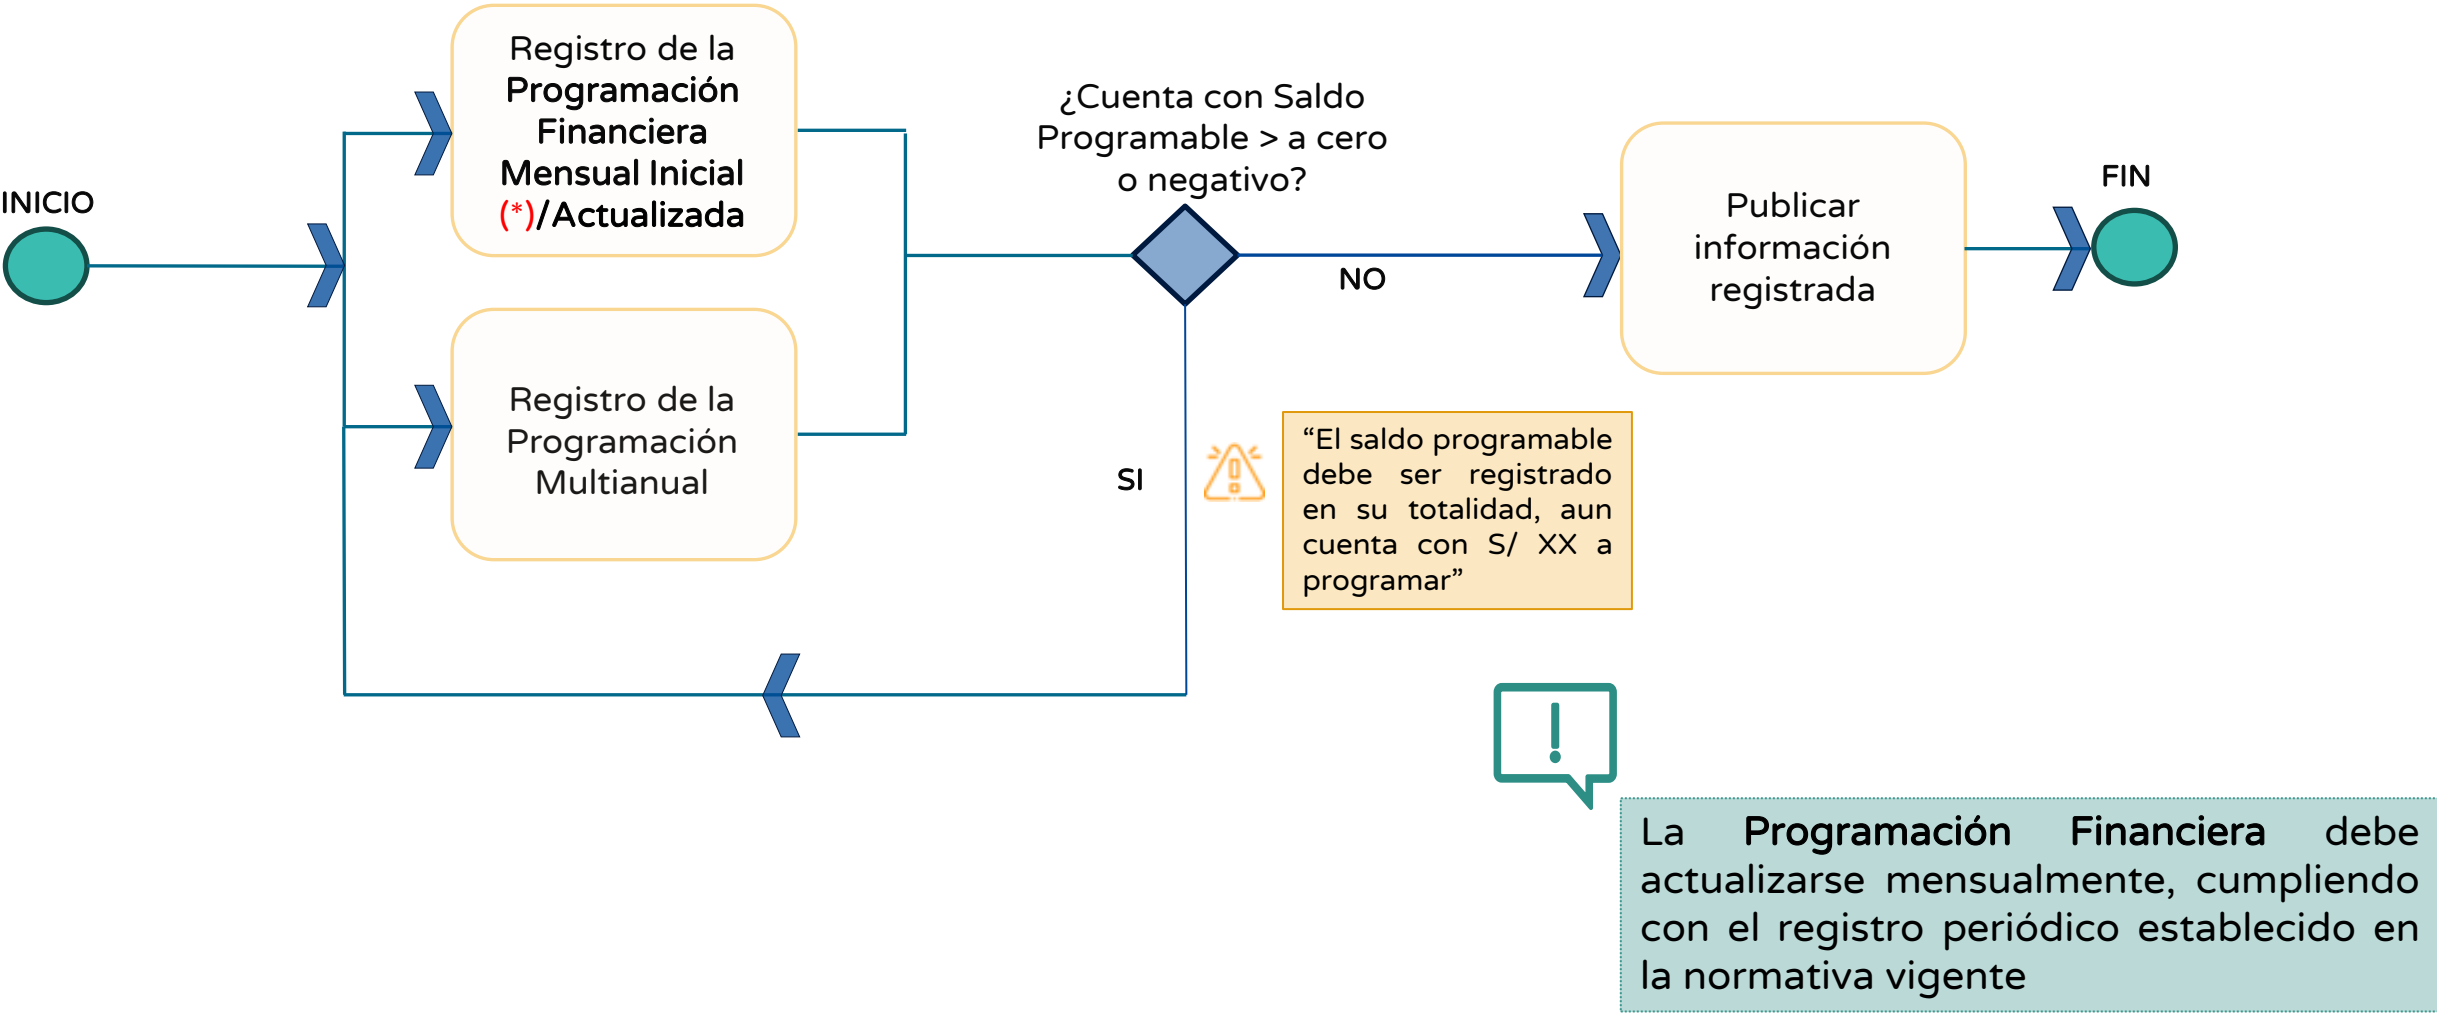

(*) Se registra por única vez, las actualizaciones se realizarán en la sección : “Programación Financiera Actualizada”

Registro de la Programación Financiera en el Formato N°12-B

Esquema de vinculación de la “Programación Financiera” de la inversión y el MPMI

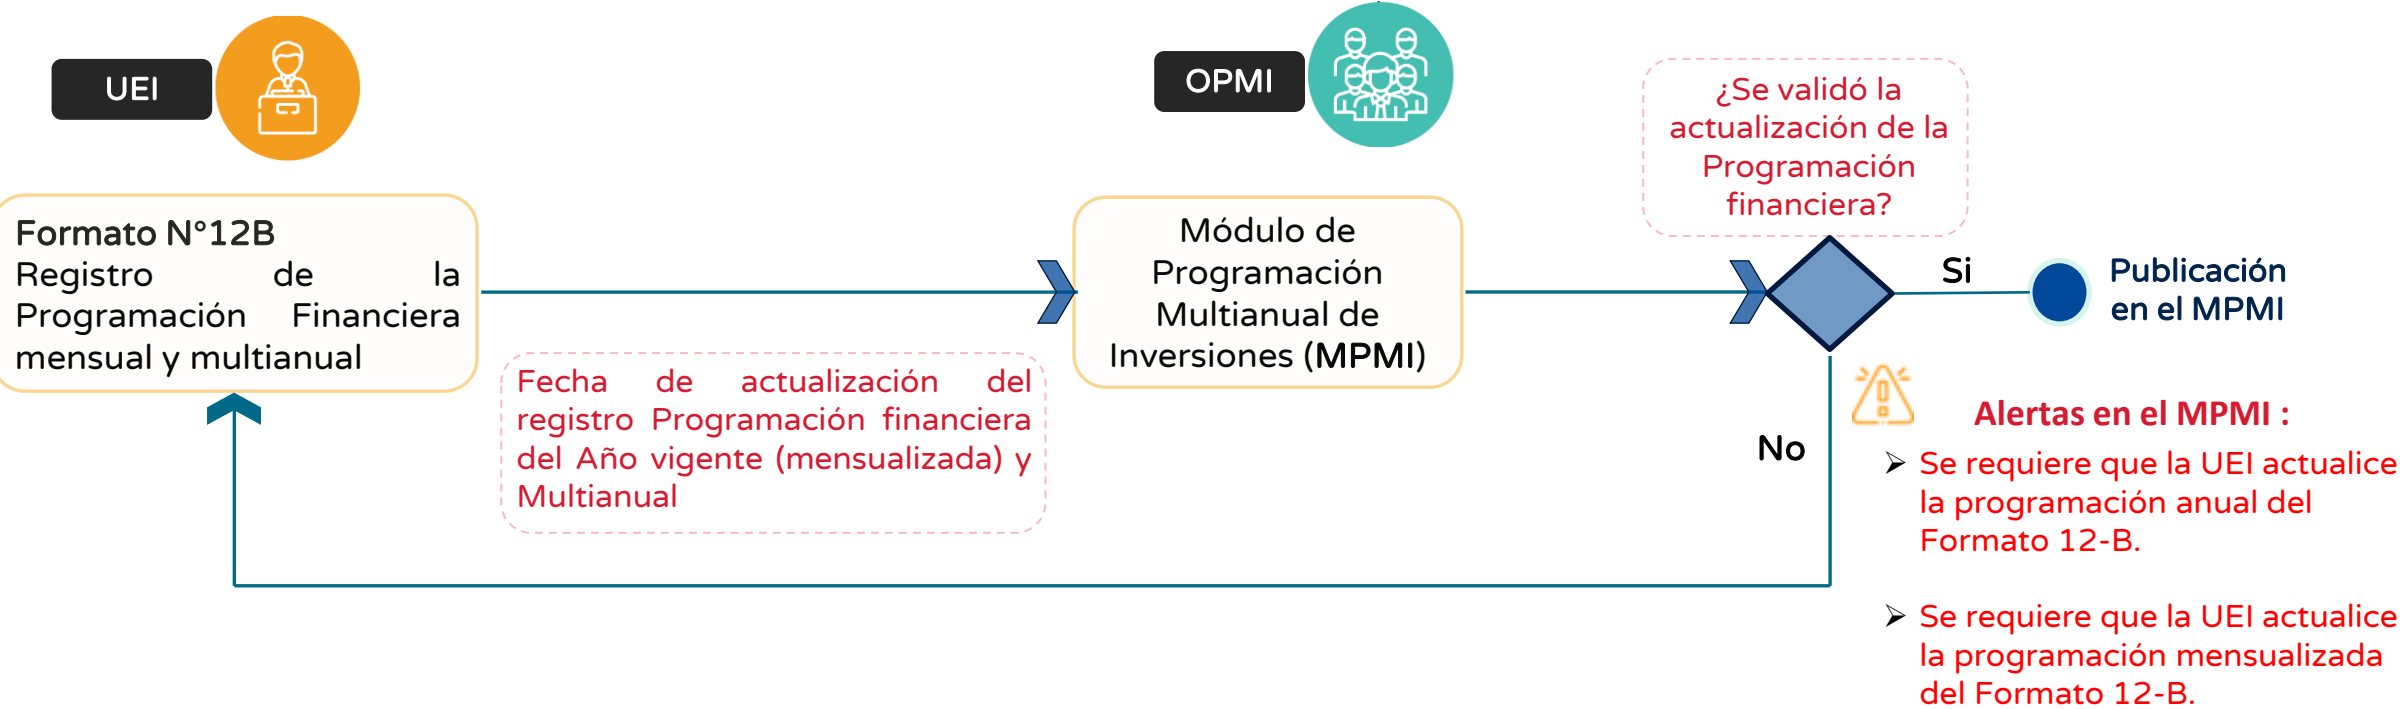

Nota:

Los montos registrados en la Programación Financiera Multianual del Formato 12-B, se vinculan con el MPMI de acuerdo con los plazos para la fase de Programación Multianual de Inversiones establecidos en el Anexo N.º 6.

Pasos para el registro de la Programación Financiera

Paso 1



Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

Incentivos

Núcleos Ejecutores

ANIN

Reportes

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

IOARR

Información de la inversión

Expediente técnico

Programación Financiera

BIM

Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

Paso 2

El sistema mostrará el Saldo Programable (ver figura N° 2), que resulta de la siguiente fórmula



Nota: Los montos registrados en la Programación Financiera Multianual del Formato 12-B, se vinculan con el MPMI de acuerdo con los plazos para la fase de Programación Multianual de Inversiones establecidos en el Anexo N.º 6.

Paso 3

Caso 1: Sin UEP vinculada a la inversión

Si al seleccionar la UEP no se visualiza información (1), el sistema emitirá el siguiente mensaje (2): “No se ha encontrado información de la Ejecutora Presupuestal”. En ese sentido, la UEI deberá coordinar con la Unidad Formuladora (UF) para el registro correspondiente a fin de continuar con la programación financiera

Registro del avance financiero: 2204278

Información financiera de la inversión: 2204278

INFORMACION FINANCIERA ACTUALIZADA DE LA INVERSIÓN

$a = (b - c - d - e)$

(a) Saldo Programable

S/561,260.82

(b) Costo de Inversión Actualizado

S/561,260.82

(c) Deveng. acumu. al año anterior

S/0.00

(d) Programación Financiera año actual

S/0.00

(e) Programación Financiera Multianual

S/0.00

Seleccione ejecutora presupuestal: Sin ejecutoras registradas

Información del sistema

Requisitos mínimos:
No se ha encontrado información de la ejecutora presupuestal, por favor regístrela en el Banco de Inversiones.

Guardar cambios

Cancelar

Caso 2: Con UEP vinculada a la inversión

En este caso se mostrarán las UEP vinculadas a la inversión, correspondiendo el registro de la programación financiera por cada una de ellas.

Registro de la programación financiera: 2160866

Información financiera de la inversión: 2160866

INFORMACION FINANCIERA ACTUALIZADA DE LA INVERSIÓN

$$a = (b - c - d - e)$$

(a) Saldo Programable

S/.104,907.84

(b) Costo de Inversión Actualizado

S/.3,006,175.31

(c) Deveng. acumu. al año anterior

S/.2,878,266.47

(d) Programación Financiera año actual

S/.3,000.00

(e) Programación Financiera Multianual

S/.20,001.00

Ejecutora presupuestal:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL [SIAF]

PROGRAMA AGUA PARA TODOS [BI]

Guardar cambios

Cancelar

Paso 4

Proceder a registrar la programación financiera anual (1) y multianual (2), luego seleccionar la opción “Guardar cambios” (3) (ver figura N.º 5).

La UEI obligatoriamente deberá registrar una programación financiera a nivel de devengados mensuales estimados (de acuerdo con la modalidad de ejecución) de toda la inversión.

Ingresar el monto de la programación financiera multianual por cada UEP, de acuerdo con los períodos (años) registrados en la “Programación de ejecución de inversiones” de la sección B o C del Formato 08, según corresponda.

Nota:

Los montos registrados en la programación financiera anual y multianual por cada UEP incidirán en el saldo programable de la inversión.

Ejecutora presupuestal:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA [BI]

I PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL1

PIM S/0.00

Periodo	Monto (Soles)
2024-01	0
2024-02	0
2024-03	0
2024-04	0
2024-05	0
2024-06	0
2024-07	0
2024-08	0
2024-09	0
2024-10	0
2024-11	0
2024-12	0
TOTAL	0.00

II PROGRAMACIÓN FINANCIERA MULTIANUAL2

Saldo Programable S/320,838.45

Periodo	Monto (Soles)
2025	0
TOTAL	S/0.00

3 Guardar cambios Cancelar



En caso el monto de la programación financiera sobrepase el saldo programable (1), el sistema mostrará las celdas en color rojo (2)

Información financiera de la inversión: 2455733

INFORMACION FINANCIERA ACTUALIZADA DE LA INVERSIÓN
 $a = (b - c - d - e)$

(b) Costo de Inversión Actualizado S/ 320,838.45	(c) Deveng. acumu. al año anterior S/ 0.00	(a) Saldo Programable S/ -132,382.55 1	(d) Programación Financiera año actual S/ 453,221.00	(e) Programación Financiera Multianual S/ 0.00
---	---	--	---	---

PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUAL

PIM S/ 0.00

Periodo	Monto (Soles)
2024-01	555.00
2024-02	0
2024-03	0
2024-04	555.00
2024-05	0
2024-06	0
2024-07	0
2024-08	0
2024-09	452,111.00
2024-10	0
2024-11	0
2024-12	0
TOTAL	453,221.00

Nota:

Si el monto ingresado sobrepasa el saldo programable, el sistema no permitirá guardar la programación.



Registro de Ejecución física

Registro del seguimiento a la Ejecución Física

Esquema para el registro de la “Ejecución Física por hitos” de la inversión



DETERMINAR
OBJETO

SELECCIONAR
CRITERIOS 

GENERAR
HITOS 

REGISTRAR
INFORMACIÓN 

DOCUMENTOS DE
SUSTENTO 

OBRAS

- Modalidad de Ejecución
- Seleccionar etapas (Ej. Ejecución contractual)
- Generar hitos



- Inicio de ejecución
- Culminación de ejecución
- Liquidación



- Registrar fechas programadas/actualizadas de hitos
- Registrar Cronograma de ejecución, avance físico y modificaciones



- Cronograma de ejecución
- Doc. que sustenta el registro del avance físico (Ej. Resumen valorización)

BIENES

- Modalidad de Ejecución
- Seleccionar etapas (Ej. Ejecución contractual)
- Generar hitos



- Inicio de ejecución
- Entregables 1, 2, ...
- Culminación de contrato



- Registrar fechas programadas/actualizadas de hitos
- Registrar avance físico y estado de los Entregables



- No se requiere adjuntar documentos

SERVICIOS

Registro de la sección “Seguimiento Físico (Hitos)”

Seleccionar “Información de la inversión”

Ejecución

▼

Seguimiento

▼

Registro a la ejecución de inversiones

Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

Incentivos

▼

Nucleos Ejecutores

▼

ANIN

▼

Reportes

▼

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Registro del seguimiento de inversiones » Lista de inversiones con seguimiento

Formato 12-B

IOARR

Información de la inversión

Expediente técnico

Programación Financiera

BIM

Seguimiento Físico (Hitos)

Volver

Registro de la sección “Seguimiento Físico (Hitos) - Obras

A. Información general del seguimiento (VIDEO)

Banco de Inversiones 1.0

Ejecución

Seguimiento

Registro a la ejecución de inversiones

Registro a la ejecución de IOARR de emergencia

Incentivos

ARCC

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Usuario : UEIMDPIS001 > Entidad : UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC

Seguimiento » Registro

Seguimientos

Nº de Seguimientos

0

Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
--	-------------	-------------------	--------	------------------------	------------------------

Volver

IE 11.0+

Chrome 13.0+

Firefox 24.0+

Ministerio de Economía y Finanzas

B. Cronograma (VIDEO)

 Tiempo restante
01:59:50

Bienvenido,
UEIPNSR3

Usuario : UEIPNSR3 > Entidad : UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

 Seguir

5

Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
	OBRA_1	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	 
	OBRA 2	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	 
	OBRA 3	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	 
	MEJORAMIENTO DEL TRAMO I	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	 
	MEJORAMIENTO TRAMO II	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	 

[🔑 Volver](#)



Ministerio de Economía y Finanzas

Registro de la sección “Seguimiento Físico (Hitos) - Obras

C. Información del avance físico (VIDEO)

Banco de Inversiones 1.0

Ejecución

Seguimiento

Incentivos

ARCC

Otros

Sistema > Inicio > Banco de Inversiones

Seguimiento Interno » Registro

Seguimientos

Nº de Seguimientos

5

Agregar

	Descripción	Fecha de registro	Objeto	Modalidad de ejecución	Editar / Agregar etapa
	OBRA_1	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	
	OBRA 2	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	
	OBRA 3	01/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	
	MEJORAMIENTO DEL TRAMO I	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	
	MEJORAMIENTO DE TRAMO II	05/05/2021	OBRAS - Contrata	MODALIDAD INDIRECTA	

Volver

area

puntero

⌵

⌚ Tiempo restante 01:59:47

Bienvenido, UEIPNSR3

Usuario : UEIPNSR3 > Entidad : UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Ministerio de Economía y Finanzas

Registro de la sección “Seguimiento Físico (Hitos) - Obras

REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA

- 1 Buscar en el navegador “Aplicaciones Informáticas MEF” y seleccionar la primera opción.
- 2 Hacer clic en el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
- 3 Digitar el código único de inversión y hacer clic en “buscar”.

The image displays three sequential screenshots of a web browser, each illustrating a step in the process of accessing the Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).

Screenshot 1: A Google search for "aplicaciones informaticas mef". The first result, "Aplicaciones Informáticas - Ministerio de Economía y Finanzas", is highlighted with a red box and a hand cursor. The URL is <https://www.mef.gob.pe/aplicativos-invierte-pe>.

Screenshot 2: The website [invierte.pe](https://www.mef.gob.pe/aplicativos-invierte-pe) is shown. Under the "Acceso público" section, the "SSI" button (Sistema de Seguimiento de Inversiones) is highlighted with a red box and a hand cursor.

Screenshot 3: The SSI system interface is shown. The search field contains the code "2988111", and the "Buscar" button (magnifying glass icon) is highlighted with a red box and a hand cursor.

¡No te lo pierdas!



Capacitaciones virtuales



Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.



Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.



Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.



¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO DGPMI>

¡No te dejes engañar!

Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>



Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!




Desde el año 2021, el MEF cuenta con el

Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público

RM N° 330-2021-EF/47

Este instrumento de integridad, explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI, con las entidades de los tres niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y confianza.

Contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad.



En el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFl:

- ▶ Abastecimiento
- ▶ Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- ▶ Presupuesto Público
- ▶ Tesorería
- ▶ Endeudamiento Público
- ▶ Contabilidad

También incluye a la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

 **invierte.pe**



¡Muchas gracias!
